Naručilac: Republika Srbija, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Investitor: Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom ''Infrastruktura železnice Srbije''
Pružalac usluge: Vodeći član grupe – Project Biro Utiber doo, Članovi konzorcijuma - Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional

Pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge

Novi Sad-Subotica-državna granica

IZVEŠTAJ NADZORA ZA PERIOD OD 01.08.-31.08.2024.

Avgust 2024.

Kontrolni list

Investitor:	Infrastruktura železnice Srbije
Projekat:	Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)
Ugovor:	Stručni nadzor (inženjer) na projektu „Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)“
Ugovor br:	340-5583/2018-3 potpisan 07.07.2018.
Naslov dokumenta:	Izveštaj Nadzora za period od 01.08.-31.08.2024.
Broj dokumenta:	IN028

	Pripremio	**Pregledao**	**Odobrio**
ORIGINAL	**IME I PREZIME**	**IME I PREZIME**	**IME I PREZIME**
	Dragan Gligorov	**Dragan Gligorov**	**Dragan Gligorov**
DATUM	**POTPIS**	**POTPIS**	**POTPIS**
avgust, 2024.			

Ovaj izveštaj je pripremljen za Naručioca (Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture), u skladu sa uslovima imenovanja stručnog nadzora na projektu „Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)“.

Sadržaj:

1 OPŠTI PODACI O PROJEKTU 6
1.1. PREDMET I OPIS PROJEKTA 6
1.2. OBUHVAT RADOVA 6
1.3. PODACI O UGOVORU SA IZVOĐAČEM 8
1.4. PODACI O UGOVORU SA NADZOROM 9
1.5. UČESNICI U PROJEKTU 9
1.5.1. Naručilac i Investitor 9
1.5.2. Nadzor 10
1.5.3. Izvođač radova 10
2 PREGLED AKTIVNOSTI U IZVEŠTAJNOM PERIODU 11
2.1. OBAVEZE, ZADACI I CILJEVI NADZORA 11
2.2. TABELA ODRŽANIH SASTANAKA 12
2.3. TABELA KORESPODENCIJE 13
2.4. IZVEŠTAJI SA GRADILIŠTA 25
3 KONTROLA KVALITETA I PREGLED PRIMLJENIH RADOVA 28
3.1. KONTROLA KVALITETA IZVOĐAČA 28
3.2. KONTROLA KVALITETA NADZORA 28
4 PLANIRANE I SPROVEDENE AKTIVNOSTI NADZORA U IZVEŠTAJNOM PERIODU 30
4.1. RADOVI NA DEONICI NOVI SAD – VRBAS (ULAZ) 30
4.1.1. Radovi u infrastrukturnim objektima u službenim mestima 30
4.1.2. Radovi na donjem stroju 33
4.1.3. Radovi na gornjem stroju 35
4.1.4. Radovi na kontaktnoj mreži i elektro-energetskim postrojenjima 37
4.1.5. Radovi na SS i TK sistemima 39
4.1.6. Radovi na hidrotehničkim instalacijama 39
4.1.7. Geodetski radovi 40
4.1.8. Radovi na termotehničkim i mašinskim instalacijama 43

4.1.9. Mostovi i inženjerske konstrukcije 49
4.2. RADOVI NA DEONICI VRBAS (ULAZ) – NAUMOVIĆEVO (ULAZ) 54
4.2.1. Radovi u infrastrukturnim objektima u službenim mestima 54
4.2.2. Radovi na donjem stroju 61
4.2.3. Radovi na gornjem stroju 64
4.2.4. Radovi na kontaktnoj mreži i elektro-energetskim postrojenjima 66
4.2.5. Radovi na SS i TK sistemima 68
4.2.6. Radovi na hidrotehničkim instalacijama 68
4.2.7. Geodetski radovi 69
4.2.8. Radovi na termotehničkim i mašinskim instalacijama 75
4.2.9. Mostovi i inženjerske konstrukcije 78
4.3. RADOVI NA DEONICI NAUMOVIĆEVO (ULAZ) – SUBOTICA 81
4.3.1. Radovi u infrastrukturnim objektima u službenim mestima 81
4.3.2. Radovi na donjem stroju 85
4.3.3. Radovi na gornjem stroju 86
4.3.4. Radovi na kontaktnoj mreži i elektro-energetskim postrojenjima 89
4.3.5. Radovi na SS i TK sistemima 94
4.3.6. Radovi na hidrotehničkim instalacijama 95
4.3.7. Geodetski radovi 97
4.3.8. Radovi na termotehničkim i mašinskim instalacijama 101
4.3.9. Mostovi i inženjerske konstrukcije 102
5 BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU 106
6 STATUS PREGLEDA PZI PROJEKATA 110
7 STATUS PREDATIH METODOLOGIJA RADA 119
8 FINANSIJSKI IZVEŠTAJ 120
9 PREGLED ZAHTEVA ZA SAGLASNOST MATERIJALA (MAR) 137
10 STATUS RADOVA 155

PRILOZI

PRILOG 1: IZVEŠTAJI SA GRADILIŠTA
PRILOG 2: ORGANIZACIONA ŠEMA NADZORA
PRILOG 3: ZAPISNICI SA SASTANAKA

1 OPŠTI PODACI O PROJEKTU

1.1. Predmet i opis projekta

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija i modernizacija deonice Novi Sad – Subotica – Državna granica za brzine do 200 km/h, koja se planira u okviru rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje drugog koloseka pruge Beograd – Budimpešta. Cilj projekta je unapređenje železničke infrastrukture za projektovanu brzinu do 200 km/h uz savremeno opremanje stanica, čime će se povećati konkurentnost pruge i stvoriti uslovi za veće učešće železničkog saobraćaja na transportnom tržištu. Projektom modernizacije postojeća pruga se u potpunosti usklađuje sa međunarodnim standardima i sporazumima (TSI, AGC, AGTC, kao i Sporazuma o performansama pruga jugoistočne Evrope SEECP). Projekat rekonstrukcije i modernizacije deonice Novi Sad – Subotica – Državna granica, podrazumeva primenu evropskih standarda interoperabilnosti (TSI), a obuhvata sledeće:

- obnovu postojećeg koloseka na deonici (gornji i donji stroj) i izgradnju jednog novog koloseka;
- rekonstrukciju kolosečnih kapaciteta i objekata u stanicama: Novi Sad, Kisač, Zmajevo, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo, Subotica teretna i Subotica putnička;
- rekonstrukciju kolosečnih kapaciteta i objekata u rasputnici Sajlovo i stajalištu Stepanovićevo;
- izgradnja novih stanica sa staničnim kapacitetima u mestima Rumenka, Vrbas i zajedničke stanice Lovćenac – Mali Iđoš;
- denivelacije ukrštanja pruge sa drumskim saobraćajnicama;
- ugradnju elektrotehničke infrastrukture (postrojenja i uređaji električne vuče, signalno-sigurnosni i telekomunikacioni uređaji), koja omogućava bezbedno odvijanje saobraćaja projektovanim brzinama i uvođenje Evropskog sistema upravljanja železničkim saobraćajem (ERTMS i ETCS nivo 2).

1.2. Obuhvat radova

Građevinski radovi

Predviđeno je da se modernizacija, rekonstrukcija i izgradnja deonice Novi Sad – Subotica – Državna granica, dužine 108,4 km realizuje istovremenim izvođenjem radova na tri deonice, koje će Izvođač definisati uz saglasnost Finansijera i Investitora.

Projektom je predviđena rekonstrukcija i izgradnja dvokolosečne pruge za brzinu 200 km/h za međustanična rastojanja, kao i za prolazne koloseke u službenim mestima. Kolosečni kapaciteti u službenim mestima se rekonstruišu prema projektnoj dokumentaciji u službenim mestima Novi Sad, Kisač, Zmajevo, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo, Subotica teretna i Subotica putnička. Projektom je predviđena izgradnja novih staničnih zgrada i infrastrukturnih kapaciteta u Rumenci, Vrbasu i zajedničkoj stanici Lovćenac – Mali Iđoš. Rekonstruišu se i modernizuju postojeća ukrsnica Sajlovo i stajalište Stepanovićevo.

Na celokupnoj deonice Novi Sad – Subotica – Državna granica projektom je predviđena izgradnja ukupno 58 inženjerskih objekata i to:

- nadvožnjaka 30
- podvožnjaka 13
- galerija 5
- pešačko – biciklističkih pothodnika 2

- potpornih konstrukcija uz galeriju 2
- vijadukta 2
- mostovskih konstrukcija 4

U arhitektonskom smislu projektant je predvideo rekonstrukciju sledećih infrastrukturnih kapaciteta (ukupno 70 objekata):

- stanične zgrade 8
- pothodnik u stanicama 3
- peroni u stanicama 2
- peronske nadstrešnice 3
- zgrada EVP 3
- zgrada ETP 2
- peroni i peronske nadstrešnice 8
- objekat SS i TK 6
- zgrada SS i TK 6
- pothodnik i nadstrešnice 10
- zgrada PS 4
- pešačko biciklistički pothodnik 2
- zgrada PSN 3
- službena zgrada Srbija kargo 1
- tipski objekat za TK opremu 9

Na prilazu službenim mestima, pothodnicima i peronima predviđeno je postavljanje opreme za informisanje i usmeravanje kretanja putnika u skladu sa međunarodnim propisima u železničkom saobraćaju. Predviđeno je da se u svim službenim mestima izgrade kapaciteti za pristup osobama sa invaliditetom. S obzirom na rang pruge i projektnu brzinu do 200 km/h predviđeno je da se pruga ogradi tipom ograde koji se primenjuje na autoputevima. Predviđeno je postavljanje ograde sa obe strane pruge, na 1,0 m od ivice kanala, odnosno nožice nasipa.

U skladu sa rangom pruge i važećim propisima o rekonstrukciji, modernizaciji i izgradnji dvokolosečne pruge za brzinu do 200 km/h, predviđeno je da sva ukrštanja pruge sa drumskim saobraćajnicama moraju biti denivelisana, što zahteva ukidanje svih postojećih putnih i pešačkih prelaza u nivou.

Elektrotehnički radovi

Signalno-sigurnosna postrojenja

Projektom je predviđeno je da se deonica Novi Sad – Subotica – Dražavna granica, kao i cela pruga od stanice Beograd Centar do granice sa Mađarskom, u skladu sa zahtevima bezbednosti i interoperabilnosti, opremi kako konvencionalnim signalnim sistemom tako i uređajima kabinske signalizacije (uređaji evropskog sistema kontrole vozova – ETCS nivo 2). Evropski sistem kontrole voza predstavlja nadgradnju na konvencionalan signalni sistem.

Telekomunikacioni uređaji

Predviđeno je uvođenje GSM-R sistema od stanice Beograd Centar do granice sa Mađarskom (Kelebija) u smislu obezbeđivanja funkcionisanja ETCS -a nivoa 2 za brzine vozova do 200km/h,

kao i bezbedne platforme za govornu komunikaciju i prenos podataka između železničkog osoblja (dispečeri, otpravnici, ekipe za manevrisanje, mašinovođe i sl.). Kao fizički prenosni medijum se koristi optički kabl GSM-R sistem treba da bude interoperabilan i da se integriše u evropski sistem upravljanja železničkim saobraćajem. U stanicama i stajalištima, objektima EEP i GSM-R sistema i kritičnim lokacijama (ulazi i izlazi iz većih tunela i mostova) na deonici Novi Sad – Subotica – Državna granica, predviđaju se najsavremeniji telekomunikacioni sistemi i instalacije: sistem video nadzora, sistemi za obaveštavanje putnika, sistem kontrole pristupa i ostali.

Radove izvodi konzorcijum Join Venture „China Railway International Corporation Co.Ltd." and „China Communications Construction Company Ltd.

Planirano trajanje izvođenja radova je 33 meseci.

Radovi se izvode u skladu sa Građevinskom dozvolom, Projektom za građevinsku dozvolu i Projektom za izvođenje radova, koje je pripremio Izvođač radova u skladu sa usvojenim Idejnim projektom, Izveštajem revizione komisije o stručnoj kontroli Idejnog projekta i Projektnim zadatkom.

Kontrolu samog procesa izrade Projekta za izvođenje, kao i kontrolu kvaliteta i usaglašenosti sa Projektom za građevinsku dozvolu će vršiti Stručni nadzor.

1.3. Podaci o ugovoru sa Izvođačem

Ugovor:	Komercijalni ugovor o modernizaciji i rekonstrukciji mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)
Ugovor br:	340-5583/2018-3 od 07.07.2018. 1/2018-1950 od 07.07.2018. (zaveden kod Investitora) CRIC/2018/001 od 07.07.2018. (zaveden kod Izvođača)
Aneks ugovora br. 1	340-05-5892/2021-1 od 25.06.2021. 1/2021-1550/385 od 25.06.2021.(zaveden kod Investitora) CRIC(S)/2021/003-112 od 25.06.2021. (zaveden kod Izvođača)
Aneks ugovora br. 2	340-9986/2022 od 09.12.2022. 1/2022-1/1204 od 09.12.2022.(zaveden kod Investitora) JV-NSSB-2022-02 od 09.12.2022. (zaveden kod Izvođača)
Aneks ugovora br. 3	340-9166/2023 od 06.10.2023. 1/2023-1/800 od 06.10.2023.(zaveden kod Investitora) JV-NSSB-2023-01 od 06.10.2023. (zaveden kod Izvođača)
Aneks ugovora br.4	340-2110/2024-1 od 15.03.2024. 1/2024-1/201 od 15.03.2024.(zaveden kod Investitora) JV-NSSB-2024-01 od 15.03.2024. (zaveden kod Izvođača)
Ugovorna suma:	USD 1.162.810.000 (bez PDV-a) – Osnovni ugovor/Aneks br.1 USD 6.512.453,59 (bez PDV-a) – Aneks br.2 USD 111.999.042,00 (bez PDV-a) – Sporazum broj 1 *Napomena:* deo radova definisanih Sporazumom 1 u iznosu od USD 18.842.062,00, su ugovoreni kroz Aneks 3 Ugovora USD

28.137.000,91 (bez PDV-a) – Aneks br.3 USD 52.301.209,67 (bez PDV-a) – Aneks br.4
Napomena: deo radova definisanih Sporazumom 1 u iznosu od USD 28.787.787,00, su ugovoreni kroz Aneks 4 Ugovora

Radovi iz Komercijalnog ugovora o modernizaciji i rekonstrukciji mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica – Državna granica, koji će biti predmet stručnog nadzora se finansiraju u skladu sa Ugovorom o kreditu između Kineske banke i Vlade Republike Srbije.

1.4. Podaci o ugovoru sa Nadzorom

Ugovor:	**Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Novi Sad – Subotica – državna granica**
Ugovor br:	404-02-133/4/2021-02 od 21.01.2022.godine 1/2022-1/103 od 21.01.2022.godine PBU-21/22 od 21.01.2022.godine
Aneks ugovora br. 1	404-02-133/5/2021-02 od 28.07.2022.godine 1/2022-1/823 od 28.02.2022.godine PBU-323/22 od 28.07.2022.godine
Aneks ugovora br. 2	404-02-133/6/2021-02 od 08.04.2024.godine 1/2024-1/246 od 08.04.2024.godine PBU-148/24 od 08.04.2024.godine
Ugovorna suma:	RSD 3.659.000.000 (bez PDV-a)
Datum ugovora:	21.januar 2022.godine
Datum uvođenja u posao:	15.februar 2022.godine
Ugovorni rok:	31.01.2025.godine

1.5. Učesnici u projektu

1.5.1. Naručilac i Investitor

Naručilac: **Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infratsrukture (MGSI)**
Predstavnica: Anita Dimoski
Registrovana adresa kancelarije:
Adresa: Nemanjina 22-26 Telefon: +381 11 3612 938
Grad: 11 000 Beograd El. Pošta: anita.dimoski@mgsi.gov.rs
Država: Srbija

Investitor: **Infrastruktura železnice Srbije a.d.**
Predstavnica: Slobodanka Katanić
Registrovana adresa kancelarije:
Adresa: Nemanjina 6 Telefon: +381 11 3614 811
Grad: 11 000 Beograd El. Pošta: slobodanka.katanic@srbrail.rs
Država: Srbija

1.5.2. Nadzor

Konzorcijum: Project Biro Utiber doo (vodeći član), Utiber Kozuti Beruhazo KFT, Vikoti Mernok Iroda KFT, EGIS d.o.o. Beograd, AG Institut d.o.o., Slaviša Ilić SDC Professional

Tim Lider-Rukovodilac projekta: G. Dragan Gligorov
Registrovana adresa kancelarije:
Adresa: Kamp Izvođača-Novi Sad ranžirna stanica Telefon: +381 69 44 00 490

Grad: 21138 Novi Sad El. Pošta: sektor3@utiber.rs
Država: Srbija

1.5.3. Izvođač radova

Izvođač: JV CRIC-CCCC
Predstavnik konzorcijuma: Zhou Xin
Registrovana adresa kancelarije:
Adresa: Omladinskih brigada 21 Telefon: +381 11 401 0081
Grad: 11000 Beograd El. Pošta: public@cric.rs
Država: Srbija

2 PREGLED AKTIVNOSTI U IZVEŠTAJNOM PERIODU

2.1. Obaveze, zadaci i ciljevi Nadzora

Ovaj izveštaj je pripremljen u skladu sa uslovima imenovanja stručnog nadzora na projektu Rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Novi Sad - Subotica – državna granica. Priprema se i dostavlja Naručiocu u saglasnosti sa uslovima ugovora.

Osnovne obaveze i zadaci Nadzora obuhvataju sledeće:

- stručni nadzor svih aktivnosti Izvođača u svim aspektima ispunjenja njegovih obaveza, odgovornosti i radnji koje preduzima u odnosu na izvrшavanje ugovornih obaveza i blagovremeni završetak ugovora;
- stručni nadzor kvaliteta i učinka Izvođača u fazi projektovanja u vezi sa zahtevima definisanim konkursnom dokumentacijom za nabavku radova u delu koji se odnosi na izradu Projekta za izvođenje i Projekta za upravljanje saobraćajem za vreme izvođenja radova;
- proveru usklađenosti izrađenog Glavnog projekta, Projekta za izvođenje sa: građevinskom dozvolom, Projektom za građevinsku dozvolu, propisima, standardima i pravilima struke; proveru kvaliteta i primenljivosti projektovanih rešenja i tehnologija izvođenja radova;
- kontrolu Izvođača radova u pogledu sprovođenja mera zaštite životne sredine, kao i obezbeđivanje poštovanja preporuka i zahteva bezbednosti saobraćaja u toku trajanja ugovora
- priprema svih dokumenata, a posebno tehničke i finansijske dokumentacije, od važnosti za izvršenje ugovora ili donošenje odluka, za potrebe Naručioca;
- priprema svih dokumenata, a posebno tehničke i finansijske dokumentacije, od važnosti za izvršenje ugovora ili donošenje odluka, za potrebe Naručioca;
- sprovođenje nekih ili svih zaduženja ovlašćenog predstavnika Naručioca, ukoliko Naručilac prenese takve dužnosti i odgovornosti Stručnom nadzoru;
- prenos znanja i iskustva Naručiocu u oblasti upravljanja ugovorima, unapređenja tehnologije, i drugim oblastima relevantnim za Ugovor;
- ukoliko nastanu bilo kakvi sporovi tokom trajanja Ugovora, obezbeđivanje neophodnih dokaza, analiza i svedočenja radi zastupanja interesa Naručioca.

2.2. Tabela održanih sastanaka

U izveštajnom periodu održani su sledeći sastanci:

Red. broj	Tema sastanka	Lokacija/Učesnici	Održan
1	Tehnički sastanak – AsBo Sprovođenje dodatnih mera kontrole	IŽS / Nadzor, Izvođač, Investitor	01.08.2024.
2	Tehnički sastanak – Projektovanje kolosweka Subotica – Horgoš, Period izvođenja radova, interfejs	Novi Sad / Nadzor, Izvođač, Investitor	05.08.2024.
3	Tehnički sastanak – Definisanje uslova za preuzimanje kampa sa službenim prostorijama i infrastrukturnim kapacitetima u službenom mestu Sajlovo	Kamp Sajlovo / Nadzor, Izvođač, Investitor, CIP	05.08.2024.
4	Tehnički sastanak – PIO dokumentacija	CIP / Nadzor, Izvođač, Investitor, projektant	09.08.2024.
5	Tehnički sastanak – Klejmovi i varijacije	Novi Sad / Nadzor, Izvođač	14.08.2024.
6	Tehnički sastanak – Metodologija montaže čelićne konstrukcije mosta na km 0+976 i proračun čelične konstrukcije u fazama montaže	Novi Sad / Nadzor, Izvođač	15.08.2024.
7	Tehnički sastanak – PIO Dokumentacija	CIP / Nadzor, Izvođač, Projektant	16.08.2024.
8	Tehnički sastanak – Obilazak stanice Novi Sad	Novi Sad / Nadzor, Izvođač, Finansijer	19.08.2024.
9	Tehnički sastanak – Klejmovi i varijacije	Novi Sad / Nadzor, Izvođač, Finansijer	21.08.2024.
10	Tehnički sastanak – Pitanja laboratorije u vezi sa zaštitom PS, PSN objekata	Novi Sad / Nadzor, Izvođač, Investitor	22.08.2024.
11	Tehnički sastanak – Pregled SS/TK uređaja međustaničnog rastojanja i pregled skretnica	Novi Sad / Nadzor, Izvođač, Investitor	22.08.2024.
12	Tehnički sastanak – BZR	Novi Sad / Nadzor, Izvođač	22.08.2024.
13	Tehnički sastanak – Rampa za utovar praćenih automobila u stanici Novi Sad	Novi Sad / Nadzor, Izvođač, Investitor, Projektant	23.08.2024.
14	Tehnički sastanak – PIO dokumentacija	CIP / Nadzor, Izvođač, Investitor, Projektant	23.08.2024.
15	Tehnički sastanak – Provera rada SCADA sistema	Novi Sad / Nadzor, Izvođač, Investitor, Siemens	23.08.2024.
16	Tehnički sastanak – Dinamika i problematika završetka preostalih radova, završetak radova i kompletiranje dokumentacije za NoBo inspekciju	Novi Sad / Nadzor, Izvođač, Investitor, Finansijer	26.08.2024.
17	Tehnički sastanak – Klejmovi i varijacije	Novi Sad / Nadzor, Izvođač	30.08.2024.
18	Sastanak PIo dokumentacije	CIP / Novi Sad	30.08.2024.

Zapisnici sa sastanaka nalaze se u prilogu 3

2.3. Tabela korespodencije

DOLAZNA KORESPODENCIJA – Izvođač radova

Red. Broj	Datum dopisa	Broj dopisa	Naziv dopisa
1	1-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0168	Dostava ponude za zazidanjem otvora novih vrata i montaža drvenih rukohvata na ulaznim vratima u stanici Subotica - Varijacija br. 129
2	1-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0169	Ugradnje fiksnih tačaka prema instrukciji Investitora - Varijacija br. 130
3	1-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0533	Zahtev za noćno izvođenje radova na zameni razvodnog ormara u prizemlju krila A stanice Novi Sad
4	1-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0337	Rešenje za bezbedno rastojanje između delova konktaktne mreže pod naponom i nadstrešnice na mestu kolizije stubova kontaktne mreže i nastrešnice u stanici Subotica
5	1-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0333	Temelji stubova potrala kontaktne mreže pored zgrade JP Pošte Srbije kod stanice Subotica
6	1-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0334	Principi adaptacije projekta za ETCS V3.2
7	1-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0336	Dostavljanje statičkog proračuna temelja totema u stanici Novi Sad
8	2-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0338	Dostava PZI ograde rampe na stanici Subotica
9	2-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0339	Izmena pozicija informacionih tabli 1, 23.1a, 23.1b, 6.2a, 4.1B u stanici Žednik na osnovu knjige 8.3.3
10	2-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0534	Dostava metodologija radova za žičanu mrežu protiv bacanja kod postojećeg mosta na km 167+600
11	2-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0535	Zahtev za interni prijem HVAC stanica Novi Sad - km 128+849, konstrukcije na deonici Novi Sad - Vrbas, arhitektura i pejzažno uređenje stanica Vrbas nova
12	2-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0340	Tehničko rešenje pristupnog puta i trotoara objekta PSN Bačka Topola na km 143+843
13	2-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0341	Tehničko rešenje za telekomunikacioni kabl kolizije br. 35 na km 177+329 u Subotici, knjiga 5.9.3.3.
14	2-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0536	Dostava lista popravljenih nedostataka na konstrukcijama
15	2-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0537	Dostava metodologije za retenziju na km 177+375
16	2-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0542	Zahtev za noćno izvođenje radova na zameni razvodnog ormara u prizemlju krila A stanice Novi Sad
17	5-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0532	Dostava metodologije ispitivanja probnim opterećenjem galerije na km 114+716
18	5-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0546	Interni prijem EVP Vrbas
19	5-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0544	Zahtev za interni prijem gornjeg stroja Lovćenac- Naumovicevo, elektro opreme EVP Novi Sad, EVP Subotica, PNS Bačka Topola, PS Lovćenac, PSN Kelebija, PS Žednik, PS Subotica, PSN Zmajevo, PS Kisač
20	5-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0541	Izmeštanje postojećeg stuba i septičke jame u stanici Naumovićevo
21	5-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0540	Zatvaranje pruge 209 Novi Sad - Sajlovo za potrebe ugradnje signala i presignala

22	5-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0543	Dostava metodologije za retenziono infiltracionog sistema na km 128+849 - km 156+211
23	5-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0545	Dostava metodologije za dopunu zeštitne ograde od km 128+849 do km 184+634
24	5-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0547	Izmeštanje ograde na parceli br 6642/11
25	5-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0171	Dostavljanje obračunskih listova za XXV privremenu situaciju
26	5-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0172	Dostavljanje obračunskih listova za Sporazum 1
27	5-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0548	Zahtev za isključenje napona i zatvor pruge u stanici Novi Sad
28	5-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0549	Zahtev za zatvor pruge na deonici stanica Subotica - Palić
29	6-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0550	Podnošenje geodetskog izveštaja u vezi popravke geodetske kontrole mreže na deonici K128-K139
30	6-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0551	Podnošenje geodetskog izveštaja podzemnih instalacija za deonice 13, 14 I 15 (Deonice za koje je potreban zahtev za upotrebnu dozvolu)
31	6-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0552	Podnošenje projekta sleganja za ETP zgradu I zgradu carine u stanici Subotica
32	6-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0553	Zahtev za interni prijem za deonicu Novi Sad - Subotica
33	6-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0166	Dostavljanje ponude za dodatne radove na stepeništu u stanici Kisač I zamena cevovoda na stanicama Sajlovo I Rumenka - Varijacija br. 128
34	6-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0170	Dostavljanje ponude za dodatni putni prelaz na km 168+900 - Varijacija br. 131
35	6-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0521	Odgovor na postojeće nedostatke u vezi ugranje kablovskih kanaleta donjeg stroja deonice D1 (od stanice Novi Sad do stanice Vrbas Nova)
36	6-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0342	Tehničko rešenje za odvodnjavanje nadvožnjaka na km 177+329,42 - Majšanski most - status A
37	6-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0555	Obaveštenje o izmeštanju ograde na parceli br. 6642/11 K.O. Donji Grad
38	7-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0554	Zahtev za prijem dalekovoda od EVP Vrbas do pruge (km 119+138)
39	7-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0173	Dostava ponude za sanaciju stepenica SS i TK zgrade u stanicama Zmajevo i Bačka Topola - Varijacija br 132
40	8-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0343	Dostava ažurirane knjige 8.2 i tehničkog rešenja za izradu pločica na ručakma za slepa i slabovida lica
41	8-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0493	Dostava priručnika za održavanje uređaja CSM i eurobaliza
42	8-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0556	Saglasnost na glavnu svesku građevinskog dnevnika
43	8-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0174	Zahtev za plaćanje privremene situacije 034
44	9-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0557	Zahtev za interni prijem za deonicu Novi Sad - Subotica
45	9-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0177	Zahtev za plaćanje privremene situacije Aneks 3 broj 035
46	12-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0176	Dostava ponude za dodatne radove na izmenama naglavnih grada mosta na km 77+807 - Varijacija br. 133
47	12-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0558	Zahtev za interni prijem gornji stroj od Naumovićeva do državne granice, TK i SS prostorije sa termotehnikom instalacijama

48	12-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0344	Tehničko rešenje opreme za rashladne jedninice u SS i TK objektima sa problemima pregradne grade
49	13-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0346	Detalj za temelje stubova rasvete na konstrukciji nadvožnjaka i pešački staza na km 177+329
50	13-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0180	Dostava ponude za radove na tri pešačke staze i sanaciji spoljnih stepenica SS i TK objekata - Varijacija br 137
51	13-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0181	Dostava ponude za povezivanje objekata u staničnom području sa stanicom Subotica soba 46 - Varijacija br. 138
52	13-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0559	Neophodna saglasnost na predloženu svetiljku za nastrešnicu u putničkoj stanici Novi Sad
53	13-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0560	Metodologija radova na izradi stubova rasvete za osvetljenje koloseka u stanici Novi Sad, Zmajevo, Vrbas nova i Bačka Topola
54	14-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0347	Zamena kolovozne konstrukcije od cement betona asfaltnom za ETP Subotica
55	14-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0349	Izmena trase cevi za grejanje i hlađenje na spratu objekat SS i TK u Subotici
56	14-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0563	Zahtev za isključenje napona i zatvor pruge
57	14-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0564	Plan pregleda kontaktne mreže Naumovićevo - državna granica
58	15-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0565	Zahtev za rušenje objekta na parceli br 11730 i 11732 zbog izgradnje retenzije R1
59	15-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0566	Dostava tehničke dokumentacije opreme za ispitivanje temperaturne osovine u Naumovićevu
60	15-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0352	Dostava tehničke dokumentacije GSM-R opreme i zahteva za korišćenje radio-frekvencija RATEL-a
61	15-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0567	Dostava metodologije za dopunu drvene ograde nadvožnajka za krupnu divljač na km 137+300 i km 155+025
62	15-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0569	Pristupni put na katastarsku parcelu br 3743 KO Bačka Topola grad
63	15-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0351	Dostava ažuriranih knjiga 8/5.1 i 8/5.2
64	15-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0561	Merenje skretničkih sila i instalacija signalno sigurnosne opreme na skretničkim postavnim spravama u stanici Subotica
65	15-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0182	Dostavljanje ponude za zaštitu dalekovoda ispod EVP-a Novi Sad I EVP puta Vrabs - Varijacija br. 135
66	15-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0179	Dostavljanje ponude za dodatne radove za povišeni zaštitni temeljni zid kegle sa leve strane otporca S4 mosta na km 81+134 - Varijacija br. 134
67	15-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0183	Dostavljanje ponude za dodatne radove na podvožnjaku na km 97+027 - Varijacija br. 139
68	15-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0184	Dostavljanje ponude za naknadno dodate šok transmitere mosta na km 81+644 - Varijacija 136
69	15-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0348	Organizacija železničkog saobraćaja u stanici Subotica I deonici SU - državna granica
70	15-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0185	Dostavljanje ponude za dodatnu ugradnju čeličnih pokrivnih limova za zatvaranje balastnih zidova na spoju sa dilatacionim spojnicama za mostove na km 81+644 I km 110+351
71	15-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0562	Podnošenje geodetskog izveštaja nakon reparacije geodetskih kontrolnih tačaka na deonicama km 112+000 - km 129+000
72	16-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0570	Dostava dokumentacija o kontroli sistema protivpožarne zaštite EVP Vrbas od strane treće strane

73	16-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0571	Dostava izveštaja o funkcionalnoj proveri postrojenja i ispitivanju zaštite EVP Vrbas
74	16-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0572	Organizovanje dežurnog osoblja tokom 24 sati nakon priključenja EVP Vrbas
75	16-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0574	Dostava metodologije radova za dopunu zaštitne ograde nadvožnjaka i podvožnjaka od km 128+849 do km 184+634
76	16-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0354	Dostava crteža ploče sa godinom izgradnje za mostova
77	16-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0350	Izmena pozicije retenzije 1 na km 175+300 prema knjizi 3.1.3
78	16-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0353	Predlog za izmenu položaja ograde na km 143+375 u cilju olakšanja pristupa stanarima na parcelama 3585 i 3586
79	16-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0355	Dopuna detalja za UP30 na km 179+700 prema knjizi 3.1.3.
80	16-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0356	Dostava ažuriranog tehničkog rešenja odvodnjavanja vijadukta na km 117+150
81	16-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0568	Dostava izveštaja o ispitivanju sistema uzemljenja i izveštaja o ispitivanju primarne opreme EVP Vrbas
82	16-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0358	Dostava objašnjenja Projektanta u vezi sa kućišnom zaštitom ET u EVP Vrbas
83	16-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0575	Hitan zahtev za priključenje EVP Vrbas na prenosni sistem 110kV
84	19-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0359	Dostavljanje projektnog crteža izmene na ogradama za propuste od Novog Sada do Vrbasa
85	19-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0186	Odgovor na NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2419 Varijacija br. 80
86	19-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0187	Dostavljanje ponude za rekonstrukciju i uređenje službenih prostorija u krilu D stanice Novi Sad - Varijacija br. 141
87	19-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0357	Dopis u vezi sa izmenom položaja tri informaciona znaka ''30.1'' i jednog informacionog znaka ''2'' na peronu 1 u stanici Subotica, prema knjizi 8.3.4
88	20-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0188	Dostavljanje ponude za dodatnu ugradnju čeličnih pokrivnih limova za zatvaranje balastnih zidova na spoju sa dilatacionim spojnicama za mostove na km 117+155 - Varijacija br. 142
89	20-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0573	Dostavljanje dinamičke analize za most na km 117+155,43
90	20-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0190	Odgovor na dopis br. NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2832 u vezi sa Varijacijom br. 123
91	20-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0360	Saglasnost na izmene projekta za izvođenje knjige 3.3.2.2.
92	21-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0361	Dostavljanje Tehničkog rešenja za ulicu Biće Kesića u Stepanovićevu
93	21-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0576	Dostavljanje podataka o osoblju za inspekciju tunela Čortanovci
94	21-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0577	Obuka iz telekomunikacionih i informacionih sistema za deonicu Novi Sad - Subotica
95	21-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0362	Rešenje za ograde na propustima za male životinje u Subotici
96	21-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0578	Zahtev za interni prijem za deonicu Novi Sad - Subotica
97	21-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0579	Zahtev Infrastrukturi Železnica Srbija da završe potvrdu o prijavi radova na izgradnji 20 kV kablovskog voda za priključenje STS-1P Naumovićevo

98	21-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0580	Dopis u vezi sa ponovnim dostavljanjem izveštaja o statičkom prijemu i statičkom testiranju sistema signalizacije
99	22-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0583	Poziv na sastanak u vezi sa povezivanjem sistema SCADA u postojećim CDU Novi Sad
100	22-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0581	Zahtev Iza koordinisanje građevinskog podizvođača za unutrašnje završne radove stanice Novi Sad
101	22-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0584	Dostavljanje dokumentacije za dalekovod od EVP Vrbas na KM od podizvođača GAT
102	22-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0582	Dostavljanje izjava u vezi sa završenim radovima EVP Vrbas
103	22-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0191	Dostavljanje ponude za naknadno ugrađivanje kamenih kocki usled tehničkih izmena ispred stanice Subotica - Varijacija Br. 143
104	23-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0363	Dostavljanje delova dokumentacije PIO za deonicu Novi Sad - Subotica
105	23-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0588	Dopis u vezi sa odlaganjem obuke telekomunikacionih i informacionih sistema
106	23-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0586	Odgovor na dopis Železnica Srbije br. 10/2024-511 u vezi radove u server sobi u stanici Novi Sad putinička
107	23-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0585	Dostava rezultata 3D skeniranja i avio snimanja na deonici od km 76+600 do km 128+000
108	23-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0192	Dostava dodatnog objašnjenja za dodatne radove interfejsa priključne pruge za Horgoš - Varijacija br 126
109	26-Aug-24	HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0194	Zatravljivanje kosina nasipa pruge i pristupnih saobraćajnica - Varijacija br 145
110	26-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0365	Dostavljanje dela dokumentacije PIO za deonicu Novi Sad-Subotica
111	26-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0364	Tehničko rešenje za pristupni put objektu SS i TK Subotica - km 176+206 (dopuna dokumenta br 2/3.1.34.3)
112	26-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0589	Odgovor na dostavljanje dokumentacije za interni tehnički pregled, puštanje u upotrebu, praćenje probnog rada i primopredaju pruge
113	26-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0369	Projekti arhitekture pothodnika i nadstrešnica u železničkim stanicama
114	26-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0590	Interni pregled EVP Subotica
115	27-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0591	Zahtev za priključenje na prenosni sistem objekta elektrovučne podstanive EVP Subotica
116	27-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0371	Dostavljanje tipskih crteža za zatvaranje otvora većih od 15 cm na spoju čeličnih konstrukcija međusobno I sa betonskim konstrukcijama na vijaduktu u Vrbasu, km 117+155
117	27-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0370	Dostavljanje dela dokumentacije PIO za deonicu Novi Sad-Subotica
118	27-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0366	Predlog za novu lokaciju dve informativne table "14" u Subotici
119	27-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0367	Rešenje za polaganje koloseka ETP Subotica
120	27-Aug-24	HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0368	Rešenje razmaka u zaštitnoj ogradi na km 177+857
121	28-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0596	Obaveštenje o izvršenim merenjima kontaktne mreže i poziv za ispitivanje zaštite PS Lovćenac
122	28-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0599	Saopštenje za javnost o puštanju kontaktne mreže pod visoki napon

123	28-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0598	Dostava podataka u vezi povezivanje sistema SCADA sa postojećim centrom CDU u Novom Sadu
124	28-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0592	Dostava metodologije za temelje železničke signalizacije saobraćajnih znakova
125	28-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0600	Obezbeđenje gradilišta
126	28-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0597	Dostava zapisnika o rušenju objekata Srbije Kargo, kao i zahtev za priključenje zgrade na kanalizacionu i elektrodistributivnu mrežu
127	28-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0595	Dostava geodetskog elaborata o popravci referentnih geodetske mreže od km 152 do km 168
128	28-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0594	Dostava trećeg geodetskog elborata za sleganje trupa puta nasipa na km 132+100 - km 132+325, km 134+875 - km 135+250, km 146+025 - km 146+050, km 163+375 - 163+575
129	28-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0593	Dostava geodetskog elaborata za podzemne elektroinstalacije za deo 13, 14 i 15
130	28-Aug-24	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0587	Dostava geodetskih elaborata za prateće radova
131			
132			
133			
134			
135			
136			
137			
138			
139			
140			
141			
142			
143			
144			
145			
146			
147			
148			
149			
150			
151			
152			
153			
154			
155			
156			
157			
158			
159			
160			
161			
162			
163			
164			

165			
166			
167			
168			
169			
170			
171			
172			
173			
174			
175			
176			
177			
178			
179			
180			
181			
182			
183			
184			
185			
186			
187			
188			
189			
190			
191			

DOLAZNA KORESPODENCIJA – Investitor

Red. Broj	Datum dopisa	Broj dopisa	Naziv dopisa
1	2-Aug-24	10/2024-476	Dostava ponude za dodatne radova i opremu za telekomandu u Novom Sadu i povezivanje interfejsa
2	2-Aug-24	10/2024-477	Interni prijem EVP Vrbas
3	2-Aug-24	10/2024-478	Priključenje EVP Vrbas na opštinu vodovodnu mrežu
4	7-Aug-24	10/2024-494	Priključenje EVP Vrbas, Novi Sad, Subotica na distributivnu mrežu
5	7-Aug-24	10/2024-491	Pristupni put na katastarsku parcelu br 3743 KO Bačka Topola grad
6	7-Aug-24	10/2024-493	Izjašnjenje o pričinjenoj šteti na katastarskim parcelama br 36465/1, 36466/1, 36468/1 KO Gonji grad Subotica
7	8-Aug-24	10/2024-499	Dostavljanje dokumentacije za interni tehnički pregled, puštanje u upotrebu, praćenje probnog rada i primopredaju pruge
8	8-Aug-24	10/2024-500	Dostava rešenje o priključenju u probni rad objekta distributivnog sistema električne energije na km 184+378
9	13-Aug-24	10/2024-510	Prokišnjvanje krovne konstrukcie u EVP Vrbas
10	13-Aug-24	10/2024-511	Primedbe na izvedene radove u server sobi u stanici Novi Sad putinička

11	13-Aug-24	10/2024-512	Dostava dokumentacije potrebne za uklanjanje objekata u rejonu putničke i teretne stanice Subotica
12	13-Aug-24	10/2024-514	Zahtev za popravku kanaleta i pešačke staze u stanici Novi Sad ranžirna
13	13-Aug-24	10/2024-515	Dostava rešenja o priključenju u probni rad objekata na distributivnih sistem električne energije
14	13-Aug-24	10/2024-516	Pristup objektu na kp 4442-2 KO Žednik tokom izvođenja radova na podvožnjaku na km 157+443
15	15-Aug-24	10/2024-523	Dostava rešenja EVP Vrbas - Odobrenje za priključenje
16	15-Aug-24	10/2024-524	Dostava odobrenja o priključenju na distributivni sistem električne energije
17	16-Aug-24	10/2024-525	Urgencija za dostavu podataka potrebnih za izradu i kompletiranje poslovinih redova stanica I deo
18	19-Aug-24	10/2024-538	Mišljenje u vezi sa preuzimanjem baze Izvođača radova u službenom mestu Sajlovo
19	21-Aug-24	10/2024-541	Plan obuke za telekomunikacione sisteme
20	21-Aug-24	10/2024-542	Primedbe komisiji Investitora na izvedene radova u PS Kisač i PSN Zmajevo
21	21-Aug-24	10/2024-543	Urgencija za odgovor na dopis Investitora broj 10/2024-499
22	22-Aug-24	10/2024-545	Primedbe komisije Investitora na izvedene radove u PS Žednik i PSN Kelebija
23	22-Aug-24	10/2024-546	Primedbe komisije Investitora na izvedene radove u PS Lovćenac i PSN Bačka Topola
24	22-Aug-24	10/2024-547	Odgovor na dopis HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0576
25	23-Aug-24	10/2024-548	Primedbe na tehnčku dokumentaciju opreme GSMR sistema i zahtev za korišćenje radio frekvencije
26	23-Aug-24	10/2024-549	Humuziranje kosina i uređenje prostora oko objekata
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			

ODLAZNA KORESPODENCIJA – Nadzor

Red. Broj	Datum dopisa	Broj dopisa	Naziv dopisa
1	1-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2860	Predlog za lokaciju informativnih tabli 6.2r i 25r iz knjige 8.3.3 u stanici Bačka Topola

2	1-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2861	Varijacija br. 73 - dodatno testiranje podtla na deonici km 175+550 - km 176+260 u stanici Subotica teretna
3	1-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2862	Dostava liste primedbi
4	1-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2863	Ugradnja ograda na propustima na deonici Novi Sad - Vrbas
5	1-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2864	Komentar Nadzora na tehničku dokumentaciju za stubove za nošenje reflektora sa pokretnom platformom u projektu osvetljenja koloseka
6	1-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2865	Mišljenje Nadzora na predlog Tehničkog rešenja za odvodnjavanje nadvožnjaka na KM 177+329,42 pruge – MAJŠANSKI MOST
7	2-Aug-24	NAD-NSSB-IŽS-185	Uklanjanje postojećeg stuba, Naumovićevo
8	2-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2866	Izmena pozicije informacionih table 1, 23.1a, 23.1b, 6.2a i 4.1v u stanici Žednik na osnovu knjige 8.3.3
9	2-Aug-24	NAD-NSSB-MGSI-030	Sanacija energetskih kablova za dodatno osvetljenje u MZ Novi Žednik
10	2-Aug-24	NAD-NSSB-IŽS-186	Saglasnost na zahtev za noćno izvođenje radova na zameni razvodnog ormana u prizemlju krila A stanice Novi Sad
11	2-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2867	Rešenje za bezbedno rastojanje između delova KM pod naponom i nadstrešnice u Stanici Subotica
12	2-Aug-24	NAD-NSSB-IŽS-187	Saglasnost na zahtev za noćno izvođenje radova na zameni razvodnog ormana u prizemlju krila A stanice Novi Sad
13	5-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2868	Metodologija ispitivanja galerije na km 114+716 probnim opterećenjem
14	5-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2869	Komentar Nadzora na dostavljene koordinate novog položaja temelja PPV portala za nošenje napojnog voda EVP Novi Sad
15	7-Aug-24	NAD-NSSB-IŽS-188	Saglasnost na zahtev za isključenje napona i zatvor pruge u stanici Novi Sad
16	7-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2870	Metodologija izvođenja radova na ugradnji podzemnih infiltracionih retenzija na deonici od km 128+949 do km 156+211
17	7-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2871	Dostavljanje adaptacije projektne dokumentacije za ETCS
18	7-Aug-24	NAD-NSSB-MGSI-031	Zamena slabo nosivog tla - Varijacija broj 12
19	7-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2872	Mišljenje Nadzora na predlog Tehničkog rešenja detalja za odvodnjavanje dilatacija nadvožnjaka
20	7-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2873	Dostava listova građevinske knjige za II privremenu situaciju – Aneks 4
21	7-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2874	Mišljenje Nadzora na predlog Metodologije izvođenja radova na izgradnji retenzije 5 na KM 177+375 pruge
22	7-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2875	Dostava liste primedbi
23	7-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2876	Dostava liste primedbi
24	7-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2877	Dostava listova građevinske knjige za III privremenu situaciju – Aneks 3
25	8-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2878	Subotica - PVC cevi kod Majšanskog mosta
26	8-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2879	Hlađenje EE prostorije u staničnoj zgradi u Subotici
27	9-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2880	Izvođačeva 22. privremena situacija br. 034
28	9-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2881	Dostava liste primedbi
29	9-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2882	Dostava liste primedbi
30	9-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2883	Dostava liste primedbi
31	9-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2884	Dostava liste primedbi
32	9-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2885	Povezivanje objekata koji pripadaju staničnom području Subotica
33	9-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2886	Uređenje privremenog putnog prelaza na delu pruge Subotica-Državna granica u km 181+900
34	9-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2887	Uklapanje lepeze pristupnog puta za EVP Vrbas - priključak na DP IB br.15 sa postojećom biciklističkom stazom
35	9-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2888	Dostavljanje ažurirane knjige 8/3.2 sa statusom A i tehničkog rešenja za izradu pločica na ručkama za slepa i slabovida lica (dodatak knjizi 8/3.2)
36	9-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2889	Zamena slabo nosivog tla - Varijacija broj 12
37	12-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2890	Podsetnik u vezi završetka radova i otklanjanja uočenih nedostataka

38	12-Aug-24	NAD-NSSB-IŽS-189	Saglasnost na zahtev za zatvor koloseka i isključenje napona na pruzi Subotica-Palić
39	12-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2891	Dostava liste primedbi
40	12-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2892	Dostava liste primedbi
41	13-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2893	Izrada PIO za knjige 8.3.
42	13-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2894	Izvođačeva 2 privremena situacija Aneks br 3 br.035
43	13-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2895	Dostavljanje ponude - cene za dodatne radove tokom izgradnje stanice Vrbas Nova - Varijacija br. 113
44	13-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2896	Saglasnost na tehničko rešenje pomeranja stubova za osvetljenje u zoni Majšanskog mosta
45	13-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2897	Dodatni radovi na stepeništu stanične zgrade Kisač - Varijacija br.128
46	13-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2898	Dostava liste primedbi
47	13-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2899	Saglasnost na predloženu svetiljku za nadstrešnicu putničke stanice Novi Sad
48	13-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2900	Nalog za obustavu radova
49	15-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2901	Elaborati realizacije obnove geodetske mreže na trasi pruge Novi Sad – Subotica – državna granica
50	15-Aug-24	NAD-NSSB-IŽS-190	Saglasnost na zahtev za zatvor koloseka zbog radova na koloseku u stanici Novi Sad
51	15-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2902	Saglasnost na metodologiju izvođenja radova na izradi stubova rasvete za osvetljenje koloseka u stanicama Novi Sad, Zmajevo, Vrbas Nova i Bačka Topola
52	15-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2903	Dostava listova građevinske knjige za XXV privremenu situaciju
53	15-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2904	Dostava listova građevinske knjige za Sporazum 1
54	15-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2905	Dodatno izmeštanje vodovodne cevi na km 157+443 i zaštitne kanalizacione cevi na km 157+483 – Varijacija 39
55	16-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2906	Promena tehničkog rešenja za izgradnju postojećeg potpornog zida podvožnjaka na km 176+274 – Varijacija 49
56	16-Aug-24	NAD-NSSB-MGSI-032	Uređenje ulice Radoja Domanovića u Zmajevu
57	16-Aug-24	NAD-NSSB-MGSI-033	Funkcionalost i stanje šahta na novoizgrađenoj kanalizaciji na uglu ulica Maksima Gorkog i Đura Đakovića u Subotici (obaveštenje JKP“ Vodovod i Kanalizacija“ Subotica br. 16/32- 2024 od 05.08.2024 god.)
58	16-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2907	Dodatni radovi za pešačke staze u Stepanovićevu, Sajlovu i Rumenki, kao i popravke stepenica u Kisaču, na SS i TK objektima, Varijacija 137
59	16-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2908	Varijacija 138 – Dostavljanje ponude za povezivanje objekata koji pripadaju staničnom području Subotica sa staničnom zgradom, soba 46
60	16-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2909	Tehničko rešenje za oblaganje kegli na nadvožnjacima
61	16-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2910	Saglasnost na svetiljke za nadstrešnicu Putničke stanice Novi Sad
62	16-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2911	Saglasnost na izmenu projekta za izvodjenje deonica 2
63	19-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2912	Dostava liste primedbi
64	19-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2913	Dostava liste primedbi
65	19-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2914	Dostava liste primedbi
66	19-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2915	Dopuna metodologije izvođenja radova na zaštitinim ogradama od km 128+849 do km 184+634
67	19-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2916	Dostava liste primedbi
68	19-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2917	Dostavljanje projektnih crteža dilatacionih spojnica za čeličnu konstrukciju za vijaduktu na km 117+155
69	19-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2918	Predlozi za relokaciju i modifikaciju zaštitne žičane ograde u B.Topoli na km 143+375, desna strana pruge
70	19-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2919	Projekti arhitekture pothodnika i nadstrešnica u železničkim stanicama
71	20-Aug-24	NAD-NSSB-IŽS-191	Saglasnost za zatvaranje koloseka br. 6

72	20-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2920	Varijacija br.132
73	20-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2921	Servisni put 2 ispred stanice B. Topola, km 143+729, desna strana pruge
74	20-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2922	Promena kolovozne konstrukcije na pristupnom putu do ETP-a Subotica
75	20-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2923	Primedbe na dostavljenu dokumentaciju PIO projekata
76	20-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2924	Saglasnost na tehničko rešenje platoa kod objekta JP pošte Srbije uz stanični trg u Subotici
77	20-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2925	Dostava liste primedbi
78	21-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2926	Izmena položaja tri informaciona znaka „30.1“ i jednog informacionog znaka „2“ na peronu 1 u stanici Subotica, prema knjizi 8.3.4
79	21-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2927	Dodatni detalji za UP30 na km 179+700
80	21-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2928	Dostava liste primedbi
81	21-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2929	Putokazna saobraćajna signalizacija za Čenej preko novoizgrađenog nadvožnjaka na km 89+315 pruge u Kisaču
82	21-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2930	Tehničko rešenje dodatnih rashladnih jedinica u SS i TK objektima
83	21-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2931	Izmena HVAC instalacija na 1. spratu SS i TK zgrade u Subotici
84	21-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2932	Geodetske RIA
85	21-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2933	Elaborat realizacije obnove operativnog poligona od km 112 do km 129
86	22-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2934	Dostava liste primedbi
87	22-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2935	Varijacija br. 123
88	23-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2936	Varijacija br.125
89	23-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2937	Varijacija br.141
90	23-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2938	Obnova tačaka Geodetske mreže pruge GMP na deonici od km 76 do km 94
91	23-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2939	Izveštaj Nadzorne službe u vezi zahteva JP ViK Subotica
92	23-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2940	Mišljenje Nadzora na predlog rešenja za izmeštanje (podešavanje) pozicije retenzije 1 na km 175+300 prema knjizi 3.1.3.
93	23-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2941	Mišljenje Nadzora na predlog promene PUP30 (podzemni sistem) u UP30 (otvoreni oblik) na km 179+700 pruge, prema knjizi 3.1.3.
94	23-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2942	Izmena projekta zaštitne ograde na podvožnjacima na km 174+928 i km 177+857
95	23-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2943	Saglasnost na tehničko rešenje raskrsnice ulice Biće Kesića i ul. Vojvode Stepe Stepanovića (državni put IIA reda br. 113 u zoni nadvožnjaka na km 98+149, u sklopu projekta 8/2.1.2.
96	26-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2944	Rešenje za ograde na propustima za male životinje u Subotici
97	26-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2945	Obezbeđenje gradilišta
98	26-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2946	Saglasnost na tehničko rešenje za rashladne jedinice u SS i TK objektima sa problemima pregradne grede
99	27-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2947	Dopuna metodologije izvođenja radova na zaštitnim ogradama za nadvožnjake i podvožnjake od km 128+849 do km 184+634
100	27-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2948	Vagarska kućica u Bačkoj Topoli
101	27-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2949	Merna stanica za detekciju neispravnosti vozova u toku kretanja
102	27-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2950	Mišljenje Nadzora na komercijalnu ponudu iz Varijacije 108
103	27-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2951	Varijacija br. 80 - dopuna
104	28-Aug-24	NAD-NSSB-IŽS-192	Saglasnost za montažu koloseka u hali ETP u Subotici
105	28-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2952	Predlog za novu lokaciju dve informativne table “14” u Subotici
106		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
107		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
108		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
109		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
110		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
111		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	

112		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
113		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
114		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
115		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
116		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
117		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
118		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
119		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
120		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
121		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
122		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
123		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
124		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
125		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
126		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
127		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
128		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
129		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
130		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
131		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
132		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
133		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
134		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
135		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
136		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
137		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
138		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
139		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
140		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
141		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
142		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
143		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
144		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
145		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
146		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
147		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
148		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
149		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
150		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
151		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	
152		NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-	Komentari Nadzora na dostavljenu Metodologiju montaže sa proračunom za čeličnu konstrukciju mosta na km 0+796.33

2.4. Izveštaji sa gradilišta

U izveštajnom periodu Nadzor je pripremio sledeće izveštaje:

Vrsta radova	Izveštaji sa gradilišta	Datum	Pripremio/la
Donji stroj	Nedeljni izveštaj	29.07.-11.08.2024.	D. Ilić
Donji stroj	Nedeljni izveštaj	12.08.-18.08.2024.	D. Ilić
Donji stroj	Nedeljni izveštaj	19.08.-25.08.2024.	D. Ilić
Donji stroj	Nedeljni izveštaj	26.08.-01.09.2024.	D. Ilić
Donji stroj	Nedeljni izveštaj	29.07.-11.08.2024.	M. Jerbić
Donji stroj	Nedeljni izveštaj	12.08.-18.08.2024.	M. Jerbić
Donji stroj	Nedeljni izveštaj	19.08.-25.08.2024.	M. Jerbić
Donji stroj	Nedeljni izveštaj	26.08.-01.09.2024.	M. Jerbić
Hidrotehnika	Nedeljni izveštaj	29.07.-11.08.2024.	T.Kurkić
Hidrotehnika	Nedeljni izveštaj	12.08.-18.08.2024.	T.Kurkić
Hidrotehnika	Nedeljni izveštaj	19.08.-25.08.2024.	T.Kurkić
Hidrotehnika	Nedeljni izveštaj	26.08.-01.09.2024.	T.Kurkić
Hidrotehnika	Nedeljni izveštaj	29.07.-11.08.2024.	M.Grubješić
Hidrotehnika	Nedeljni izveštaj	12.08.-18.08.2024.	M.Grubješić
Hidrotehnika	Nedeljni izveštaj	19.08.-25.08.2024.	M.Grubješić
Hidrotehnika	Nedeljni izveštaj	26.08.-01.09.2024.	M.Grubješić
Kontaktna mreža	Nedeljni izveštaj	29.07.-11.08.2024.	M. Kuzmanović
Kontaktna mreža	Nedeljni izveštaj	12.08.-18.08.2024.	M. Kuzmanović
Kontaktna mreža	Nedeljni izveštaj	19.08.-25.08.2024.	M. Kuzmanović
Kontaktna mreža	Nedeljni izveštaj	26.08.-01.09.2024.	M. Kuzmanović
Kontaktna mreža	Nedeljni izveštaj	29.07.-11.08.2024.	H. Virijević
Kontaktna mreža	Nedeljni izveštaj	12.08.-18.08.2024.	H. Virijević
Kontaktna mreža	Nedeljni izveštaj	19.08.-25.08.2024.	H. Virijević
Kontaktna mreža	Nedeljni izveštaj	26.08.-01.09.2024.	H. Virijević
Objekti	Nedeljni izveštaj	29.07.-11.08.2024.	D. Todorović
Objekti	Nedeljni izveštaj	12.08.-18.08.2024.	D. Todorović
Objekti	Nedeljni izveštaj	19.08.-25.08.2024.	D. Todorović
Objekti	Nedeljni izveštaj	26.08.-01.09.2024.	D. Todorović
Objekti	Nedeljni izveštaj	29.07.-11.08.2024.	I. Babić
Objekti	Nedeljni izveštaj	12.08.-18.08.2024.	I. Babić
Objekti	Nedeljni izveštaj	19.08.-25.08.2024.	I. Babić
Objekti	Nedeljni izveštaj	26.08.-01.09.2024.	I. Babić
Objekti	Nedeljni izveštaj	29.07.-11.08.2024.	D. Daraboš
Objekti	Nedeljni izveštaj	12.08.-18.08.2024.	D. Daraboš
Objekti	Nedeljni izveštaj	19.08.-25.08.2024.	D. Daraboš
Objekti	Nedeljni izveštaj	26.08.-01.09.2024.	D. Daraboš
Mostovi i konstrukcije	Nedeljni izveštaj	29.07.-11.08.2024.	M. Čučković

Mostovi i konstrukcije	Nedeljni izveštaj	12.08.-18.08.2024.	M. Čučković
Mostovi i konstrukcije	Nedeljni izveštaj	19.08.-25.08.2024.	M. Čučković
Mostovi i konstrukcije	Nedeljni izveštaj	26.08.-01.09.2024.	M. Čučković
Mostovi i konstrukcije	Nedeljni izveštaj	29.07.-11.08.2024.	D. Arsić
Mostovi i konstrukcije	Nedeljni izveštaj	12.08.-18.08.2024.	D. Arsić
Mostovi i konstrukcije	Nedeljni izveštaj	19.08.-25.08.2024.	D. Arsić
Mostovi i konstrukcije	Nedeljni izveštaj	26.08.-01.09.2024.	D. Arsić
Mostovi i konstrukcije	Nedeljni izveštaj	29.07.-11.08.2024.	B. Mitrović
Mostovi i konstrukcije	Nedeljni izveštaj	12.08.-18.08.2024.	B. Mitrović
Mostovi i konstrukcije	Nedeljni izveštaj	19.08.-25.08.2024.	B. Mitrović
Mostovi i konstrukcije	Nedeljni izveštaj	26.08.-01.09.2024.	B. Mitrović
Geodezija	Nedeljni izveštaj	29.07.-11.08.2024.	G. Marinković
Geodezija	Nedeljni izveštaj	12.08.-18.08.2024.	G. Marinković
Geodezija	Nedeljni izveštaj	19.08.-25.08.2024.	G. Marinković
Geodezija	Nedeljni izveštaj	26.08.-01.09.2024.	G. Marinković
Geodezija	Nedeljni izveštaj	29.07.-11.08.2024.	M. Vujaklija
Geodezija	Nedeljni izveštaj	12.08.-18.08.2024.	M. Vujaklija
Geodezija	Nedeljni izveštaj	19.08.-25.08.2024.	M. Vujaklija
Geodezija	Nedeljni izveštaj	26.08.-01.09.2024.	M. Vujaklija
Geodezija	Nedeljni izveštaj	29.07.-11.08.2024.	S. Stojković
Geodezija	Nedeljni izveštaj	12.08.-18.08.2024.	S. Stojković
Geodezija	Nedeljni izveštaj	19.08.-25.08.2024.	S. Stojković
Geodezija	Nedeljni izveštaj	26.08.-01.09.2024.	S. Stojković
Signalizacija	Nedeljni izveštaj	29.07.-11.08.2024.	N.Jankulovski
Signalizacija	Nedeljni izveštaj	12.08.-18.08.2024.	N.Jankulovski
Signalizacija	Nedeljni izveštaj	19.08.-25.08.2024.	N.Jankulovski
Signalizacija	Nedeljni izveštaj	26.08.-01.09.2024.	N.Jankulovski
BZR	Nedeljni izveštaj	29.07.-11.08.2024.	D. Manojlović
BZR	Nedeljni izveštaj	12.08.-18.08.2024.	D. Manojlović
BZR	Nedeljni izveštaj	19.08.-25.08.2024.	D. Manojlović
BZR	Nedeljni izveštaj	26.08.-01.09.2024.	D. Manojlović
BZR	Nedeljni izveštaj	29.07.-11.08.2024.	P. Filipović
BZR	Nedeljni izveštaj	12.08.-18.08.2024.	P. Filipović
BZR	Nedeljni izveštaj	19.08.-25.08.2024.	P. Filipović
BZR	Nedeljni izveštaj	26.08.-01.09.2024.	P. Filipović
BZR	Nedeljni izveštaj	29.07.-11.08.2024.	S.Dojić
BZR	Nedeljni izveštaj	12.08.-18.08.2024.	S. Dojić
BZR	Nedeljni izveštaj	19.08.-25.08.2024.	S. Dojić
BZR	Nedeljni izveštaj	26.08.-01.09.2024.	S. Dojić
Mašinske instalacije	Nedeljni izveštaj	29.07.-11.08.2024.	P. Stošić

Mašinske instalacije	Nedeljni izveštaj	12.08.-18.08.2024.	P. Stošić
Mašinske instalacije	Nedeljni izveštaj	19.08.-25.08.2024.	P. Stošić
Mašinske instalacije	Nedeljni izveštaj	26.08.-01.09.2024.	P. Stošić
Regulacija saobraćaja	Nedeljni izveštaj	29.07.-11.08.2024.	S.Radosavljević
Regulacija saobraćaja	Nedeljni izveštaj	12.08.-18.08.2024.	S.Radosavljević
Regulacija saobraćaja	Nedeljni izveštaj	19.08.-25.08.2024.	S.Radosavljević
Regulacija saobraćaja	Nedeljni izveštaj	26.08.-01.09.2024.	S.Radosavljević
Regulacija saobraćaja	Nedeljni izveštaj	29.07.-11.08.2024.	K. Jeftić
Regulacija saobraćaja	Nedeljni izveštaj	12.08.-18.08.2024.	K. Jeftić
Regulacija saobraćaja	Nedeljni izveštaj	19.08.-25.08.2024.	K. Jeftić
Regulacija saobraćaja	Nedeljni izveštaj	26.08.-01.09.2024.	K. Jeftić
Regulacija saobraćaja	Nedeljni izveštaj	29.07.-11.08.2024.	D. Đorđević
Regulacija saobraćaja	Nedeljni izveštaj	12.08.-18.08.2024.	D. Đorđević
Regulacija saobraćaja	Nedeljni izveštaj	19.08.-25.08.2024.	D. Đorđević
Regulacija saobraćaja	Nedeljni izveštaj	26.08.-01.09.2024.	D. Đorđević
Arhitektura	Nedeljni izveštaj	29.07.-11.08.2024.	M. Gavrilović
Arhitektura	Nedeljni izveštaj	12.08.-18.08.2024.	M. Gavrilović
Arhitektura	Nedeljni izveštaj	19.08.-25.08.2024.	M. Gavrilović
Arhitektura	Nedeljni izveštaj	26.08.-01.09.2024.	M. Gavrilović
Arhitektura	Nedeljni izveštaj	29.07.-11.08.2024.	M. Grbić
Arhitektura	Nedeljni izveštaj	12.08.-18.08.2024.	M. Grbić
Arhitektura	Nedeljni izveštaj	19.08.-25.08.2024.	M. Grbić
Arhitektura	Nedeljni izveštaj	26.08.-01.09.2024.	M. Grbić

Izveštaji sa gradilišta nalaze se u prilogu 1.

3 KONTROLA KVALITETA I PREGLED PRIMLJENIH RADOVA

3.1. Kontrola kvaliteta Izvođača

Izvođač nije dostavio detaljan Plan kontrole kvaliteta materijala za predmetni projekat.

3.2. Kontrola kvaliteta Nadzora

Nadzorna služba, u skladu sa Ugovorom, izvodi kontrolna terenska i laboratorijska ispitivanja. Sva ispitivanja se vrše u skladu sa srpskim standardima i normativima.

U izveštajnom periodu vršeno je uzorkovanje i ispitivanje materijala za gornji i donji stroj pruge na osnovu pristiglih prijava (videti tabelu ispod).

EVD/EV2			
Redni broj	**Datum**	**RIA**	**Vršena ispitivanja**
Deonica 1			
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.	24.07.2024.	NSSU-S1.2-D1-SUB-RIA-661	Ev2
Deonica 2			
1.			
2.			
3.			
4.			
5			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.	20.07.2024	NSSU-S2-D2-SUB-RIA-7490	EV2
Deonica 3			
1.			

2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.	11.07.2024	NSSU-S2-D3-SUB-RIA-7395	EV2

4 PLANIRANE I SPROVEDENE AKTIVNOSTI NADZORA U IZVEŠTAJNOM PERIODU

Nadzor redovno prati aktivnosti na gradilištima, po preliminarnoj dinamici radova, a na osnovu dnevnih najava aktivnosti izvođača.

U Prilogu 2 su izveštaji sa gradilišta nadzornih organa. U njima je prezentovano i slikama ilustrovano aktuelno stanje na gradilištima, a ispod je dat kratak pregled aktivnosti Nadzora u izveštajnom periodu, sačinjen na osnovu izveštaja.

4.1. Radovi na deonici Novi Sad – Vrbas (ulaz)

4.1.1. Radovi u infrastrukturnim objektima u službenim mestima

NOVI SAD

Putnički i Teretni pothodnik u stanici Novi Sad, peronski zidovi, peronske nadstrešnice, stanična zgrada

ETP zgrada u Stanici Novi Sad

SS i TK u Sajlovu

KISAČ

Putnički pothodnik u stanici Kisač, peronski zidovi, peronske nadstrešnice, stanična zgrada

Projekat zgrade PS u stanici Kisač

SS i TK u Kisaču

STEPANOVIĆEVO

Putnički pothodnik u stanici Stepanovićevo, peronski zidovi, peronske nadstrešnice

SS i TK u Stepanovićevo

ZMAJEVO

Putnički pothodnik u stanici Zmajevo

Projekat zgrade SS i TK u stanici Zmajevo

Projekat zgrade PSN u stanici Zmajevo

Arhitektonski radovi

<u>Radovi na staničnoj zgradi Novi Sad FAZA 2</u>

- Završava se najviše nedovršenih pozicija u krilu A i B
- Ostali radovi arhitekture su uglavnom na spoljnom uređenju
- Sortiranje ček listi i popravka na peronima neuspešno izvedenog behatona.Prolazak i čekiranje svih perona zajedno sa Izvođačima radova

- HITNO pojačati ekipu radnika koja radi na popravkama, nedostacima i nedovršenim detaljima pojedinih pozicija kako bi se do tehničkog prijema objekta doveo objekat u ispravno stanje, u svemu prema Projektu i Ugovoru. Otklanjati HITNO popravke u svemu prema primedbama NOBO

Radovi na zgradi SS i TK NOVI SAD

- Završeni radovi na fasadi, Nadzor ima primedbe na kvalitet izvođenja
- Unutar objekta nisu otklonjene nepravilnosti od procurivanja, deo opreme unet iako je nadzor ukazao prilikom zajedničkog obilaska na popravke koje se moraju hitno otkloniti, završna obloga podova loše izvedena

Radovi na PS KISAČ

- Radovi na fasadi su u završnoj fazi
- Ukazano pri obilasku da se izvrše popravke, kako unutra tako i spolja,, ne radi se na istim, PREDATA JE ČEK LISTA POPRAVKI I NEDOVRŠENIH RADOVA

Radovi na SS i TK ZMAJEVO

- Izvođenje radova na popravkama hidroizolacije završena. Očekujemo RIA sa elaboratom o izvođenju radova i završetkom svih popravki
- Ostale popravke da se urade u svemu prema ček listama i primedbama NOBO

Radovi na staničnoj zgradi Kisač i SS i TK i pothodnicima i peronima

- Sinhronizovati izvođenje završnih radova na stanici i parternom uređenju.
- Na fasadi SsiTK uraditi popravke koje su nastale uglavnom od procurivanja kod oluka ili oštećenja prilikom instalaterskih radova, foto u prilogu

- U okviru objekta SS i TK rešiti procurivanje na zidu gde je dilatacija. Pri ulasku u objekat je miris vlage iako rade klime u prostoriji. HITNO!!!

4.1.2. Radovi na donjem stroju

Otvorena pruga Novi Sad - Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60)

Kolosek za Titel i Sentu i Teretni koloseci

- Izrada zaštitnog sloja.
- Humuziranje kosina.

Pristupni put objektu ETP Novi Sad na km 77+521.47 pruge.

- Širok iskop.
- Uređenje podtla/posteljice.
- Izrada nosećeg sloja od DKA 0/63mm.

Pristupni put objektu EVP - Novi Sad

- Širok iskop.
- Uređenje podtla/posteljice.
- Izrada nosećeg sloja od DKA 0/63mm.
- Izrada nosećeg sloja od DKA 0/31mm.
- Izrada sloja BNS 22A.
- Izrada sloja AB 11.
- Humuziranje bankina i kosina

Denivelacija lokalnog puta – podvožnjak na km 97+027.31 pruge, Pristušni put objektu SS i TK na km 97+058.16 pruge

Saobraćajnica S1 i Pristušni put objektu SS i TK (ulica Boška Buhe)

- Humuziranje bankina i kosina.

Denivelacija državnog puta IIA reda br.113 – nadvožnjak na km 98+149.45 pruge

- Izrada donjeg nosećeg sloja od DKA 0/63mm.
- Izrada nosećeg sloja od DKA 0/31mm.
- Izrada ivičnjaka.
- Izrada 1. i 2. sloja BNS 22sA.
- Izrada sloja AB 11s.
- Humuziranje bankina i kosina.

Veza sa ulicom Biće Kesića

- Širok iskop.
- Uređenje podtla.
- Izrada nasipa.
- Humuziranje bankina i kosina.

Denivelacija državnog puta IIA reda br.112 – nadvožnjak na km 102+309.98 pruge, devijacija opštinskog puta Kucura - Zmajevo

Državni put, Servisna saobraćajnica S2, S3 i devijacija opštinskog puta Kucura – Zmajevo

- Humuziranje bankina i kosina.

Saobraćajne površine u okviru železničke stanice Zmajevo na km 102+538.39 pruge.

- Širok iskop.
- Uređenje podtla/posteljice.
- Izrada nosećeg sloja od DKA 0/63mm.

Pristupni put objektu ETP Novi Sad na km 77+521.47 pruge.

Otvorena pruga Novi Sad - Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60)



Pristupni put objektu EVP - Novi Sad

Denivelacija državnog puta IIA reda br.113 – nadvožnjak na km 98+149.45 pruge

Denivelacija državnog puta IIA reda br.112 – nadvožnjak na km 102+309.98 pruge, devijacija opštinskog puta Kucura - Zmajevo

Izvršena su geomehanička ispitivanja i u skladu sa rezultatima merenja izvršen je prijem izvedenih slojeva na sledećim deonicama:

- Podtlo odnosno posteljica servisne staze, Pristupni put objektu EVP - Novi Sad.
- Donji noseći sloj od dka 0/63mm servisne staze, Pristupni put objektu EVP - Novi Sad.
- Donji noseći sloj od dka 0/63mm od km 0+085 do km 0+150, Denivelacija državnog puta IIA reda br.113 – nadvožnjak na km 98+149.45 pruge.

- Noseći sloj od dka 0/31mm od km 0+085 do km 0+150, Denivelacija državnog puta IIA reda br.113 – nadvožnjak na km 98+149.45 pruge.
- Noseći sloj od dka 0/31mm servisne staze, Pristupni put objektu EVP - Novi Sad.
- Posteljica pristupnog puta stubu GSM-R Zmajevo, saobraćajne površine u okviru železničke stanice Zmajevo na km 102+538.39 pruge.
- Posteljica parkinga Zmajevo, saobraćajne površine u okviru železničke stanice Zmajevo na km 102+538.39 pruge.
- Posteljica pristupnog puta objektu PSN Zmajevo, saobraćajne površine u okviru železničke stanice Zmajevo na km 102+538.39 pruge.
- Asfaltiranje, izrada sloja BNS 22sA, Denivelacija državnog puta IIA reda br.113 – nadvožnjak na km 98+149.45 pruge.
- Asfaltiranje, izrada sloja AB 11s, Denivelacija državnog puta IIA reda br.113 – nadvožnjak na km 98+149.45 pruge.
- Donji noseći sloj od dka 0/63mm pristupnog puta stubu GSM-R Zmajevo, saobraćajne površine u okviru železničke stanice Zmajevo na km 102+538.39 pruge.
- Donji noseći sloj od dka 0/63mm parkinga Zmajevo, saobraćajne površine u okviru železničke stanice Zmajevo na km 102+538.39 pruge.
- Donji noseći sloj od dka 0/63mm pristupnog puta objektu PSN Zmajevo, saobraćajne površine u okviru železničke stanice Zmajevo na km 102+538.39 pruge.
- Asfaltiranje, izrada sloja BNS 22A servisne staze, Pristupni put objektu EVP - Novi Sad.
- Asfaltiranje, izrada sloja AB11 servisne staze, Pristupni put objektu EVP - Novi Sad.
- Podtlo od km 0+005.00 do km 0+060.58, pristupni put objektu ETP Novi Sad na km 77+521.47 pruge.
- Posteljica od km 0+005.00 do km 0+060.58, pristupni put objektu ETP Novi Sad na km 77+521.47 pruge.
- Asfaltiranje, izrada sloja AB11 servisne staze, Pristupni put objektu EVP - Novi Sad.

4.1.3. Radovi na gornjem stroju

U izveštajnom periodu na prvoj deonici izvođeni su sledeći radovi:

Prijem materijala:

- **Tucanik:**
  - Sajlovo: 1528.76t MEGA INFRASTRUKTURA
    1286.54t MEGA INFRASTRUKTURA
    1188.54t MEGA INFRASTRUKTURA
    1064.60t MEGA INFRASTRUKTURA

Radovi na trasi

<u>Novi Sad-Rumenka</u>

- Polaganje levog teretnog koloseka (km1+163.788-km2+343.724) tip šine 60E1.
- Polaganje skretnica broj 14 i broj 15.
- Mašinsko regulisanje levog teretnog koloseka KM1+020-KM2+340 prvi put.
- Polaganje skretnice broj 13.

- Dinamička stabilizacija levog teretnog koloseka KM1+020-KM2+340 prvi put.
- Polaganje desnog teretnog koloseka km0+998.468-km1+118.468.
- Ugradnja 1 dilatacione sprave na desnom glavnom koloseku na mostu km 81.
- Ugradnja 1 dilatacione sprave na levom glavnom koloseku na mostu km 81.
- Polaganje levog teretnog koloseka (km0+975-km0+998.06).
- Polaganje kolosečne veze između skretnica broj 14-broj 15 u Sajlovu.
- Mašinsko regulisanje levog teretnog koloseka KM1+020-KM2+340 drugi put
- Mašinsko regulisanje desnog teretnog koloseka (km1+300-km1+600)-četvrti put.
- Mašinsko regulisanje desnog teretnog koloseka(km1+600-km2+750)-peti put
- Polaganje kolosečne veze između skretnica broj 13-broj 14 u Sajlovu.
- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka na levom glavnom koloseku (km82+300-km83+000) i desnom glavnom koloseku (km81+500-km82+500).
- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka na levom glavnom koloseku (km82+300-km82+300,km79+386-km79+500) i na desnom glavnom koloseku (km80+800-km81+500).
- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka na levom glavnom koloseku (km80+800-km81+550,km79+158-km79+386), desnom glavnom koloseku km79+950-km80+270.
- Ugradnja štitnih šina na levom i desnom koloseku km81+500.
- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka na levom glavnom koloseku (km81+550-km82+000,km79+158-km79+386), desnom glavnom koloseku (km80+270-km80+800).
- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka na levom glavnom koloseku (km80+700-km80+800).
- Polaganje koloseka za Bečej tip šina 49E1 (km0+000-km0+720).
- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka na levom glavnom koloseku (km80+300-km80+700), desnom glavnom koloseku (km79+750-km79+950).
- Polaganje koloseka za Bečej tip šina 49E1 (km0+720-km1+150)
- Ugradnja skretnice broj 13.
- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka na levom glavnom koloseku (km79+900-km80+300)i na desnom glavnom koloseku (km79+200-km79+750).

Rumenka-Kisač

- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloska na levom glavnom koloseku (km87+459—km87+700, km86+300—km87+000, km84+654—km84+854).
- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloska na levom glavnom koloseku (km87+000-km87+450, km87+700-Km88+450), desnom glavnom koloseku km87+400-km87+500,km84+650-km85+800).
- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloska na levom glavnom koloseku (km84+420-km84+651, km88+450-km89+900) i desnom glavnom koloseku (km85+800-km87+400, km84+400-km84+645, km89+400-km89+800).
- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka na desnom glavnom koloseku (km87+500-km88+700).
- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka na levom glavnom koloseku (km92+000-km92+500).

Kisač-Stepanovićevo

- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka na levom glavnom koloseku km90+800-kn92+000.
- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka na levom glavnom koloseku (km96+500-km97+556).
- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka na levom glavnom koloseku (km95+945-km96+500).
- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka na levom glavnom koloseku (km91+200-km92+600,km92+700-km96+900) i na desnom glavnom koloseku (km91+250-km93+500,km94+000-km96+900).
- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka na levom glavnom koloseku (km96+500-km97+127).

Stepanovićevo-Zmajevo

- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka na desnom glavnom koloseku (km97+800-km98+300,km99+000-km99+200).

Zmajevo-Vrbas Nova

- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka na levom glavnom koloseku km104+600-km112+900,
- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka na desnom glavnom koloseku (km105+000-km112+900).

4.1.4. Radovi na kontaktnoj mreži i elektro-energetskim postrojenjima

Stanica Novi Sad :

- U toku su otklanjanje primedbi sa interno tehnickog prijema.
- Podesavanje SCADA sistema,
- umrežavanje sistema sa rastavljačima na motorni pogon.
- ispitivanje gromobranskog uzemljenja

PS Kisač:

- Izrada uzemljenja vrata i prozora;
- čišćenje;
- postavljanje izolacionih gumenih podmetača,

PSN Zmajevo:

- Izrada uzemljenja vrata i prozora;
- čišćenje;
- postavljanje izolacionih gumenih podmetača

OP Novi Sad-Subotica:

- ispitivanje antipanik rasvete
- ispitivanje uzemljenja stubova rasvete
- ispitivanje uzemljenja na nadvožnjacima i podvožnjacima

Radovi na kontaktnoj mreži

1. **Stanica Novi Sad:**
   - **km 76+210 – km 78+750:**
     - regulacija zateznog polja 1 (23-173), 2 (29-87, 105-163), 7 (30-59), 8 (23-67), 4-1.1 (177-1-45), 4-1 (1-37-1-45);
   - **km 76+660 – km 77+100:**
     - regulacija KM 13 (27-57), 7 (59-79), 8 (60-67), 2 (87-105);
     - regulacija KM 12 (8-111-1), 6 (20-82), ST1 (152-180), 3-1.1 (1-14-1-33);
   - **km 77+671 – km 1+466.6:**
     - regulacija KM 3-1.1 (186-1-1-14); montaža tablica sa oznakama stubova (1-30, 1-31);
     - montaža uzemljenja na 20 mesta (1-3, 1-5, 1-7, 1-9, 1-11, 1-12, 1-14, 1-16, 1-18, 1-20, 1-22, 1-24, 1-26, 1-28, 1-33, 1-36, 1-38, 1-40, 1-42, 1-44);
     - regulacija AB vrednosti na 2 mesta (1-36, 1-44);
     - montaža 2 strujne veze;
     - montaža 28 žica protiv vetra (186-1, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 1-3, 1-5, 1-7, 1-9, 1-11, 1-12, 1-14, 1-16, 1-18, 1-20, 1-22, 1-24, 1-26, 1-28, 1-30, 1-31, 1-33, 1-36, 1-38, 1-40).
2. **OP Novi Sad - Rumenka:**
   - **km 0+867.8DT - km 2+298.79:**
     - montaža pričvrsnika jednostrukih konzola (271, 274, 274-1, 278, 282, 283, 284, 300, 291, 296, 305, 309, 313, 336, 299, 301, 304, 308, 308-1, 314, 315, 345);
     - montaža pričvrsnika dvostrukih konzola (270, 275, 275-1, 286, 290, 295, 322, 326, 330, 358);
     - montaža pričvrsnika za zatezanje čvrste tačke (279, 284, 336);
     - montaža sidara (279, 284 (2 kom), 354 (2 kom), 367 (2 kom));
   - **km 79+950 - km 80+100:**
     - uzemljenje 5 stubova za obilazni vod (G9, G10, G11, G12, G13).
   - **km 1+466.6-1+888.8**
     - regulacija KM 4-1 (1-37-53), D2-1;
     - montaža 4 strujne veze;
   - **km 1+655-2+423:**
     - regulacija skretnica i sekcionih izolatora na 2-1;
     - regulacija AB vrednosti na 1 mestu (33).
   - **km 1+447 – km 2+443:**
     - regulacija KM 3-1 (1-44-103);
     - montaža 3 strujnih veza (1-91, 2-99);
   - **km 1+497 – km 0+410DT:**
     - regulacija AB vrednosti na 1 (26), 3-1 (1-40-68);
     - uzemljenje 20 stubova (22, 26, 30, 36, 40, 41, 41-1, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 74, 75, 79, 83, 87, 91, 124, 125, 128, 129, G13);
     - regulacija KM 5-1 (111-1-135);
     - montaža 14 strujnih veza i žica protiv vetra (111-1, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 125, 129, 132, 135, 138, 141).
3. **Stanica Rumenka:**
   - **km 83+000 - km 83+425:**
     - montaža donje ploče sidra (40).

4. **Stanica Kisač:**
   - **km 89+600 - km 91+475:**
     - uzemljenje 19 stubova (63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84).
5. **Stanica Stepanovićevo:**
   - **km 96+600 - km 98+075:**
     - uzemljenje 22 stuba (1, 2, 3, 4, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32);
6. **km 96+600 - km 98+075:**
     - uzemljenje 34 stuba (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58);
   - **km 96+600 - km 98+075:**
     - uzemljenje 10 stubova (59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68).
7. **Stanica Zmajevo:**
   - **km 101+900 - km 103+675:**
     - uzemljenje 46 stubova (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19-1, 20-1, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80);
   - **km 101+900 - km 103+675:**
     - uzemljenje 47 stubova (19-2, 20-2, 21, 22, 23, 24, 25, 25-1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 62, 64, 66, i4, i5, G1, G2, G3, G4, G5, G6).
8. **OP Zmajevo - Vrbas (nova):**
   - **km 105+700 - km 110+425:**
     - uzemljenje zaštitne mreže na mostu na 2 mesta.

4.1.5. Radovi na SS i TK sistemima

Završen je tehnički prijem (DeBo) signalnih sistema na stanicama Novi Sad, Sajlovo, Rumenka i Kisač od strane komisije za tehnički prijem SS/TK sistema, a sistemi koji su prošli prijem su signalno sigurnosni sistem (CBI), CTC sistem, signali, brojači osovina, skretničke postavne sprave itd.

4.1.6. Radovi na hidrotehničkim instalacijama

Izmeštanje cevovoda zalivnog sistema "CARNEX"

Mašinski iskop za ugradnju crpne stanice za odvodnjavanje galerije na km 81+284



4.1.7. Geodetski radovi

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola naglavne grede S4, broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-RIA-g043.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
2		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola oplate na obalnom stubu S1, broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-RIA-g038-R1.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
3		Pristupni put objektu EVP - Novi Sad na km 79+900. Geodetska kontrola iskopa od PR 200 do PR 211, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-EVP-RIA-g002.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
4		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola obeležavanja šipa br. S3-7, broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-RIA-g044.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
5		Pristupni put objektu EVP - Novi Sad na km 79+900. Geodetska kontrola DKA 0/63 od PR 200 km 0+004 do PR 211 km 0+108, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-EVP-RIA-g003.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
6		Deonica Stepanovićevo Zmajevo - Saobraćajnica na km 98+149,95. Geodetska kontrola DKA 0/63 od PR 01 km 0+085 do PR 04 km 0+150, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-OP5-RIA-g030.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
7		Deonica Stepanovićevo Zmajevo - Saobraćajnica na km 98+149,95. Geodetska kontrola DKA 0/31 od PR 01 km 0+085 do PR 04 km 0+150, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-OP5-RIA-g031.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
8		Pristupni put objektu EVP - Novi Sad na km 79+900. Geodetska kontrola DKA 0/31 od PR 200 km 0+004 do PR 211 km 0+108, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-EVP-RIA-g005.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
9		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola obeleženog šipa S3-3, broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-RIA-g045.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
10		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola obeleženog šipa br. S3-1, broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-RIA-g046.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.

11		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola anker ploče za privremene oslonce na stubnom mestu S1, broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-RIA-g047.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
12		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola obeleženog šipa S3-2, broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-RIA-g048.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
13		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola oplate temelja privremenih oslonaca za čeličnu konstrukciju L4-1,L5-1 i L5-2, broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-RIA-g049-R1.	Pozicija nije u granicama dozvoljenih odstupanja.
14		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola oplate stuba S4, broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-RIA-g050.	Pozicija nije u granicama dozvoljenih odstupanja.
15		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola pozicija anker ploča na stubnom mestu S4, broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-RIA-g051.	Pozicija nije u granicama dozvoljenih odstupanja.
16		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola oplate stuba S4, broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-RIA-g050-R1.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
17		Most na km 0+796,33. Geodetska kontrola pozicija anker ploča na stubnom mestu S4, broj najave NSSU-S1-D1-STR-BR1-RIA-g051-R2.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
18		km79+900, EVP Novi Sad. Geodetska kontrola kote oslanjanja separatora, broj najave NSSU-S1-D1-HYD-SEP-RIA-g001.	Pozicija je geodetski snimljena.
19		PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP - NOVI SAD NA KM77+521,47. Geodetska kontrola iskopa od PR 1 do PR 11, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-ETP-RIA-g002.	Nemoguće izvršiti kontrolu – odbijeno.
20		PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP - NOVI SAD NA KM77+521,47. Geodetska kontrola posteljice od PR 1 do PR 11, broj najave NSSU-S1-D1-SUB-ETP-RIA-g003.	Pozicija je u granicama dozvoljenih odstupanja.
21			
22			

23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			

38			
39			
40			

4.1.8. Radovi na termotehničkim i mašinskim instalacijama

Projekat termotehničkih instalacija – Stanična zgrada u železničkoj stanici Novi Sad.

- Privode se kraju radovi na termotehničkim instalacijama, u okviru prizemlja, 1. i 2. sprata krila „A“, prizemlja i 1. sprata krila „B“, kao i podruma krila „D“;
- U okviru prizemlja krila „A“, u hodniku prizemlja još nije završeno povezivanje fan coil uređaja sa PVC cevnom mrežom za odvod kodenzata. Radovi u zastoju;
- Završena je ugradnja spoljašnjih jedinica (svih 21 komada je postavljeno na nosače). Završeno je povezivanje istih na cevnu mrežu, ali nije sva cevna mreža izolovana. Takođe, nisu izvedeni elektro komunikacijski kablovi između unutrašnjih i spoljašnjih jedinica. Ovi radovi su naznačeni Izvošaču kao urgentni.
- U prostoriji A0.15a, demontirane su unutrašnje rashladne jedinice, po nalogu elektro nadzora, zbog blizine razvodnih ormana. Završeni su radovi na ugradnji rashladnih jedinica na novom položaju, kao i odvod kodenzata. Ostalo je da se poveže napajanje.
- Za prostorije A0.19 i A0.22 dopremljeni su klima ormani i istu su postavljeni na projektom određene pozicije i njihovo povezivanje na cevnu mrežu i kondenzat je je završeno, ali su ostali neizvedeni elektro komunikacijski kablovi;
- U okviru 1. sprata krila „A“ završeni prodori cevne mreže fan coil uređaja. Završena je izrada mreže za odvod kondenzata. Završeno je povezivanje fan coil uređaja na cevnu mrežu. U prostorijama A1.22 i A1.25, Izvođač je greškom zamenio mesta fan coil uređajima i iste još nije postavio po projektu. Ove prostorije su i deo „NIIAS“ projekta i isti nije usaglašen sa projektom „CIP“. Nakon sastanka sa Projektantima dogovoreno je da „NIIAS“ koriguje svoj projekat. Dostavili su njihov predlog rešenja ali je isti vraćen sa strane Nadzora na ponovnu tehničku analizu. „NIIAS“ još uvek nije dostavio nikakav odgovor. Radovi još nisu započeti u ovoj prostoriji.
- U toku je izrada ventilacionog sistema za toalete na prvom spratu, u blizini Velike sale. Izmena je dostavljena Nadzoru na odobrenje i ista je prihvaćena. Radovi su u zastoju;
- U Velikoj Sali su završeni radovi na izradi ventilacionih kanala i završeno ke povezivanje kanala sa novom klima komorom na 2. spratu. Takođe, u prostoriji A1.30 izvučena je cevna mreža od bakra za rashladni sistem, kao i kondenz mreža, i postavljene sve tri unutrašnje split jedinice i iste povezane na mrežu i puštene u rad. U samoj Velikoj Sali postavljena je jedna parapetna rashladna jedinica i povezana na mrežu;
- Klima komore su postavljene u okviru mašinske prostorije na 2. spratu, završena je njena ugradnja, urađena je i automatika ali nedostaje napajanje, kao i elektro povezivanje PP klapni.

- Isporučena je i nova klima komora za Veliku salu, završena je njena ugradnja, urađena je i automatika ali nedostaje napajanje, kao i elektro povezivanje PP klapni.
- Izvršeno je postavljanje čilera na predviđeni temelj u nastavku krila „D“ i završeni su radovi na izvođenju instalacije radi povezivanja čilera i cevne mreže. U toku su radovi na termoizolaciji cevi. Takođe nedostaje napajanje i isto je u toku. Završeni su radovi na izgradnji čelične konstrukcije„kaveza“ čilera;
- U okviru krila „A“, ventilatori za izvlačenje vazduha su namontirani, potrebno je napajanje za ispitivanje i puštanje u rad.
- U prizemlju krila „B“, u okviru prodora kroz prostorije završena je ugradnja ventilacionih kanala, izvršena je i ugradnja rešetki. Radovi na cevnoj mreži grejanja, iz pravca krila „A“, su završeni do nove toplotne podstanice. Završeno je postavljanje fan coil uređaja i njihovo povezivanju;
- U vestibilu krila „B“ rešen je problem trase ventilacionog kanala za kafić ispod galerije i ugradnja istog je završena. Na dostavljena rešenja Projektanata data je saglasnost Nadzora, kao i usmeno odobrenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada. Završeni su radovi na izradi trase cevne mreže za fan coil uređaje, kao i postavljanje samih uređaja. Završeno povezivanje uređaja mrežu. Završeni su i radovi na postavljanju vazdušnih zavesa na ulaznom delu u vestibil;
- Na 1. spratu krila „B“, kroz budući hodnik, završena je ugradnja mlaznica, a u skladu sa zadnjim rešenjem Projektanta. Takođe, u prostorijama je završena ugradnja ventilacionog sistema i ugradnja fan coil uređaja; Završeno je i postavljanje vazdušne zavese na ulaznom delu sa perona;
- Na 1. spratu krila „D“ u prostoriji D1.37a ugrađene su dve split klime, dok su spoljašnje jednice postavljene na krov krila „D“.
- U podrumu krila „D“ u prostorijama D0.05 i D0.08 ugrađene su po dve split klime, dok su spoljašnje jednice postavljene na krov krila „D“.
- U podrumu krila „D“ završeno je postavljanje termo-izolacije na čilerskom cevnom sistemu DN200. Završeno je i oblaganje limom;
- U budućoj toplotnoj podstanici završeno je 99% mašinskih radova na montaži nove mašinske opreme i povezivanje sa postojećom toplotnom podstanicom. U toku su radovi na ugradnji posuda za odvazdušenje, finalno stezanje prirubnica i farbanje.

Projekat liftova u staničnoj zgradi u železničkoj stanici u Novom Sadu - Krilo A i Krilo B

- Završeni su radovi na ugradnji lifta L1 u okviru krila „A“. Urađeni su građevinski radovi na zatvaranju prostora između liftovskog okna i zgrade stanice. Određeni su položaji dodatnih pozivnih kutija kako bi se ispunili zahtevi standarda EN 81-70 i čeka se ugradnja istih.
- Nije započeto oblaganje poda ispred ulaza;
- U okviru vestibila krila „B“, za lift L2, završena je rekonstrukcija lifta i završena je kontrola i ocenjivanje usaglašenosti od strane Imenovanog tela za bezbednost liftova, ali dokumentacija još nije dostavljena. Lift je pušten u rad.

Projekat mašinskih instalacija – projekat liftova u pothodniku u železničkoj stanici u Novom Sadu

- Lift L1: pušten je u rad jer su zadovoljeni svi preduslovi za njegov rad.
- Lift L2: pušten je u rad jer su zadovoljeni svi preduslovi za njegov rad;
- Lift L3: pušten je u rad jer su zadovoljeni svi preduslovi za njegov rad;
- Lift L4: Izvedeni su montažno-instalaterski radovi. Urađeni su radovi na oblaganju oko okna lifta i na samom podu kabine. Na peronu, urađeno je oblaganje oko okna lifta, ostalo je samo ispod elektro ormana da se finalizuje i dok se to ne uradi lift neće biti pušten u rad, zbog bezbednosti. Završen je pregled od strane Imenovanog tela za bezbednost liftova i izdat je Sertifikat o završnoj kontroli, Izveštaj o ocenjivanju usaglašenosti i Deklaracija o usaglašenosti;
- Na svim liftovima, potrebna je završena obrada ivica između samih liftova i okana.
- Na peronima, završeni su ventilacioni otvori na samom liftovskom oknu (za odimljavanje u slučaju požara). Ostalo je da se postave zaštitna mreža na ulazu lula, radi sprečavanja ulaska ptica i insekata.



Projekat izmeštanja i zaštite gasovoda "NOVI SAD-GAS"

- **km 97+015 ÷ 97+034 (Stepanovićevo):**
  - Usled izgradnje nove saobraćajnice, izvršeno je dodatno izmeštanje gasovoda Ø63 mm i Ø110 mm, kao i pomeranje odušnih lula. Dana 20.06. je ekipa Novi Sad gasa uspešno završila prevezivanje nove i postojeće trase gasovod i isti je pušten u rad.

Projekat izmeštanja i zaštite gasovoda P.S. "TELEFONIJA" a.d. u stečaju

- Izdato je Rešenje o odobrenju izvođenja radova.
- Potrebno je da se preda dokumentacija za izdavanje Prijave radova.
- Radovi na povezivanju postojećih i novoizvedenih trasa gasovoda su završeni.

Projekat mašinskih instalacija – projekat liftova u pothodniku TPS u Novom Sadu

- Lift L1 je ugrađen na svoju poziciju i radovi su završeni, ali sa nedostacima. Nisu završeni građevinski radovi. Nije završeno zatvaranje otvora na peronu gde je prvobitno planirano da bude elektro orman, kao i u pothodniku na prilazu liftu. U oknu lifta je dosta vode. Napajanje je dovedeno ali nije povezano, a uzemljenje nije ni dovedeno. Potrebno je ugraditi pozivnu kutiju na peronu zbog usaglašavanja sa standardom EN 81-70. Otvori za

provetravanje su zaštićeni žaluzinom i komarnikom. Lift nije dovoljno zaštićen od atmosferskih padavina.

- Lift L2 je ugrađen na svoju poziciju i radovi su završeni, ali sa nedostacima. Nisu završeni građevinski radovi. Nije završeno zatvaranje otvora na peronu gde je prvobitno planirano da bude elektro orman, kao i u pothodniku na prilazu liftu. Napajanje i uzemljenje je dovedeno, ali nije povezano. Otvori za provetravanje su zaštićeni žaluzinom i komarnikom. Lift nije dovoljno zaštićen od atmosferskih padavina.
- Lift L3 je ugrađen na svoju poziciju i radovi su završeni, ali sa nedostacima. Nisu završeni građevinski radovi. Nije završeno zatvaranje otvora na peronu gde je prvobitno planirano da bude elektro orman, kao i u pothodniku na prilazu liftu. Napajanje i uzemljenje je dovedeno, ali nije povezano. Otvori za provetravanje su zaštićeni žaluzinom i komarnikom. Lift nije dovoljno zaštićen od atmosferskih padavina.
- Ukinuto je obezbeđenje gradilišta, što otvara mogućnost nezakonitog otuđenja delova i opreme ugrađenih liftova.
- Završen je i pregled od strane Imenovanog tela za bezbednost liftova i izdat je Sertifikat o završnoj kontroli, Izveštaj o ocenjivanju usaglašenosti i Deklaracija o usaglašenosti.
- Poslat je dopis Izvođaču sa navedenim nedostacima.

Projekat mašinskih instalacija – projekat liftova u pothodniku Stepanovićevo

- Završeni su instalatersko-montažni radovi na ugradnji liftova L1 i L2.
- Lift L1 je ugrađen na svoju poziciju i radovi su završeni, ali sa nedostacima. Napajanje i uzemljenje lifta je izvedeno do lifta, ali nije još povezano. Elektro orman je postavljen na poziciju. Još uvek se izvode građevinski radovi na vetrobranima, tako da nije izvršena ni ugradnja pozivne kutije na istom, zbog usaglašavanja sa standardom EN 81-70. Nisu završeni građevinski radovi u pothodniku na prilazu liftu. Otvore za provetravanje je potrebno zaštititi žaluzinom i komarnikom.
- Lift L2 je ugrađen na svoju poziciju i radovi su završeni. Elektro orman je postavljen na poziciju. Napajanje i uzemljenje lifta je izvedeno do lifta, ali nije još povezano. Još nisu završeni građevinski radovi na prilazima lifta na peronu i međustanici. Takođe ni vetrobrani nisu još uvek postavljeni, tako da nije izvršena ni ugradnja pozivne kutije na istom. Nisu završeni građevinski radovi u pothodniku na prilazu liftu. Otvore za provetravanje je potrebno zaštititi žaluzinom i komarnikom.
- Poslat je dopis Izvođaču sa navedenim nedostacima.

Projekat mašinskih instalacija – projekat liftova u pothodniku Zmajevo

- Lift L1 je ugrađen na svoju poziciju i radovi su završeni, ali sa nedostacima. Napajanje i uzemljenje lifta je izvedeno do lifta, ali nije još povezano. Elektro orman je postavljen na poziciju. Još uvek se izvode građevinski radovi na vetrobranima, tako da nije izvršena ni ugradnja pozivne kutije na istom, zbog usaglašavanja sa standardom EN 81-70. Nisu završeni građevinski radovi u pothodniku na prilazu liftu. Otvore za provetravanje je potrebno zaštititi žaluzinom i komarnikom.
- Lift L2 je ugrađen na svoju poziciju i radovi su završeni, ali sa nedostacima. Napajanje je dovedeno do lifta ali nije povezano, a uzemljenje nije ni dovedeno. Elektro orman je postavljen na poziciju. Još uvek se izvode građevinski radovi na vetrobranima, tako da nije izvršena ni ugradnja pozivne kutije na istom, zbog usaglašavanja sa standardom EN 81-70. Nisu završeni građevinski radovi u pothodniku na prilazu liftu. Otvore za provetravanje je potrebno zaštititi žaluzinom i komarnikom.

- Završen je i pregled od strane Imenovanog tela za bezbednost liftova i izdat je Sertifikat o završnoj kontroli, Izveštaj o ocenjivanju usaglašenosti i Deklaracija o usaglašenosti.
- Poslat je dopis Izvođaču sa navedenim nedostacima.

Projekat mašinskih instalacija – projekat liftova u pothodniku Kisač

- Lift L1 je ugrađen na svoju poziciju i radovi su završeni, ali sa nedostacima. Napajanje i uzemljenje lifta je izvedeno do lifta i isti su povezani. Elektro orman je postavljen na poziciju. Ugrađena je pozivna kutija u pothodniku i usklađena je sa standardom EN 81-70, kao i pozivna kutija na štoku lifta na peronu. Nije izvršena ugradnja pozivne kutije na vetrobranu, zbog usaglašavanja sa standardom EN 81-70. Nisu završeni građevinski radovi u pothodniku na prilazu liftu. Otvore za provetravanje je potrebno zaštititi žaluzinom i komarnikom. Prilikom sertifikacije ustanovljeni su problemi sa kočnicom koji će naknadno biti otklonjeni.
- Lift L2 je ugrađen na svoju poziciju i radovi su završeni, ali sa nedostacima. Napajanje je dovedeno do lifta ali nije povezano, a uzemljenje nije ni dovedeno. Elektro orman je postavljen na poziciju. Ugrađena je pozivna kutija u pothodniku i usklađena je sa standardom EN 81-70, kao i pozivna kutija na štoku lifta na peronu. Nije izvršena ugradnja pozivne kutije na vetrobranu, zbog usaglašavanja sa standardom EN 81-70. Nisu završeni građevinski radovi u pothodniku na prilazu liftu. Otvore za provetravanje je potrebno zaštititi žaluzinom i komarnikom. U oknu postoji voda.
- Završen je i pregled od strane Imenovanog tela za bezbednost liftova i izdat je Sertifikat o završnoj kontroli, Izveštaj o ocenjivanju usaglašenosti i Deklaracija o usaglašenosti.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Sajlovo

- Na samom terenu utvrđeno je postojanje pregradne grede u budućem duplom podu. Predmetna greda jasno deli SS prostoriju na dva dela, što je neprihvatljivo sa stanovišta hlađenja opreme jer hlađenje klima ormanima se odvija iz duplog poda, preko podnih rešetki. Postavljene pregradne grede su sada fizička prepreka za protok ohlađenog vazduha i onemogućavaju hlađenje opreme. Poslat je dopis Izvođaču i nezvanično se planira ugradnja dodatnih podpaflonskih jedinica, koje će imati ulogu rezervnih.
- Takođe, završena je ugradnja svih unutrašnjih i spoljašnjih jedinica split sistema i ugradnja kontrolera. Završena je i ugradnja svih klima ormana sa pratećom opremom. Završena je i ugradnja podnih rešetki.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Rumenka

- Na samom terenu utvrđeno je postojanje pregradne grede u budućem duplom podu. Predmetna greda jasno deli SS prostoriju na dva dela, što je neprihvatljivo sa stanovišta hlađenja opreme jer hlađenje klima ormanima se odvija iz duplog poda, preko podnih rešetki. Postavljene pregradne grede su sada fizička prepreka za protok ohlađenog vazduha i onemogućavaju hlađenje opreme. Poslat je dopis Izvođaču i nezvanično se planira ugradnja dodatnih podpaflonskih jedinica, koje će imati ulogu rezervnih.
- Takođe, završena je ugradnja svih unutrašnjih i spoljašnjih jedinica za klima ormane. Završena je i ugradnja svih klima ormana sa pratećom opremom. Završena je i ugradnja podnih rešetki, ali u pogrešnom broju komada. Odvod kodenzata je izveden na samom stepeništu i Izvođač je opomenut da što pre krene sa dogovorenim upojnim jamama.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Kisač

- Završena je ugradnja svih unutrašnjih i spoljašnjih jedinica split sistema i ugradnja kontrolera. Takođe, ugrađena su i dva klima ormana sa pratećom opremom, od predviđena četiri.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Zmajevo

- Završena je ugradnja svih unutrašnjih i spoljašnjih jedinica split sistema i ugradnja kontrolera. Takođe, ugrađena su i dva klima ormana sa pratećom opremom, od predviđena četiri. Druga dva klima ormana su unešena, ali rdovi na instalaciji nisu još započeti.
- Završena je sanacija hidroizolacije i potrebno je proveriti unutrašnje jedinice da li su oštećena prilikom radova, iako su iste bile zaštićene folijama i najlonima.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada postrojenja za senkcionisanje – PS Kisač

- Završena je kompletna ugradnja 2 klima ormana.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada elektrovučne podstanice – EVP Novi Sad

- Završena je kompletna ugradnja tri jedinice split sistema. Takođe, završena je i ugradnja i 2 klima ormana. Završena je i ugradnja ventilatora, samo nisu povezani na napajanje. Postavljen je i mobilni elektro radijator.

4.1.9. Mostovi i inženjerske konstrukcije

PODVOŽNJAK PARTIZANSKA ULICA NA KM 77+807.99

- U toku je sanacija kegli.

GALERIJA NA KM 78+377,03

- U toku je postavljanje zaštitne ograde.

MOST NA KM 0+796

- Završeno je betoniranje šipova S3-6, S3-7, S3-4, S3-3, S3-1, S3-2.
- Završeno betoniranje naglavne grede S4.
- Završena izrada bitumenske hidroizolacije naglavne grede S4.
- U toku je izrada zagata na stubnom mestu S2.
- Završeno betoniranje oporca S1
- Završena je izrada zagata na stubnom mestu S2.
- U toku je izrada klina na stubnom mestu S1.
- Završeno je betoniranje oporca S4.
- U toku je priprema za PIT test šipova na stubnom mestu S2.
- U toku je izrada zagata na stubnom mestu S3.
- U toku je betoniranje temelja privremenih oslonaca.

MOST NA KM 81+644

- Postavljeni su pokrivni limovi balastnim zidovima na mestima dilatacija.

GALERIJA NA KM 82+159,77

- U toku je sanacija na mestima kontakta potpornih zidova i galerije.

Nadvožnjak na km 89+315

- U toku je oblaganje kegli.
- Završena je ugradnja pokrivnih limova na dilatacijama. Izvođač treba da izvrši korekcije prem komentarima Nadzora.



Nadvožnjak na km 92+768,08

- Završena ugradnja pokrivnih limova na dilatacijama. Izvođač treba da izvrši korekcije prem komentarima Nadzora.

NADVOŽNJAK NA KM 95+739

- Završena ugradnja zaštitne ograde.

PODVOŽNJAK NA KM 97+027,31

- U toku je izrada glinenog čepa.

NADVOŽNJAK NA KM 98+149

- Završena ugradnja zaštitne ograde.
- Završena ugradnja pokrivnih limova na dilatacijama.

Most na km 101+132,33

- Završeno postavljanje zaštitne ograde. Izvođač treba da izvrši korekcije prema komentarima Nadzora.
- Završena ugradnja pokrivnih limova na dilatacijama. Izvođač treba da izvrši korekcije prema komentarima Nadzora.



Nadvožnjak na km 102+309

- Završena ugradnja zaštitne ograde.

NADVOŽNJAK NA KM 105+797,12

- U toku je ugradnja zaštitne ograde.

NADVOŽNJAK NA KM108+115

- Završeno postavljanje zaštitne ograde.
- Završena ugradnja pokrivnih limova na dilatacijama. Izvođač treba da izvrši korekcije prema komentarima Nadzora.
- Završena obloga kegle na S6..

Propust na km 83+567.31

- Ugrađena je ograda na propustu.

Propust na km 86+748

- Ugrađena je ograda na propustu.

Propust na km 89+790

- Ugrađena je ograda na propustu.

Propust na km 95+376

- Ugrađena je ograda na propustu.

Propust na km 98+212

- Ugrađena je ograda na propustu.

Propust na km 103+602

- Ugrađena je ograda na propustu.

Propust na km 105+065

- Završeno zasipanje propusta.
- Završena izrada cementne stabilizacije.

RADOVI NA GSMR STUBOVIMA

Stacionaža		Preostali radovi
Stanica Novi Sad	km 77+077	Radovi na konstrukciji su završeni.Preostalo je popraviti antkorozionu zaštitu.
Sajlovo	km 80+650	
Rumenka	km 84+072	
Kisač	km 90+473	
Stepanovićevo	km 97+081	
Zmajevo	km 102+481	
Bačko Dobro Polje	km 108+077	

RADOVI NA ZIDOVIMA PROTIV BUKE

Redni broj konstrukcije	Stacionaža pruge		Položaj u odnosu na prugu	Visina	Dužina	Br. Stubova	Status
	Početak	Kraj		(m)	(m)		
	(km)	(km)					
2	89+701,01	89+816,89	Levo	2,50	116,00	30	Urađeno
3	89+920,03	90+036,03	Levo	2,50	116,00	32	Urađeno
4	89+940,00	90+063,97	Desno	2,50	124,00	35	Urađeno
5	90+530,26	90+626,23	Desno	2,5-3,0	96,00	25	Urađeno
6	90+542,26	92+150,09	Levo	2,5-4,0	1608,00	408	Urađeno
7	95+876,32	96+472,33	Levo	2,50	596,00	151	Urađeno
8	96+941,90	97+112,05	Levo	2,5-4,0	172,00	49	Urađeno
9	96+962,56	97+042,56	Desno	2,5-3,0	80,00	25	Urađeno
10	97+106,45	97+278,22	Desno	2,50	173,00	44	Urađeno
11	101+118,35	101+334,35	Desno	2,50	216,00	55	Urađeno
12	101+514,47	101+818,65	Desno	2,50	304,00	78	Urađeno
13	102+203,89	102+475,49	Desno	2,50	192,00	49	Urađeno
14	102+561,40	102+667,4	Desno	2,5-4,0	112,74	30	Urađeno
15	102+805,90	102+889,9	Desno	2,5-4,0	84,00	22	Urađeno

4.2. Radovi na deonici Vrbas (ulaz) – Naumovićevo (ulaz)

4.2.1. Radovi u infrastrukturnim objektima u službenim mestima

STANICA VRBAS

Stanična zgrada na km 113+610.13

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova

Pothodnik na km 113+610.13

- U toku je izrada konstrukcije nadstrešnica nad pothodnikom
- U toku je izvođenje arhitektonskih radova unutar pothodnika

Peronski zidovi

- Završeno je betoniranje peronskih zidova (u toku je polaganje behaton kocki)
- U toku je izvođenje pripremnih radova za izradu habajućeg sloja
- U toku je montaža peronskih ograda

Peronske nadstrešnice

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova

TK okna

- U toku je izvođenje završnih radova na tk oknima.

SS TK Vrbas

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova

EVP Vrbas km 119+480

- U toku je montaža ograde oko postrojenja
- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju

TK objekat (Vrbas Nova)

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju

Vrbas atar TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju

<u>STANICA LOVĆENAC</u>

Pothodnik na km 129+485

- U toku je montaža nadstrešnice
- U toku je izrada štampanog betona

TK okna

- U toku je izvođenje završnih radova

Peronski zidovi

- Radovi nisu izvođeni
- Preostali radovi: izrada habajućeg sloja izrada behatona

Peronske nadstrešnice

- Završeno je betoniranje temelja nadstrešnica
- U toku je montaža peronskih nadstrešnica

Peronske ograde

- U toku je montaža rukohvata ograda

SS TK

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova

PS Mali Iđoš

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju
- Napomena: 13.08.2024 je izvršen interni tehnički prijem i sačinjena je lista nedostataka

MALI IĐOŠ

TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskh radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju
- Napomena: 14.08.2024 je izvršen interni tehničk prijem i sačinjena je lista nedostataka

STANICA BAČKA TOPOLA

Pothodnik na km 143+504

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izrada štampanog betona
- U toku je montaža konstrukcije nadstrešnica

SS i TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova

Vojna rampa na km 143+100

- Završeno je betoniranje vojne rampe

TK okna

- U toku je izvođenje završnih radova na tk oknima

Peronski zidovi

- Završeno je betoniranje pristupne rampe

Peronske ograde i temelji signalizacije

- U toku je montaža ograde

Betonska konstrukcija vage

- U toku je izvođenje završnih radova

PSN Bačka Topola

- U toku je izvođenje završnih radova
- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- Napomena: 13.08.2024 je izvršen interni tehničk prijem i sačinjena je lista nedostataka

MALI BEOGRAD

TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- Napomena: 14.08.2024 je izvršen interni tehnički prijem i sačinjena je lista nedostataka

STANICA ŽEDNIK

Pothodnik na km 157+139

- U toku je montaža konstrukcije nadstrešnice

PS Žednik

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju
- Napomena: 13.08.2024 je izvršen interni tehnički prijem i sačinjena je lista nedostataka

SS i TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova

TK okna

- U toku je izrada završnih radova tk okana
- Stepen završenosti tk okana u stanici Žednik je 98%

Peronski zidovi

- U toku je izrada behaton ploča prilaznih rampi
- U toku je montaža perosnkih nadstrešnica
- U toku je montaža peronskih ograda

VERUŠIĆ

TK objekat

- U toku je izvođenje arhitektonskih radova
- U toku je izvođenje radova na parternom uređenju
- Napomena: 14.08.2024 je izvršen interni tehnički prijem i sačinjena je lista nedostataka

TKKO okna (TKKo okna duž trase TKKO25-TKKO76)

- U toku su završni radovi na izradi tkk okana

Arhitektonski radovi

Stanična zgrada Vrbas Nova

- U svemu prema dogovorenoj dinamici treba ubrzati radove, kako na stančnoj zgradi , tako i na peronima, platou, nadstrečnicama, a u svemu prema dinamici i dogovoru na zajedničkim sastancima

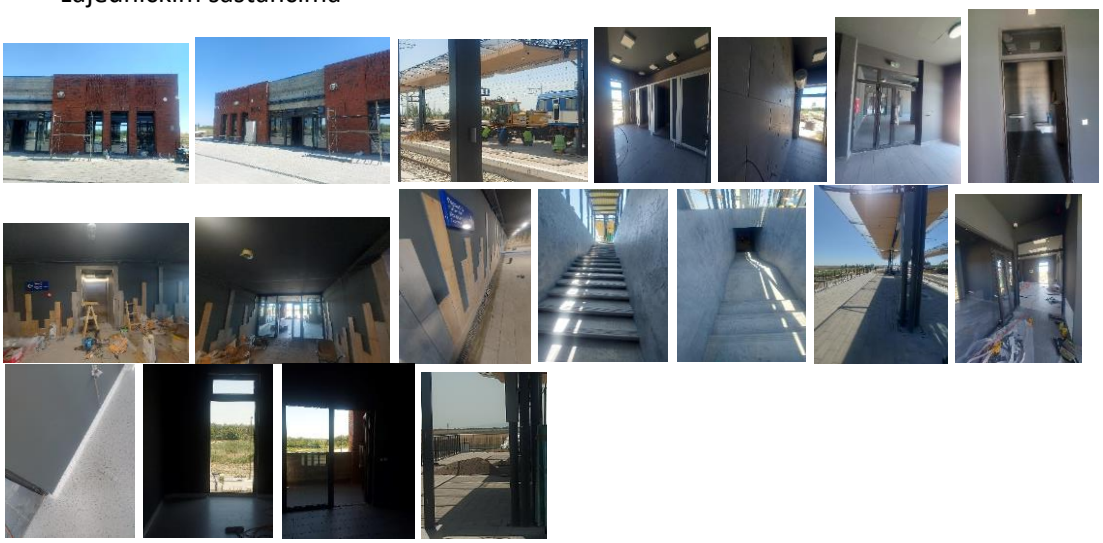

Radovi na zgradi SS i TK Vrbas Nova

- Završetak ostalih radova u svemu prema projektu i spisku nedostataka. Nema radnika na gradilištu
- HITNO DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE IZVOĐAČA MAR, VEZANO ZA IZVOĐENJE RADOVA GENERALNO

Radovi EVP VRBAS NOVA

- Završetak radova u svemu prema projektu
- Formirane su liste nedostataka i dogovor o popravkama, rad na popravkama
- Izvođenje duplog poda u prostorijama, po projektu
- HITNA POPRAVKA SHODNO ČEK LISTAMA

Radovi TS BAČKO DOBRO POLJE

- Završetak radova u svemu prema projektu i ček listama

- Završava se rad na popravkama

Radovi TS FEKETIĆ

- Završetak radova u svemu prema projektu i ček listama
- Završava se rad na popravkama

VRBAS ATAR

- Završetak radova u svemu prema projektu i ček listama
- Završava se rad na popravkama

Stanična zgrada Bačka Topola:

- Postavljanje urbanog mobilijara na parteru i ozelenjavanje
- Popravka pešačke rampe na parteru



Zgrada SS i TK Bačka Topola:

- Izrada špaletni na prozorima spolja i ugradnja limenih klupica na parapetima

Obilazak gradilišta zgrade PS Bačka Topola:

- Opšiv limene fasade
- Montaža konstrukcije čeličnih nadstrešnica
- Izrada obloge kulirplasta na soklama oko objekta
- Završena izrada trotoara oko objekta

Tipski TK objekat u Verušiću:

- Završeni su svi radovi na objektu

Tipski TK objekat u Malom Beogradu:

- Završeni su svi radovi na objektu

SS i TK zgrada Lovćenac-Mali Iđoš:

- Montaža alubobd obloge na atikama
- Montaža čeličnih rešetki na prozorima spolja
- Polaganje betonskih ivičnjaka na parteru
- Nasipanje tampon peska na parteru oko objekta
- Bojenje habajućeg sloja na peronskim zidovima epoksidnom bojom

Stanična zgrada u Bačkoj Topoli:

- Obrada pragova ispred liftova
- Popravke zidova i stepenika u pothodniku
- Farbanje temeljnih traka ispod perpnske ograde

Stanična zgrada u Žedniku:

- Izrada habajućeg sloja oko rešetki slivnika u pothodniku
- Popravka peronskih rukohvata-izrada dilatacija
- Popravke zidova i stepenika u pothodniku I obrada maski instalacija
- Postavka urbanog mobilijara

4.2.2. Radovi na donjem stroju

Otvorena pruga Vrbas Nova - Lovćenac (km 112+982.71 - km 128+849.48)

- Čišćenje terena i sečenje drveća.
- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.

- Široki iskop i iskop stepenica.
- Uređenje podtla i posteljice.
- Izrada nasipa.
- Izrada sloja ojačanja (geotekstil, geomreža i zamenski sloj-pružni kamen 31.5/63 mm i pesak).
- Izrada prelaznog sloja.
- Izrada zaštitnog sloja.

Otvorena pruga Lovćenac-Mali Iđoš - Bačka Topola (km 128+849.48- km 144+327.41)

- Čišćenje terena i sečenje drveća.
- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.
- Široki iskop.
- Uređenje podtla i posteljice.
- Izrada nasipa.
- Izrada sloja ojačanja (geotekstil, geomreža i zamenski sloj-kamen 0/100 mm i pesak).
- Izrada prelaznog sloja
- Izrada zaštitnog sloja.

Otvorena pruga Bačka Topola – Žednik (km 144+327.41- km 157+500.66)

- Čišćenje terena i sečenje drveća.
- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.
- Široki iskop.
- Uređenje podtla.
- Izrada nasipa.
- Izrada sloja ojačanja (geotekstil, geomreža i zamenski sloj-pružni kamen 31.5/63 mm i pesak).
- Izrada prelaznog sloja
- Izrada zaštitnog sloja.

Otvorena pruga Žednik – Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+943.07)

- Čišćenje terena i sečenje drveća.
- Uklanjanje postojećeg zastora i odvoz, planiranje i skladištenje na deponiji.
- Široki iskop.
- Uređenje podtla.
- Izrada nasipa.
- Izrada sloja ojačanja (geotekstil, geomreža i zamenski sloj-pružni kamen 31.5/63 mm i pesak).
- Izrada prelaznog sloja.
- Izrada zaštitnog sloja.

Otvorena pruga Vrbas Nova - Lovćenac (km 112+982.71 - km 128+849.48)

St.Vrbas stara, km St.Vrbas stara, podtlo, km 1+197 – km 1+228 i km 1+278 km 1+324, desni vezni kolosek~Pro Group , desni vezni kolosek, zaštitni sloj~Pro Group Inženjering

Km 117+870 - Km 117+950 obloženi betonski kanali na kraju vrbaškog vijadukta, levo i desno-faza 2~CCECC

Km 118+050 - Km 118+100 obloženi betonski kanal, desna strana pruge-faza 2~CCECC

Pristupni put EVP Vrbas, lepeza-uklapanje sa DP IB 15, a i uklapanje sa biciklističkom stazom-leva rampa~CCECC

Pristupni put EVP Vrbas, lepeza-uklapanje sa DP IB 15, a i uklapanje sa biciklističkom stazom-desna rampa~CCECC

Otvorena pruga Lovćenac-Bačka Topola (km 128+849.48- km 144+327.41)

Pristupni put železničkoj st.Lovćenac-M.Iđoš, desna strana pruge, km 0+900 – km 2+300, BNS 22 A~EAT

Pristupni put industrijskom objektu na Km 143+000, leva strana pruge, AB 11~EAT

Km 143+838, desna strana pruge, pristup PSN B.Topola, AB 11~EAT

Pristupni put železničkoj st.Lovćenac-M.Iđoš, desna strana pruge, km 0+000 – km 2+300, AB 11~EAT

Km 143+729, desnaleva strana pruge, servisni put 2-B.Topola, ViK~MŽ Karan

Pristupni put železničkoj st.Lovćenac-M.Iđoš, AB parkinga i trotoara~EAT

Km 143+729, leva strana pruge, servisna saobraćajnica put 2-B.Topola, Km 143+729 senćanski podvožnjak Stefan/MŽ Karan, posteljica od šljunka, neispitana

Izvršena su geomehanička ispitivanja i u skladu sa rezultatima merenja izvršen je prijem podtla, izvedenih završnih slojeva nasipa i ojačanja, kao i prelaznih i zaštitnih slojeva na sledećim deonicama

- Podtlo:
  - St.Vrbas stara, km 1+197 – km 1+228 i km 1+278 km 1+324, desni vezni kolosek
- Nasip:
  - St.Vrbas stara, km 1+197 – km 1+228 i km 1+278 km 1+324, desni vezni kolosek
- Prelazni sloj:
  - St.Vrbas stara, km 1+197 – km 1+228 i km 1+278 km 1+324, desni vezni kolosek
- Zaštitni sloj:
  - St.Vrbas stara, km 1+197 – km 1+228 i km 1+278 km 1+324, desni vezni kolosek

4.2.3. Radovi na gornjem stroju

Radovi u stanici Vrbas Nova:

- Na zahtev Finansijera i Investitora izvršeno je sečenje leve šine koloseka broj 2 i njeno zavarivanje (km113+494-km113+520) ET postupkom (2 vara) kao i zamena 26m šine tip 60E1
- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloska na levom glavnom koloseku 114+680—114+750.
- Otklanjanje primedbi uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloska na levom glavnom koloseku (km114+600-km114+800) i na desnom glavnom koloseku (km114+000-km114+400).

Radovi u stanici Vrbas Postojeća:

- Mašinsko regulisanje kolosečne veze 1-4.

- Pedbalastiranje koloseka 2a (km1+197-km1+228).
- Pedbalastiranje koloseka 5a, skretnica 9,11,12.

Radovi na deonici OP Lovćenac - Bačka Topola (km 130+141.85 - km 142+691.40):
- Uređenje zastorne prizme desnog koloseka na deonici od km 141+420 do km 142+683 i desnog koloseka na deonici od km 142+580 do km 142+740.

Radovi na deonici OP Bačka Topola-Žednik (km 144+327.41- km 156+211.82):
- Uređenje zastorne prizme levog i desnog koloseka;
- Mašinsko regulisanje levog koloseka na deonici od km 144+500 do km 149+000.
- Uređenje koloseka na delu ukinutih "privremenih" putnih prelaza u km 154+950 i u km 158+000.
- Uređenje koloseka na delu ukinutih "privremenih" putnih prelaza u km 147+150, km 152+250 i na km 154+950.

Radovi u stanici Žednik:
- Uređenje zastorne prizme koloseka br. 1 i br. 5 u stanici Žednik.

Radovi na deonici OP Žednik – Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+943.07):
- Uređenje koloseka na delu ukinutih "privremenih" putnih prelaza na km160+130.

Stanica Vrbas Nova - Zavarivanje leve šine koloseka br 2 ET postupkom

Galerija km114+750 - Otklanjanje grešaka uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka

Galerija km117+650 - Otklanjanje grešaka uočenih prilikom merenja parametara geometrije koloseka

Vijadukt Vrbas – km117+900

Vijadukt Mali Iđoš – km131+650

Stanica Lovćenac – Mali Iđoš

Stanica Vrbas Postojeca – nasipanje tucanika na koloseku 5a i na mestu skretnica 9,10,11 i 12

Stanica Vrbas Postojeca – razastiranje tucanika na koloseku 2a (km1+197-km1+228).

Stanica Vrbas Postojeca – sabijanje tucanika na koloseku 2a (km1+197-km1+228).

Km 154+950 - uklanjanje zaprljanog tucanika na mestu uklonjenog putnog prelaza

4.2.4. Radovi na kontaktnoj mreži i elektro-energetskim postrojenjima

EVP Vrbas:

- Tehnički prijem objekta, ustanovljene primedbe, pristupa se otklanjanju istih.
- Pusteni energetski trafoi T1 i T2 u prazan hod a postrojenje prikljuceno na 110kV sistem EPS-a.

TK objekat km 162:

- Ožičenje RTU opreme

PSN Bačka Topola:

- Sklapanje visokonaponskog ormana,

- montaža visokonaponskog ormana, bakarnih šina

PS Žednik:
- Podešavanje sistema i signala

PS Lovćenac:
- Postavljanje 18 baterija na pozicije
- Podešavanje signala

Stanica Backa Topola:
- Podešavanje rastavljača KM.

EVP : km 167+925
- Radovi na uzemljenju opreme , radovi na uzemljenju ograde.
- Radovi nisu završeni.
- Nadzor predao listu nedostataka izvođaču radova.

OP Novi Sad-Subotica:
- ispitivanje antipanik rasvete
- ispitivanje uzemljenja stubova rasvete
- ispitivanje uzemljenja na nadvožnjacima i podvožnjacima

Radovi na kontaktnoj mreži

1. **Stanica Vrbas (nova):**
   - **km 112+700 - km 114+550:**
     - uzemljenje 4 stuba rastavljača (25, 26, 93, 106).
2. **OP Vrbas (nova) - Lovćenac:**
   - **km 121+300 - km 125+100:**
     - regulacija KM na zateznom polju 17 (275-329), 18 (276-330), 19 (321-375), 20 (322-376), 21 (367-421), 22 (368-422);
   - **km 118+650 - km 127+100:**
     - uzemljenje zaštitne ograde na 4 mesta.
3. **Stanica Žednik:**
   - **km 148+500 - km 150+700:**
     - uzemljenje 1 kante za smeće, uzemljenje klupa na 2 mesta i zaštitne ograde na 42 mesta;
   - **km 148+500 - km 150+700:**
     - uzemljenje klupa na 4 mesta, zaštitne ograde na 8 mesta, zaštitne ograde u podvožnjaku na 20 mesta.
4. **Stanica Naumovićevo:**
   - **km 165+600 - km 167+870:**
     - regulacija vrenosti AB voznog voda na 3 stuba (106, 107, 108);
     - montaža vođica tegova;
     - montaža 3 kom. konzola i pričvrsnika konzola (106, 107, 108);
     - montaža 6 sidara (106, 107, 108);
   - **km 165+600 - km 167+870:**
     - montaža priključaka povratnog voda na šinu (41, 42, 61, 62, 104, 105).

4.2.5. Radovi na SS i TK sistemima

U izveštajnom periodu na predmetnoj deonici su izvođeni sledeći radovi:

- Završen je statički prijem signalnih sistema na stanicama Lovćenac, Bačka Topola i Žednik, a sistemi koji su prošli prijem su signalno sigurnosni sistem (CBI), CTC sistem, signali, brojači osovina, skretničke postavne sprave itd.
- Tokom procesa prijema, ispitana je sila prekretanja skretnica, a jedan deo skretnica je prikazao veću silu prekretanja od standarda. Ovaj problem se tiče građevinskog dela radova.
- U okviru stanice Lovćenac i Žednik vršene su popravke i sile prekretanja su nakon podešavanja u okviru standarda.

4.2.6. Radovi na hidrotehničkim instalacijama

Završeni su radovi na popravci betonskih kanaleta za evakuaciju vode iz drenaže u stanici Vrbas Nova

Završeni su radovi na montaži cevi od poliestera za odvodnjavanje galerije na km 114+716

U toku sa radovi na izgradnji prihvatne i izlivne građevine na km 117+850 za potrebe odvodnjavanja vijadukta i pružnih kanala

Izvode se radovi na izgradnji vodovoda, fekalne i atmosferske kanalizacije u ulici Boška Buhe u Bačkoj Topoli

Završeni su radovi na izradi izlivnih gradjevina i nasipanju kosina na upojnim poljima na km 158+210 sa leve i desne strane pruge

U toku je montaža tablastih zatvarača u prihvatnim gradjevinama u stanici Vrbas Nova

Pri kraju su radovi na izradi kanalizacije na km 117+850 za potrebe odvodnjavanja vijadukta i pružnih kanala

U toku je zasipanje zemljom 3D geomreže na upojnim poljima ne delu od km 128+950 do km 142+055. Istovremeno se vrši u ugradnja kapija

Nastavljeni su radovi na izradi atmosferske kanalizacije za evakuaciju vode iz pružnih kanala na km 131+580 u vodotok Krivaja

Pri kraju su radovi na izgradnji vodovoda, fekalne i atmosferske kanalizacije u ulici Boška Buhe u Bačkoj Topoli. Ostalo je da se izrade kinete u šahovima, izvrši ispiranje i ispitivanje vodovodne mreže, ugradnja slivnika i šahtnih poklopaca

U toku je zasipanje zemljom 3D geomreže na upojnim poljima ne delu od km 144+250 do km 156+415. Istovremeno se vrši u ugradnja kapija

4.2.7. Geodetski radovi

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		NSSU-S1-D2-SST-RIA-G015 Otvorena pruga Vrbas - Lovćenac Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km126+980 do km127+980	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja **RIA OD 02.08.2024**

2		NSSU-S1-D2-SST-RIA-G016 Otvorena pruga Vrbas - Lovćenac i stanica Lovćenac Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km127+980 do km128+980	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja **RIA OD 03.08.2024**
3		NSSU-S2-D2-SST-RIA-G0001 Otvorena pruga Bačka Topola-Žednik Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km144+327.41 do km144+900	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
4		NSSU-S2-D2-SST-RIA-G0002 Otvorena pruga Bačka Topola-Žednik 'Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km 144+900 do km 145+800	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
5		NSSU-S1-D2-SST-RIA-G017 Lovćenac - Bačka Topola Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km128+980 do km129+980	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
6		NSSU-S1-D2-SST-RIA-G018 Otvorena pruga Lovćenac - Bačka Topola Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km129+980 do km130+980	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
7		NSSU-S2-D2-SST-RIA-G0003 Otvorena pruga Bačka Topola-Žednik Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km 145+800 do km 146+800	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
8		NSSU-S2-D2-SST-RIA-G0004 Otvorena pruga Bačka Topola-Žednik Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km 146+800 do km 147+800	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
9		NSSU-S1-D2-SST-RIA-G019 Otvorena pruga Lovćenac - Bačka Topola Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km130+980 do km131+980	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
10		NSSU-S2-D2-SST-RIA-G0005 Otvorena pruga Bačka Topola-Žednik Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km 147+800 do km 148+800	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
11		NSSU-S1-D2-SST-RIA-G020 Otvorena pruga Lovćenac - Bačka Topola Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km131+980 do km132+980	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
12		NSSU-S2-D2-SST-RIA-G0006 Otvorena pruga Bačka Topola-Žednik Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km 148+800 do km 149+800	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

13		NSSU-S1-D2-SST-RIA-G021 Otvorena pruga Lovćenac - Bačka Topola Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km132+980 do km133+980	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
14		NSSU-S2-D2-SST-RIA-G0007 Otvorena pruga Bačka Topola-Žednik Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km 149+800 do km 150+800	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
15		NSSU-S1-D2-SST-RIA-G022 Otvorena pruga Lovćenac - Bačka Topola Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km133+980 do km134+980	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
16		NSSU-S2-D2-SST-RIA-G0008 Otvorena pruga Bačka Topola-Žednik Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km 150+800 do km 152+800	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
17		NSSU-S1-D2-SST-RIA-G023 Otvorena pruga Lovćenac - Bačka Topola Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km134+980 do km135+980	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
18		NSSU-S2-D2-SST-RIA-G0009 Otvorena pruga Bačka Topola-Žednik Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km 152+800 do km 154+800	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
19		NSSU-S1-D2-SST-RIA-G024 Otvorena pruga Lovćenac - Bačka Topola Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km135+980 do km136+980	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
20		NSSU-S2-D2-SST-RIA-G0010 Otvorena pruga Bačka Topola-Žednik Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km 154+800 do km 156+225	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
21		NSSU-S1-D2-SST-RIA-G025 Otvorena pruga Lovćenac - Bačka Topola Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km136+980 do km137+980	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
22		NSSU-S1-D2-SST-RIA-G026 Otvorena pruga Lovćenac - Bačka Topola Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km137+980 do km138+980	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
23		NSSU-S2-D2-SST-RIA-G0011 Stanica Žednik Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km 156+225 do km 157+500	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

24		NSSU-S2-D2-SST-RIA-G0012 Otvorena pruga Žednik – Naumovićevo Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km 157+500 do km 159+600	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
25		NSSU-S2-D2-SST-RIA-G0013 Otvorena pruga Žednik - Naumovićevo Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km 159+600 do km 161+700	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
26		NSSU-S1-D2-SST-RIA-G027 Otvorena pruga Lovćenac - Bačka Topola Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km138+980 do km140+500	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
27		NSSU-S1-D2-SST-RIA-G028 Otvorena pruga Lovćenac - Bačka Topola Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km140+500 do km142+500	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
28		NSSU-S2-D2-SST-RIA-G0014 Otvorena pruga Žednik – Naumovićevo Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km 161+700 do km 163+800	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
29		NSSU-S2-D2-SUB-RIA-g7665 Pristupni put za stanicu Lovćenac-Mali Iđoš na km 129+495,66 - km 0+000,00 - km 0+900,00 Geodetska kontrola izvedene kosine nasipa desna strana - Geodetska ispitivanja	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
30		NSSU-S2-D2-SUB-RIA-g7666 Pristupni put za stanicu Lovćenac-Mali Iđoš na km 129+495,66 - km 0+000,00 - km 0+900,00 Geodetska kontrola izvedene kosine nasipa leva strana - Geodetska ispitivanja	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
31		NSSU-S2-D2-SUB-RIA-g7667 Pristupni put za stanicu Lovćenac-Mali Iđoš na km 129+495,66 - km 2+175,00 - km 2+250,00 Geodetska kontrola iskopanog kanala leva strana - Geodetska ispitivanja	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
32		NSSU-S2-D2-SUB-RIA-g7668 Pristupni put za stanicu Lovćenac-Mali Iđoš na km 129+495,66 - km 0+650,00 - km 0+800,00 Geodetska kontrola iskopanog kanala leva strana - Geodetska ispitivanja	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
33		NSSU-S2-D2-SST-RIA-G0015 Otvorena pruga Žednik - Naumovićevo Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km 163+800 do km 165+943.07	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

34		NSSU-S1-D2-SST-RIA-G029 Otvorena pruga Lovćenac - Bačka Topola Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km142+500 do km144+327	Radovi izvedeni po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			

50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			

66			
67			
68			

4.2.8. Radovi na termotehničkim i mašinskim instalacijama

Projekat termotehničkih instalacija – Stanična zgrada u železničkoj stanici Bačka Topola

- Završeni su radovi na ugradnji grejnih tela i cevne mreže sistema grejanja, kao i ugradnja unutrašnjih rashladnih jedinica Usled promene položaja elektro kotla, izvedeno je i napajanje do novopostavljenog mesta. Takođe, nakon završnih građ. radova, vraćeni su i radijatori. Završeno je i povezivanje komunikacijskog kabla između unutrašnjih i spoljašnjih rashladnih jedinica. Potrebno je izvršiti ispitivanje funkcionalnosti sistema grejanja, ali se čeka da se voda i struja dovedu do objekta. Takođe, ostaje punjenje freonom rashladnog sistema.

Projekat termotehničkih instalacija – Stanična zgrada u železničkoj stanici Vrbas Nova

- Izvedeni su radovi na ugradnji cevne mreže sistema hlađenja i grejanja, kao i trase za odvod kodenzata. Završeni su i radovi na ugradnji mreže cevi za podno grejanje.
- Završena je i ugradnja opreme i uređaja sistema hlađenja. Uređaji su povezani na cevnu mrežu, dok je kondenzat povezan i u prizemlju i na spratu. Spoljašnje jedinice rashladnog sistema treba da se pomere, jer nisu postavljeni po projektu arhitekture i smetaju daljim radovima.
- Od radova koji trebaju da se dovrše, ostalo je:
  - Ugradnja termostata po prostorijama;
  - Kontrolor regulacionih ventila u vezi sa termostatima;
  - Funkcionalna proba grejanja;
  - Ugradnja aluminijumskih prestrujnih rešetki za izjednačavanje pritiska i montaža na vratima;
  - Ugradnja zaštitinih protivkišnih rešetki.

Projekat mašinskih instalacija – projekat liftova u pothodniku Vrbas Nova

- Liftovi L1, L2 i L3 su ugrađeni na svoju poziciju i radovi su završeni, ali sa nedostacima.
- Napajanje i uzemljenje lifta je izvedeno do lifta i isti su nisu povezani. Elektro orman je postavljen na poziciju. Ugrađena je pozivna kutija u pothodniku i usklađena je sa standardom EN 81-70, kao i pozivna kutija na štoku lifta na peronu (osim L3 – planira se 24.06.). Nije izvršena ugradnja pozivne kutije na vetrobranu, jer su još uvek radovi na

istoj. Nisu završeni građevinski radovi u pothodniku na prilazu liftu, kao i na peronu. Otvore za provetravanje je potrebno zaštititi žaluzinom i komarnikom.

- Izvršena je sertifikacija svih liftova, ali još uvek nije dostavljena dokumentacija od Imenovanog tela (osim za L1).

Projekat mašinskih instalacija – projekat liftova u pothodniku Žednik

- Završena je montaža oba lifta L1 i L2 i instalater je izvršio svoju internu kontrolu. Ugrađene su pozivne kutije u pothodniku i u štoku vrata na peronu. Pozivne kutije su usklađene sa projektom i standardima. Nisu ugrađene pozivne kutije na vetrobranima i one će biti naknadno ugrađene kada se završe svi radovi na vetrobranima. Napajanje i traka za uzemljenje su izvedeni do lifta ali nisu povezani. Otvori za provetravanje nisu zaštićeni žaluzinom i komarnikom.

Projekat mašinskih instalacija – projekat liftova u pothodniku u Bačkoj Topoli

- Završeni su radovi i na ugradnji lifta L1 i L2. Vetrobran je završen, a potrebno je jednu pozivnu kutiju staviti i na vetrobran.
- Završen je interni pregled lifta L1 od strane instalatera liftova, dok za L2 nije izvršen zbog postojanja veće količine vode u oknu i nije bilo bezbedno za rad. Nije povezano trajno napajanje.

Mašinsko tehnološki projekat vaga

- Završeni su građevinski radovi na izradi temelja vage u Bačkoj Topoli.
- Takođe završena je i ugradnja iste. Ostala je montaža ostale merne opreme, ali nakon postavljanja šina na samoj vagi. Takođe, potrebno je izraditi i vagarsku kućicu i za istu je poslat dopis Izvođaču.
- Investitor je odustao od vage u Žedniku.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za SS i TK u železničkoj stanici Vrbas Nova

- Završena je ugradnja svih unutrašnjih i spoljašnjih jedinica split sistema i ugradnja kontrolera. Takođe, ugrađena su i tri klima ormana sa pratećom opremom, od predviđena pet. Druga dva klima ormana su unešena, ali radovi na instalaciji nisu još započeti.

- U toku je je sanacija hidroizolacije i čeka se završetak ovih radova kako bi se nastavili radovi na ugradnji opreme.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za SS i TK u železničkoj stanici Bačka Topola

- Završena je ugradnja svih 5 kompleta klima ormana, kao i 7 kompleta jedinica split sistema.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za SS i TK u železničkoj stanici Žednik

- Završena je ugradnja četiri kompleta jedinica split sistema od ukupno sedam. U toku je ugradnja i klima ormana.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za smeštaj TK opreme Bačko Dobro Polje

- Završeni su pripremni/grubi radovi na termotehničkim instalacijama. Postavljeni su nosači, formirani otvori u zidovima za bakarne cevi i za odvod kondenzata. Takođe, završena je kompletna ugradnja dve jedinice split sistema. Ostalo je da se ugrade još klima ormani.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za smeštaj TK opreme Vrbas Nova

- Završeni su pripremni/grubi radovi na termotehničkim instalacijama. Postavljeni su nosači, formirani otvori u zidovima za bakarne cevi i za odvod kondenzata. Takođe, završena je kompletna ugradnja dve jedinice split sistema. Ostalo je da se ugrade još klima ormani.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za smeštaj TK opreme Mali Iđoš Polje

- Završeni su pripremni/grubi radovi na termotehničkim instalacijama. Postavljeni su nosači, formirani otvori u zidovima za bakarne cevi i za odvod kondenzata. Takođe, završena je kompletna ugradnja dve jedinice split sistema. Ostalo je da se ugrade još klima ormani.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za smeštaj TK opreme Verušić

- Završeni su pripremni/grubi radovi na termotehničkim instalacijama. Postavljeni su nosači, formirani otvori u zidovima za bakarne cevi i za odvod kondenzata. Takođe, završena je kompletna ugradnja dve jedinice split sistema. Ostalo je da se ugrade još klima ormani.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada elektrovučne podstanice – EVP Vrbas

- Završena je kompletna ugradnja 2 klima ormana.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada postrojenja za sekcionisanje sa neutralnim vodom – PSN Bačka Topola

- Završeni su pripremni/grubi radovi na termotehničkim instalacijama. Postavljeni su nosači, formirani otvori u zidovima za bakarne cevi i za odvod kondenzata. Takođe, završena je kompletna ugradnja dva klima ormana.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada postrojenja za senkcionisanje – PS Žednik

- Započeta je ugradnja 2 klima ormana.

4.2.9. Mostovi i inženjerske konstrukcije

Podvožnjak na km 113+327,64

- Izvođenje radova prema ček listama.

Galerija na km 114+716,45

- Izvođenje radova prema ček listama.
- Farbanje konstrukcije.

Vijadukt na km 117+155,43

- Završeno ispitivanje betonskih sanduka i čeličnih raspona osim raspona P11-P12.
- Završeno ispitivanje vijadukta.
- Ispitivanje kočenjem će biti naknadno urađeno.
- Izvođenje radova prema ček listama.

Podvožnjak na km 118+708,31

- Otklanjanje nedostataka prema CL.
- Ugradnja zaštitne mrežaste ograde.

Nadvožnjak na km 120+571,30

- Izvođenje radova prema ček listama.
- Izrada kegli nadvožnjaka.
- Montaža zaštitne ograde.

Nadvožnjak na km 125+191,62

- Izrada kegle nadvožnjaka.
- Otklanjanje nedostataka prema CL.

Nadvožnjak na km 126+976,09

- Izvođenje radova prema ček listama.
- Izrada kegli.

Nadvožnjak na km 131+245,45

- Otklanjanje nedostataka prema CL.

Vijadukt na km 131+830,64

- Otklanjanje nedostataka prema CL.

143+729,21 km – Podvožnjak

- Bušenje rupa za saobraćajnu ogradu

157+443,73 km – Podvožnjak

- Postavljanje mostovske ograde na delu pešačke staze

4.3. Radovi na deonici Naumovićevo (ulaz) – Subotica

4.3.1. Radovi u infrastrukturnim objektima u službenim mestima

- Radovi na izgradnji pothodnika u Numovićevu - stacionaža: km 166+446.80:
  - Konstruktivno objekat čini 5 kampada. Betoniranje osnovnih elemanata konstrukcije je završeno. Završni radovi su u toku.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su radovi na izgradnji dela peronskih zidova i TK okana u stanici Naumovićevo.
  - Radovi na konstrukciji perona I i II su, u najvećoj meri, završeni. Potrebno je izvršiti korekcije izvedenih kruna zidova. Pripremaju se radovi za betoniranje prilazne rampe. TK okna su konstruktivno izvedena, zaštitna kanalizacija je postavljena, potrebno je ugraditi sve poklopce i penjalice, te završno očistiti okna.
- U izveštajnom periodu na staničnoj zgradi u stanici Naumovićevo:
  - Izvode se arhitektonski radovi i ostali zanatski radovi.
  - Radovi na konstrukcijama su završeni.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade za SS i TK u železničkoj stanici Naumovićevo.
  - Radovi na konstrukciji objekta su završeni, izvode se završni arhitektonski i instalaterski radovi.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su radovi na izgradnji pothodnika u stanici Subotica – putnička, stacionaža: km 176+610.91.
  - Konstruktivno objekat čini 8 kampada sa 5 stepeništa i 4 lifta. Izbetonirana je kompletna konstrukcija. Izvode se završni zanatski radovi i instalacije. Problem sa hidroizolacijom objekta nije rešen na zadovoljavajući način.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su radovi na izgradnji peronskih zidova i TK okana u stanici Subotica.
  - Peron I: od km 176+606.613 do km 176+850.613, peron II: od km 176+449.950 do km 176+850.613, peron III: od km 176+547.428 do km 176+817.428, peron IV: od km 176+607.309 do km 176+827.119:
  - Betonski radovi na peronima su u najvećoj meri završeni. Na peronima br. II i III se montirana sekundarna čelična konstrukcija nadstrešnica, na peronu IV je čelična konstrukcija i obloga nadstrešnice završena. Peroni su popločani behaton pločama, osim dela perona II. Potrebno je izvršiti sanacije oštećenja, kao i završnu sanaciju geometrije kapa zidova.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su radovi na izgradnji zgrade ETP – deonica kontaktne mreže Subotica, stacionaža: od km 176+421.26 do 176+483.10
  - U toku su završni zanatski i instalaterski radovi u objektu, kao i na fasadi.
- Na staničnoj zgradi u stanici Subotica u toku je izvođenje građevinskih i arhitektonskih radova unutar objekta
  - Zidanje zidova i malterisanje, kao i saniranje međuspratne konstrukcije u delu K7. Izvode se i instalacije u objektu, kao i završni arhitektonsko-zanatski radovi u delu objekta u kojem je to moguće. Na tremu je završena većina konstruktivnih radova, ugrađuje se zaštitna ograda. U toku je korekcija popločavanja kamenom prizmom staničnog trga.
- U izveštajnom periodu su nastavljeni radovi na izgradnji pothodnika u stanici Subotica – teretna, stacionaža: km 175+819.48.

  - Konstruktivno objekat čini 12 kampada sa 3 stepeništa. Betonska konstrukcija je završena, završeno i postavljanje hidroizolacije.
- U izveštajnom periodu nisu izvođeni radovi na izgradnji službene zgrade za Srbija Kargo, IŽS, Carinu, Mup i inspekcije u železničkoj stanici Subotica teretna, stacionaža: km 175+778.78.
  - Izbetonirana je međuspratna konstrukcija, izidani su zidovi atike na krovu i postavljeni su nosači krovne konstrukcije.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su radovi na dogradnji zgrade za SS i TK u železničkoj stanici Subotica teretna, stacionaža: km 176+200.16
  - U toku su završni zanatski radovi u objektu, kao i radovi na spoljnom uređenju.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su radovi na izgradnji tri zgrade za TK opremu: Na objektima Subotica (stacionaža: km 179+373.25), Novi grad (stacionaža: km 171+694.01) i Kelebija (stacionaža: km 184+378.53):). Radovi na konstrukcijama, kao i dekoraterski radovi su završeni.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su zemljani radovi na izgradnji zgrade PS Subotica, stacionaža: km 177+300.
  - Konstrukcija objekta je izvedena, u toku su završni arhitektonski radovi i instalaterski radovi.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su radovi na izgradnji zgrade i rekonstrukciji spoljnog postrojenja elektrovučne podstanice - EVP Subotica, stacionaža: km 167+928.50
  - Većina radova na konstrukciji zgrade je završena. U toku su radovi na konstrukcijama spoljnog postrojenja i završni zanatski i instalaterski radovi u objektu.
- U izveštajnom periodu nastavljeni su radovi na izgradnji zgrade PSN Kelebija, stacionaža: km 184+380.60.
  - Veći deo konstrukcije objekta je izveden, u toku su završni arhitektonski radovi i instalaterski radovi.
- Radovi na izgradnji TKK okana duž trase se izvode, veći broj šahtova je u različitoj fazi izvođenja.
- U izveštajnom periodu radovi na izgradnji rampe za utovar automobila u stanici Subotica su obuhvatali:
  - nasipanje oko izvedenog potpornog zida, kao i izradu temelja za nadstrešnicu.

Arhitektonski radovi

SUBOTICA

<u>Radovi na staničnoj zgradi</u>

RADOVI UNUTAR OBJEKTA:

- K-3 Sprat:
  - Završno molovanje 2. ruke
  - Izlivanje nivelacione mase za polaganje keramike
  - Montaža spuštenog plafona
  - Postavljanje zidne keramike na delu sprata
  - Montaža gipsanih ploča zidova i plafona
  - Postavljanje podne keramike na delu sprata
  - Popravke na molerskoim radovima

- K-3 Prizemlje:
  - Montaža čeličnih kutija iznad staklenih vrata
  - Polaganje teraco ploča u hodniku
  - Molovanje zidova čekaonice 1. ruka
- K-4 Izrada betonskih serklaža nad itong zidovima
- K-5 Molovanje zidova 1. ruka
- K-6 Obijanje maltera sa zidova untar objekta
- Montaža spuštenog plafona od gipsanih ploča
- K-7 Demontaža delova drvene međuspratne konstrukcije
- K-4 Prizemlje:
  - Polaganje teraco ploča
  - Malterisanje novih itong zidova
  - Molovanje zidova čekaonice 1. Ruka
  - Zidanje parapetnih zidova od itonga šalter službe
- K-5 Prizemlje:
  - Montaža čeličnih nosača staklenih pregrada
- K-6 Sprat:
  - Gletovanje zidova, gipsani plafoni i obrada špaletni
  - K-6 Prizemlje:
  - Postavljanje podne i zidne keramike
- K-7 Prizemlje:
  - Malterisanje prizemlja
  - Raskrivanje drvenih elemenata na plafonu međuspratne konstr.
  - Krečenje bočne fasade prema ambulanti
  - Demontaža delova drvene međuspratne konstrukcije
- K-3 Sprat: Fugovanje keramike na svim podovima, Ugradnja kliznih-senzor vrata na vetrobranima,
- K-6 Postavljanje keramike i gletovanje
- K-3 Prizemlje: Montaža čeličnih kutija iznad staklenih vrata
- K-3.4 Polaganje teraco ploča na tremu
- K-4 Ugradnja krila prozoa
- K-5 Molovanje zidova 1. ruka
- K-6 Izrada cem. košuljice na tremu
- K-7 Demontaža delova drvene međuspratne konstrukcije
- K-4 Prizemlje: Montaža aluminijumskih pregrada i vrata vetrobrana, montaža obloge parapetnih zidova šalter službe oo medijapana
- Server sala: Montaža duplog-antistatik poda, polaganje teraco ploča u delu zone K-4, molovanje zidova čekaonice 1. Ruka
- K-6, K-7 Izrada sokle i limenih klupica na fasadi
- K-7 Montaža delova drvene međuspratne konstrukcije i podaščavanje, PP Premaz drvene tavanice iznad sprata

- Ponovno polaganje kamenih kocaka na platou ispred zgrade

PERONSKI TREM:

- Montaža čelične ograde peronskog trema
- Izrada završnog sloja fasade sa peronske strane zajedno sa ukrasima na fasadi
- Izrada završnog sloja fasade sa bočne strane prema ambulanti
- Od K-4 do K-7 Montaža nosača stakla na krovu peronskog trema
- Montaža elemenata taktilnih staza na tremu, platou ispred zgrade i pešačkoj rampi
- Montaža čelične ograde peronskog trema
- Ponovno postavljanje kamenih kocki na platou ispred zgrade
- Montaža urbanog mobilijara na peronskom tremu
- K-4 Rušenje postojećeg betonskog stepeništa ka podrumu
- Postavljanje teraco ploča u zoni K-4
- Izrada armiranih košuljica u zoni K-5, K-6 sloja fasade sa peronske strane
- Nastavak ponovnog polaganja betonskih kocki na platou ispred zgrade

Zgrada ETP u Subotici:

- Premaz zidova kanala hidroizolacionim premazom
- Bojenje delova fasade
- Završetak molerskih radova na fasadama
- Montaža čeličnih nadstrešnica nad ulazima



NAUMOVIĆEVO

Radovi na staničnoj zgradi

- Krečenje fasade
- Bojenje fasadne opeke
- Ugradnja ulaznih vrata u stambeni deo
- Repariranje postojeće drvene stolarije unutar objekta
- Nasipanje tampon podloge za trotoare oko objekta
- Izrada sloja bočne fasade plutafas malterom
- Izrada štampanog betona na zidovima i stepeništima pothodnika

- Izrada hidroizolacije i štampanog betona na kućici lifta
- Završno polaganje behaton ploča na peronu 1 i 2
- Izrada habajućeg sloja na peronu 2
- Montaža nadstrešnice pothodnika

SS i TK u Naumovićevu:

- Krečenje fasade
- Nasipanje tampon podloge za trotoare oko objekta
- Polaganje behaton ploča na peronu 1

4.3.2. Radovi na donjem stroju

Otvorena pruga Naumovićevo - Subotica (km 167+585,96 - km 174+174,98)

- Radovi na izradi zaštitnog sloja od km 177+225 do km 177+525

Radovi na izradi zaštitnog sloja od km 177+225 do km 177+525

Izvršena su geomehanička ispitivanja i u skladu sa rezultatima merenja izvršen je prijem podtla i izvedenih slojeva nasipana na sledećim deonicama:

Otvorena pruga Naumovićevo - Subotica (km 167+585,96 - km 174+174,98)

- Podtlo:
  - Nije bilo ispitivanja
- Nasip:
  - Nije bilo ispitivanja
- Sloj ojačanja:
  - Nije bilo ispitivanja
- Prelazni sloj:
  - Nije bilo ispitivanja
- Zaštitni sloj:
  - Izvršen je prijem zaštitnog sloja od km 173+300 do km 173+750

Stanica Subotica (km 174+174,98 - km 177+300,00)

- Podtlo:

- Nije bilo ispitivanja

- Nasip:
  - Nije bilo ispitivanja
- Sloj ojačanja:
  - Nije bilo ispitivanja
- Prelazni sloj:
  - Nije bilo ispitivanja
- Zaštitni sloj:
  - Izvršen je prijem zaštitnog sloja od km 177+225 do km 177+525 (retest)

4.3.3. Radovi na gornjem stroju

STANICA SUBOTICA

Na delu stanice Subotica izvršeni su sledeći radovi :

POLAGANJE I MONTAŽA:

- KOLOSEKA NA BET.PRAG.
  - Putnička,od skr.br.86 do kraja
  - Putnička,od skr.br.85 do kraja

PODEŠAVANJE SKRETNICA

- Br. 12, 19, 20, 24, 21, 22, 23, 34, 35, 39, 47, 49, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 49t, 50t, 52t, 53t, 55t, 57t, 60t, 63t, 64t
- Br. 28, 29, 30, 32, 46, 54, 56, 66, 67, 68, 70, 77, 85, 1t, 2t, 4t, 5t, 13t, 15t, 23t, 26t, 27t, 29t, 31t, 32t, 34t, 35t, 36t, 37t, 38t, 39t, 40t, 1, 3, 5, 9, 11, 15
- Br. 63, 76, 84

UREĐENJE TUCANIČKOG ZASTORA

- Putnička, na kolosecima br.1,2,3
- Od km 175+000 do km 177+300

MAŠINSKO REGULISANJE :

- KOLOSEKA
  - U teretnoj,kolosek br.1
  - U teretnoj,koloseka br.2
  - U putnikoj,od skr.br.8 do skr.br.37
  - U putničkoj,od skr.br.66 do kraja.
  - U putničkoj, od skr.br.84 do 86
  - Od 85 do kraja
  - Od skr.br.63 do skr. br. 85, od skr. br. 86 do skr. br. 85, od skr. br. 86 do kraja
  - Od skr.br.56t do skr.br.17;
  - od skr.br.61t do skr.br.56t;
  - od skr.br.58t do skr.br.61t;
  - od skr.br.58t do skr.br.18;
  - od skr.br.54t do postojećeg koloseka br.19
- SKRETNICA

- Br: 47, 59, 60, 67, 68, 74, 77, 18, 27, 26, 31, 45, 46, 50, 61, 63
- Br: 8, 37, 84, 85, 86, 63t, 64t, 65t, 66t
- Br. 85,86,51t,54t,56t,58t,59t,61t,62t

AT ZAVARIVANJE

- KOLOSEKA
  - 2 vara od skr.br63 do skr.br.85
- SKRETNICA
  - 14 vara na skr.br.37
  - 8 vara na skr.br.40
  - 10 vara na skr.br.86
  - 4 vara na skr.br.84
  - 2 vara na skr.br.85
  - 4 vara na skr.br.8
  - 6 vara na skr.br.85

ET ZAVARIVANJE

- Teretna,8 varova na koloseku br.1
- Teretna,8 varova na koloseku br.2

OTPUŠTANJE NAPONA I ZAVRŠNO ZAVARIVANJE NA ŠINAMA TIPA 49E1 I 60E1

- ŠINE TIPA 49E1
  - Kolosek br.1 od skr.br.37t do skr.br.21
  - Kolosek br.2 od skr.br.37t do skr.br.21
  - Od skretnice br. 36 do skretnice br. 40
  - Od skr.br.36 do skr.br.40

MONTAŽA PRUŽNIH OZNAKA

- 15 kom.pružnih oznaka

Na osnovu pregleda pruge Naomovićevo-Subotica-Državna granica dana 19.08.2024 godine dostavljena je lista uslovnih i neuslovnih primedbi za dinamičko ispitivanje (DBST) glavnih prolaznih koloseka.

NAPOMENA

1. Izvođaču je usmenim i pismenim putem naloženo da kod radova na zavarivanju koloseka i skretnica u DTŠ, kolosečni pribor mora da bude očišćen od tucanika i prljavštine.
2. Izvođaču je usmenim i pismenim putem naloženo da dostavi detaljan plan zavarivanja koloseka i skretnica u DTŠ i da kod radova na zavarivanju koloseka i skretnica u DTŠ isti moraju biti izregulisani, u tucaničkom zastoru, po osovini i niveleti.
3. Izvođaču je usmenim I pismenim putem naloženo da kod radova na zavarivanju koloseka i skretnica u DTŠ strogo vodi računa o potrebnoj temperaturi šina na zavarivanju u odseke, otpuštanju napona I završnom zavarivanju u DTŠ.



STANICA NAUMOVIĆEVO

POLAGANJE I MONTAŽA KOLOSEkA

- Od km 166+614 do km 166+637

MAŠINSKO REGULISANJE :

- KOLOSEKA
  - br.2 I 3 od km 165+943 do km 167+500
  - br.4 od km 166+593 do km 166+665

AT ZAVARIVANJE

- KOLOSEKA
  - Na koloseku br.3 : 2 vara u km 166+614 i 2 vara u km 166+637

MONTAŽA PRUŽNIH OZNAKA

- 41 oznaka na levom I desnom koloseku
- 38 oznaka na levom i desnom koloseku

NAUMOVIĆEVO-SUBOTICA

UREĐENJE ZASTORNE PRIZME

- Od km 167+500 do km 172+100
- DESNI KOLOSEK
  - Od km 171+570 do km 175+000
- LEVI KOLOSEK
  - Od km 171+570 do km 175+000

MAŠINSKO REGULISANJE

- DESNOG KOLOSEKA
  - km 167+500 – km 176+000
  - km 176+000 – km 183+000
- LEVOG KOLOSEKA
  - km 167+500 do km 176+000
  - km 176+000 – km 183+000

MONTAŽA PRUŽNIH OZNAKA

- 60 oznaka na levom I desnom koloseku
- 128 oznaka na levom i desnom koloseku

SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA

MAŠINSKO REGULISANJE

- LEVOG KOLOSEKA
  - Od km 177+480 do km 184+600
  - Od km 177+445 do km 178+500
  - Od km 180+000 do km 184+635
  - Od km 183+000 do km 184+635
- DESNOG KOLOSEKA
  - Od km 178+635 do km 184+635
  - Od km 177+200 do km 182+550
  - Od km 182+500 do km 184+635
  - Od km 177+186 do km 184+635
  - Od km 183+000 do km 184+635

4.3.4. Radovi na kontaktnoj mreži i elektro-energetskim postrojenjima

<u>OP Novi Sad-Subotica:</u>

- ispitivanje antipanik rasvete
- ispitivanje uzemljenja stubova rasvete
- ispitivanje uzemljenja na nadvožnjacima i podvožnjacima

<u>Stanica Subotica : km 176+550</u>

- Elektro radovi na Teretnoj stanici jos nisu počeli jer objekat nije spreman u građevinskom smislu.
- polaganje instalacionih kablova za svetiljke i priključnice,
- montaža svetiljki,
- montaža gromobranskog uzemljenja.
- Montaža razvodnih elektro ormana.
- Radovi na montaži prekidača, priključnica, svetiljki, u delu objekta putnička.
- Montaža unutrašnjih RO elektro ormana, polaganje napojnih kablova. Deo K6 i K7.
- Polaganje napojnih kablova spoljne rasvete, radovi na uzemljenju stubova kandelabra spoljne rasvete, metalnih ograda na peronu stanice.
- Podizvođač gromobranskih instalacija putnička Subotica, privodi kraju radove.
- Radovi na instalacijama spoljne rasvete parterno uređenje na glavnom ulazu u stanicu
- Radovi na uzemljenju metalne ograde na tremu putničke.
- Radovi na elektro energetskom instalacijama na objektu ETP.
- Montaža elektro ormana, kabliranje, montaža prekidača priključnica i svetiljki.

- Radovi na gromobranskim instalacijama.
- Elektro radovi na Teretnoj stanici u pripremnoj fazi.
- polaganje instalacionih kablova za svetiljke i priključnice,
- montaža svetiljki,
- podizanje stubova rasvete,
- montaža dekorativne rasvete,
- montaža gromobranskog uzemljenja
- Montaža razvodnih elektro ormana.
- Radovi na montaži prekidača, priključnica, svetiljki, u delu objekta putnička.
- Montaža unutrašnjih RO elektro ormana, polaganje napojnih kablova. Deo K6 i K7.
- Polaganje napojnih kablova spoljne rasvete,
- radovi na uzemljenju stubova kandelabra spoljne rasvete, metalnih ograda na peronu stanice.
- Podizvođač gromobranskih instalacija putnička Subotica, privodi kraju radove
- Radovi na instalacijama spoljne rasvete parterno uređenje na glavnom ulazu u stanicu.
- Radovi na uzemljenju metalne ograde na tremu putničke.
- Radovi na elektro energetskom instalacijama na objektu ETP.
- Montaža elektro ormana, kabliranje,montaža prekidača priključnica i svetiljki.
- Radovi na gromobranskim instalacijama.
- Elektro radovi na Teretnoj stanici u pripremnoj fazi.

Stanica Naumovićevo: km 166+519,63

- Nizak intenzitet radova.Kabliranje završeno.
- Montaža priključnica i prekidača 70%, montaža svetiljki nije urađena.
- Postavljanje zaštite kabla;
- trake za upozorenje, zatrpavanje peskom;
- zatrpavanje kanalice rastavljača KM,
- Nizak intenzitet radova.
- Kabliranje završeno.
- ontaža priključnica i prekidača 70%, montaža svetiljki nije urađena.
- Izvršen 15.08.2024godine PROBNI Tehnički pregled PSN Kelebija i PS Subotica dostavljena lista nedostataka Izvođaču radova.
- Iskop rova za putnu rasvetu,
- postavljanje trake za uzemljenje,
- polaganje napojnog kabla
- Nizak intenzitet radova.
- Kabliranje završeno.
- Montaža priključnica i prekidača 70%,
- montaža svetiljki nije urađena.

EVP Subotica:

- Radovi na uzemljenju opreme, radovi na uzemljenju ograde.
- Radi se antistatik pod na spratu. Radovi nisu završeni.
- Nizak intenzitet radova
- Izrada uzemljenja ograde,
- Izrada mekih sabirnica;
- izrada uzemljenja vrata i prozora;
- otklanjanje primedbi sa check lista,

- RTU Subotica:
- ožičenje opreme,
- izrada uzemljenja,
- otklanjanje primedbi sa check lista,
- Radovi na uzemljenju opreme,
- radovi na uzemljenju ograde. Nadzor predao listu nedostataka izvođaču radova.

PSN Kelebija

- Ožičenje opreme visokonaponskog ormana,
- čišćenje

Druga NoBo TSI ENE Inspekcija podsistema energija na deonici Novi Sad-Subotica-Državna granica (Kelebija) 20-22.08.2024 god.

Radovi na kontaktnoj mreži

1. **OP Naumovićevo - Subotica:**
   - **km 169+100 - km 174+400:**
     - montaža donjih ploča sidara na 7 mesta (3, 4, 29, 29-1, 30-1, 30-2, 47);
     - montaža 8 sidara (3, 4, 29, 29-1, 30-1, 30-2, 47, 48);
     - montaža 8 kom. pričvrsnika za zatezanje obilaznog voda (3, 4, 29, 29-1, 30-1, 30-2, 47, 48);
     - montaža priključaka povratnog voda na šinu na 9 mesta (181, 182, 209, 210, 231, 251, 252, L271, 272);
     - montaža 10 kom. pričvrsnika za zatezanje obilaznog voda (4 (2 kom), 30/1 (4 kom), 30-2 (4 kom)), montaža 2 kom. pričvrsnika (31, 43); montaža "Y" užadi na zateznim poljima 21 i 22;
     - regulacija zateznih polja 23 i 24; montaža strujnih veza u preklopu (86, 85, 89, 90);
     - montaža 6 kom. donjih ploča sidara i pričvrsnika za zatezanje (118-1, 120, 172-1, 174-1, 236 (2 kom));
     - montaža 6 pričvrsnika za obilazni vod (118-1, 120, 172-1, 174-1, 236, 282);
     - montaža priključaka povrtanog voda na šinu na 9 mesta (89, 90, 113, 114, 135, 136, 157, 158, 232);
     - regulacija KM na zateznom polju 3, 16 (156-164), 13 (31-103), 14 (90-128) i 15 (151-181);
     - montaža strujnih veza za preklop (267, 268, 273, 274);
     - montaža oznake sa brojem stuba (106);
     - montaža priključaka povratnog voda na šinu na 8 mesta (3, 4, 23, 24, 49, 50, 69, 70);
     - razvlačenje obilaznog voda na 7 zateznih polja (GD1 (553 m), GD2 (743 m), GD3 (742 m), GD6 (349 m), GD7 (349 m), GD-HO-4 (349.5 m), GD-HO-2 (701 m));
     - regulacija KM na zateznom polju 6, 14 (128-138), 16 (134-140);
     - montaža strujnih veza na zateznim poljima (13–15).
     - montaža rama za povratni vod i regulacija KM (29-46);
     - montaža 3 rama za povratni vod (118, 172, 174);
     - povezivanje uzemljenja kod nadvožnjaka (32, 106, 120).
2. **Stanica Subotica:**
   - **km 174+100 - km 177+800:**

- montaža krutih potpora konzola i elastičnih zatega na zateznom polju D2 (334, 316, 33-68);
- regulacija KM (33-168);
- montaža konzole sa stezaljkom NU (67);
- montaža 2 poligonatora (67, 259) na zateznom polju F3;
- montaža 125 vešaljki na zateznom polju F2;
- montaža žica protiv vetra na 2 zatezna polja (F1, F2);
- regulacija vrednosti AB voznog voda na 13 mesta (369, 361, 363, 324, 53, 69-1, 48, 366, 359, 328, 327, 325, 322);
- regulacija KM na zateznom polju L2 (134-357), D4 (333-376), D2 (275-388), L1 (68-154), D1 (49-186), SE1 (162-177), SE2 (162-186) i P10 (345-394);
- montaža strujnih veza ž(401, 404-1);
- montaža priključnih veza rastavljača (402, 403-1);
- regulacija izolovanih preklopa (399-405, 400-406);
- montaža 10 kom. pričvrsnika povratnog voda (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 20-1, 28);
- montaža 6 kom pričvrsnika obilaznog voda (9, 20, 20-1, 20-2, 28, 29);
- montaža donje ploče sidra (20-2);
- regulacija vrednosti AB na 4 stuba (409, 410, 417, 418);
- montaža elastičnih zatega i strujnih veza (381, 383, 286, 294, 302, 310, 311, 319);
- montaža ukrsnica (240, 332, 271, 280, 53, 48);
- montaža krutih potpora konzola (256, 264, 268, 278, 324, 332, 337, 280, 263, 249, 244, 239, 236);
- regulacija zateznih polja P10 (343-379), St1 (1-13), SE1 (48-93), F9-1 (46-53-1), D2 (46-50);
- montaža elastičnih zatega i krutih potpora konzola na zateznom polju SE1 (67-93).
- regulacija KM na zateznim poljima L1 (22-28), D1 (23-29), F1 (88-163), F2 (129-143);
- montaža ramova obilaznog voda (22-140);
- regulacija sekcionih izolatora (203-222/1);
- montaža izolatora (239, 236, 231);
- montaža obilaznog voda GD4-2 (1341 m);
- montaža strujnih veza (23-238);
- regulacija zateznog polja st1 (2-30), F1 (57-262), F2 (157-280);
- montaža strujnih veza (46-216);
- regulacija 13 sekcionih izolatora,18 skretnica;
- montaža tablica sa brojem stubova (1-200);
- regulacija ramova povratnog voda (353, 355, 360);
- montaža ramova obilaznog voda (20-2, 20-3, 50-2);
- montaža tablica sa brojevima za oznaku (19-162);
- montaža voznog voda na zateznom polju HO (793.9 m);
- montaža 196 pričvrnika povratnog voda (275-408); montaža rastavljača H4.

- **km 174+700 - km 177+800:**
  - montaža 9 UAZ na zateznim poljima F2, F1, P10;
  - montaža 4 kom. vođica tegova (396, 393, 324, 233-1, 324);
  - montaža sidra (324);
  - regulacija KM na zateznom polju F3;
  - montaža krutih potpora konzola i elastičnih stezaljki (241-233);
  - regulacija zateznog polja F9-2;

- montaža krutih potpora konzola (233-263);
- regulacija zateznog polja P7 (309-347);
- montaža ukrsnica (233, 241, 267, 237-1, 222-1-229, 341-347);
- montaža poligonatora na zateznom polju D1 (54, 50, 36, 29, 32, 23, 26, 53), F9-1 (50, 53-2), L1 (35, 33, 25), F3 (122), P3 (259), P4 (262, 290, 306), P6 (263), d3 (248, 263), P5 (266, 291, 307), d3 (235-1);
- montaža konzola na zateznom polju F9-1 (53-2, 50), HO (53-2, 36, 32, 29, 23, 26, 53), L1 (35, 33, 25), 6 (263), d3 (248, 263), F1 (263), P4 (262), P5 (266);
- montaža 6 rastavljača (194, G11, 216, 233, 335, 340);
- montaža vešaljki na 2 zatezna polja (D2 (222 kom), d6 (65 kom));
- montaža stezaljki NU i poligonatora na zateznom polju D2 (226, 244) i d1 (225);

3. Stanica Naumovićevo:

- **km 165+600 - km 167+870:**
  - regulacija KM na zateznom polju 2-2 (119-D98), 3-2 (81-111), 2-1 i 2-2 (53-75);
  - montaža 3 sekciona izolatora na zateznom polju D1 (15), koloseku 1 (25), koloseku 4 (26);
  - regulacija skretnica br. 13 i 14;
  - montaža ukrsnica i vešaljki za ukrštaj na skretnicama 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14;
  - fina regulacija KM na zateznom polju 3-2 i 4;
  - montaža 3 sekciona izolatora na zateznom polju D2, D4 i D3;
  - montaža sekcionog izolatora na koloseku 4 (66);
  - montaža 8 izolatora (109, 110, 111, 115, 116, 117, 20, 22).

4. OP Naumovićevo - Subotica:

- **km 169+100 - km 174+400:**
  - regulacija vrednosti AB na 5 mesta (37, 38, 40, 46, 45);
  - regulacija čvrstog zatezanja na 3 mesta (75, 31, 32);
  - regulacija 2 čvrste tačke (63, 64);
  - regulacija vrednosti AB na 6 stubova sa obostranim zatezanjem (83, 84, 92, 91, 183, 209);
  - regulacija 8 velikih čvrstih tački (109, 110, 113, 114, 191, 192, 195, 196).
- **km 174+100 - km 177+800:**
  - montaža stezaljki obilaznog voda na 44 mesta (216, 112, 105, 98, 92, 85, 80, 75, 68, 66, 62, 58, 56, 55, 54, 53-2, 52-2, 53-1, 52-1, 53, 52, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 34, 32, 31, 29, 28, 26, 25, 23, 22);
  - montaža V-stezaljki na portalu za obilazni vod na 25 mesta (268, 264, 243, 234, 230, 225-1, 225, 83, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 35, 34, 33, 32, 29, 26, 23, 278, 233);
  - montaža stezaljki povratnog voda na 14 mesta (244, 225-1, 226-1, 226, 222, 218, 212, 208, 204, 198, 194, 186, 176, 177);
  - montaža 5 rastavljača (342, 360, 402, 403-1, 33);
  - regulacija KM na zateznom polju F3 (53/1-220), P7 (202-220), F4 (202-216);
  - montaža ukrsnice (69-77);
  - regulacija preklopa na zateznom polju F5 i P9 (199-213);
  - montaža poligonatora na zateznom polju P6 (185), L2 (185, 122), F3 (122);
  - montaža konzola na zateznom polju HO (106, 93), SE1 (106, 93), F2 (122), F3 (122, 185);
  - montaža stezaljki NU na 2 zatezna polja (F1 (46 kom), F2 (29 kom));
  - montaža 29 poligonatora, 25 žica protiv vetra, 27 strujnih veza i 2 čvrste tačke na zateznom polju F2;

- razvlačenje 981 m KP na zateznom polju F2;
- razvlačenje NU na 2 zatezna polja (F1 (1524 m), F2 (981 m)).

5. **OP Subotica - državna granica:**
   - **km 174+100 - km 184+700:**
     - regulacija KM (127-171);
     - regulacija poligonacije i visine KM (94-127);
     - regulacija vrednosti AB voznog voda na 8 stubova (35, 36, 43, 44, 75, 76, 83, 84);
     - regulacija KM (22-80);
     - regulacija vrednosti AB voznog voda na 18 stubova (117, 118, 125, 126, 161, 162, 169, 170, 211, 212, 227, 228, 231, 232, 203, 204, 221, 222).
     - povezivanje uzemljenja kod nadvožnjaka (62, 174, 113, 232);
     - fina regulacija (82-405).

4.3.5. Radovi na SS i TK sistemima

U izveštajnom period izvođeni su sledeći radovi na predmetnoj deonici:

- **Stanica Subotica glavni radovi:**
  - Polaganje kablova i nastavaka.
  - Montaža i ožičenje signala i skretničkih postavnih sprava.
  - Montaža, ožičenje i priključivanje pružne opreme (induzi, senzora brojača osovina, baliza)
  - Kopanje i zatrpavanje kablovskih rovova.

Subotica:

- Ugrađeno je 167 gromobranskih modula na razvodnim kasetama u prostoriji signalne zgrade.
- Pozicije kablovskih nastavaka:
  - Levo 178+529 AJ10×4
  - Levo 178+249 AJ10×4
- Iskopano je i zatrpano 15m rova za pomoćne kablove
- Sastavljeno je 4 štitnika za signale.
- Montirane su induze i štitnici za signal PSu91
- Položeni kablovi:
  - SRO5—ROGS50 2*50mm položeno 65 metara (dopunjeno)
  - SRO5—ROGS52 2*50mm položeno 65 metara (dopunjeno)
- Iskopano je i zatrpano oko 15m napojnog kabla u rovove za pomoćne kablove.
- Ugrađeno je 482 gromobranskih modula na razvodnim kasetama u prostoriji signalne zgrade.
- Sastavljeno je 12 štitnika za signale.
- Zatrpane su temeljne jame SCC3, ACC3.
- Na signalu P51 postavljene kablovske glave sa 8 regleta:
- Položeni kablovi:
  - Levi kolosek 178+234, AJ10×4
  - Levi kolosek AJ3x4, k174+476, AJ5x4.
- Postavljene kablovske glave:
  - Glave brojača osovina: BO108, BO113, BO115, BO118
  - Glave skretnica: 16#, 19#, 20#, 21#

  - Glave za grejanje skretnica: 16#, 19#
- Iskopano i zatrpano 20m rova za pomoćne kablove.
- Montirani grejači za grejanje skretnica 13t 8t 9t. Montirane grejne ploče za grejanje skretnica 13t 12t.
- Ugrađeno je 522 gromobranskih modula na razvodnim kasetama u prostoriji signalne zgrade.
- Položeni napojni kablovi za grejanje skretnica:
  - SRO2-ROGS23/2*25/118 metara
  - SRO2-ROGS19/2*35/110 metara
  - SRO2-ROGS21/2*35/110 metara
  - SRO1-ROGS1/2*16/20 metara
  - SRO1-ROGS3/2*25/110 metara
- Postavljene kablovske glave:
  - Glave za skretnice: 30a, 30b, 29b
  - Glave za brojače osovina: BO111, BO123.
- Iskopano i zatrpano 25m rova za pomoćne kablove.
- Pozicije kablovskih nastavaka:
  - Desno 173+401， SCC3， 2x10 napojni kabl
  - Levo 176+311 2×50 napojni kabl, jedna pozicija
  - Levo 176+313 2×50 napojni kabl, jedna pozicija.
- Montirani grejači za grejanje skretnica 4t 5t. Montirane grejne ploče za grejanje skretnica 4t 5t 8t 9t.
- Sastavljen temelj signala: AU91, sastavljen signal: AU91.
- Položeni kablovi za grejanje skretnica:
  - SRO1—ROGS5 2*50mm 194m
  - SRO1—ROGS7 2*70mm 293m
  - SRO1—ROGS9 2*70mm 340m
  - SRO1—ROGS11 2*70mm 430m.
- Montirani su grejači i grejne ploče 15a, 15b
- Pozicije kablovskih nastavaka:
  - 1+362， AJ5x4 (KGUZ3).
- Rađeno je uzemljenje spoljne opreme, zavareno 27 traka.
- Postavljeni su grejači i grejne ploče 15Ta, 15Tb, 23Ta, 23Tb.
- Iskopano i zatrpano oko 25 metara rova za pomoćne kablove, zatrpano 45 metara rova za pomoćne kablove.
- Rađeno je uzemljenje spoljne opreme, zavareno 40 traka.

4.3.6. Radovi na hidrotehničkim instalacijama

U Lošinjskoj ulici na km 174+928 u toku su radovi na izgradnji kolektora DN 1500 mm i vodovoda DN 300 mm. Radovi se izvode sa dve ekipe na oba kraja ulice. Na kraju prema izlivu, završeno je polaganje cevovoda i montirana je izlivna gradjevina. U toku su radovi na formiranju zajedničkog slapišta kolektora V i kolektora VI.

Na strani kolektora u Balkanskoj ulici postavljanje kolektora je stiglo do mesta priključka na postojeći kolektor (KK-10). Betonirani su zidovi šahta, radi se kineta a gornja ploča se posebno priprema.

Naspram šahta KK-9, umesto ranijih, rade se priključci postojećih objekata na novi kolektor

Prema ranijim planovima, novi kolektor je završen u neophodnom obimu i 16.03.2023. god je stavljen u funkciju. Na ovaj način su stvoreni uslovi za rušenje starog kolektora na delu ispod podvožnjaka u Lošinjskoj ulici.

Vrše se radovi na izmeštanju postojećeg vodovoda DN 300 mm. Postavljena je zaštitna cev DN 500 mm u koju je postavljena radna cev od duktila DN 300 mm.

Na teretnoj stanici u Subotici se vrši gradnja drenaže.

Na putničkoj stanici u Subotici se gradi kanalizacija atmosferskih voda koja je postavljena kroz peronsku nastrešnicu. Prilikom iskopa se naišlo na betonski rezervoar iz ranijeg perioda.

Na stacionaži 173+629 se vrši izmeštanje postojećeg kanala. Izvodjač radova se suočava sa problemom nepredvidjenih larsen talpi i „lošeg“ tla (mulj)

Na stacionaži km 168+690 gradni se nadvožnjak. Odvodnjavanje površine nadvožnjaka je rešeno slivnicima i odvodnim cevovodima. Nije rešeno odvodnjavanje dilatacija na konstrukciji.

4.3.7. Geodetski radovi

NO.	FOTO DOKUMENTACIJA	OPIS	KOMENTAR
1		**RIA-G00025** **Stanica Naumovićevo** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km165+943.08 do km167+585.96	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
2		**RIA-G00026** **Otvorena pruga Naumovićevo-Subotica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km167+585.96 do km168+600	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
3		**RIA-G00027** **Otvorena pruga Naumovićevo-Subotica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km168+600 do km169+600	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
4		**RIA-g0822** **Projekat čelične konstrukcije nadstrešnice pothodnika u železničkoj stanici Naumovićevo** Pregled i prijem oplate - Temelji nadstrešnice iznad Pothodnika Naumovićevo 2. Faza temelja nadstrešnice	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
5		**RIA-g051** **Železnička stanica Subotica (km 177+788 - 184+845)** Geodetski prijem izvedene oplate temeljnih vratova - temelj stuba reflektora na stubnim mestima S6	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

6		**RIA-g0824** **Projekat arhitekture službene zgrade za Srbija Kargo, IŽS, Carinu, MUP i Inspekcije u železničkoj stanici Subotica teretna** Pregled i prijem oplate - atika	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
7		**RIA-G0028** **Otvorena pruga Naumovićevo-Subotica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km169+600 do 170+600	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
8		**RIA-g16147** **Nadvožnjak na km 177+329,24** Geodetska provera oplate kolovozne ploče od armiranog betona preko montažnih nosača mosta	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
9		**RIA-G00029** **Otvorena pruga Naumovićevo-Subotica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km170+600 do km171+600	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
10		**RIA-g7621** **km172+000-km174+000 (desna strana)** Geodetska provera položaja temelja stubova ograde	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
11		**RIA-G00030** **Open track Naumovicevo-Subotica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od 171+600 do 172+600	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
12		**RIA-G00031** **Otvorena pruga Naumovićevo-Subotica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od 172+600 do 174+174.98	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
13		**RIA-G00032** **Otvorena pruga Naumovićevo-Subotica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od 174+174.98 - 176+095.01	Radovi nisu izvedeni po projektu , vraceno na ispravku.
14		**RIA-g0182** **Stanica Subotica** Geodetski prijem oplate temelja za informacione znakove- parking za bicikle.	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
15		**RIA-G00033** **Subotica Putnicka Stanica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km 176+095.01 do 177+300	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
16		**RIA-G00034** **Otvorena pruga Subotica -državna granica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km 177+300 do km179+300	Radovi nisu izvedeni po projektu , vraca se na ispravku.

17		**RIA-g16181** **km 177+375** Geodetsko ispitivanje šljunka na dnu retenzije R5	Radovi u toku nije spremno za prijem.
18		**RIA-G00035** **Otvorena pruga Subotica -državna granica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km 179+300 do km181+300	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
19		**RIA-G00036** **Otvorena pruga Subotica -državna granica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km181+300 do183+300	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
20		**RIA-G00037** **Otvorena pruga Subotica -državna granica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od km183+300 do 184+575	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
21		**RIA-G00032** **Otvorena pruga Naumovićevo-Subotica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, levi i desni kolosek od 174+174.98 - 176+095.01	Ponovljena kontrola **RIA- G00032** Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
22		**RIA-g16190** **PROJEKAT ODVODNJAVANJA - DEONICA NAUMOVIĆEVO (UKLJUČIVO) – DRŽAVNA GRANICA – RETENZIJA R2 km 176+225** Pregled i prijem oplate - AB zidovi retenzije 2 , takt 1 nivo 1	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
23		**RIA-G00017** **Subotica putnička stanica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnice br. 1,3 I 5	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
24		**RIA-G00018** **Subotica putnička stanica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnice br. 17 i 24	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
25		**RIA-G00019** **Subotica putnička stanica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnice br. 54	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
26		**RIA-G00020** **Subotica putnička stanica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnice br. 66	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
27		**RIA-G00021** **Subotica putnička stanica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, Kolosek br. 1	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

28		**RIA-G00022** **Subotica putnička stanica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, Kolosek br. 4	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
29		**RIA-G00023** **Subotica putnička stanica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, Kolosek br. 5	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
30		**RIA-G00024** **Subotica putnička stanica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnice br. 2, 4, 7	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
31		**RIA-G00039** **Subotica putnička stanica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnice br. 11, 14	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
32		**RIA-G00040** **Subotica putnička stanica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnice br. 10, 13	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
33		**RIA-G00041** **Subotica teretna stanica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, Kolosek br. 1	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
34		**RIA-G00042** **Subotica teretna stanica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, Kolosek br. 2	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
35		**RIA-G00043** **Subotica putnička stanica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnice br. 6	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
36		**RIA-G00044** **Subotica teretna stanica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, Kolosek br. 3	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
37		**RIA-G00045** **Subotica teretna stanica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, Kolosek br. 4	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
38		**RIA-G00046** **Subotica teretna stanica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnice br. 36t	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
39		**RIA-G00047** **Subotica teretna stanica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ,	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja

		skretnice br. 37t	
40		**RIA-G00048** **Subotica teretna stanica** Geodetska kontrola izvedenog stanja GIŠ, skretnice br. 38t	Radovi se izvode po projektu i u granici dozvoljenih odstupanja
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			

4.3.8. Radovi na termotehničkim i mašinskim instalacijama

Projekat izmeštanja i zaštite gasovoda JKP "SUBOTICAGAS"

- Od radova na km 173+246 i 173+629, ostalo je da se šahta kod ciglane visinski nadogradi i da poklopac bude u nivou terena.
- Na uglu Kosovske i Bagremove ulice, pronađen je gasovod Ø32 mm i dogovoreno je da Izvođač u saradnji sa „Suboticagasom" izvrši spuštanje dela trase na veću dubinu. Radovi na ovom izmeštanju su pomereni za kasniju fazu i iskop je zatrpan.

Projekat termotehničkih instalacija – Stanična zgrada u železničkoj stanici Subotica

- Paralelno sa AG radovima u delu prostorija u krilima K4, K5 i K6 u toku su mašinski radovi na termotehničkim instalacijama grejanja, klimatizacije i ventilacije. Preduslovi za izvođenje mašinskih radova nisu uopšte spremni (poput instalacije opreme i cevne mreže na neomalterisanim zidovima), ali se ipak izvode radovi sa zaštitom opreme. U okviru K1, K2 i K3 se trenutno vraćaju radijatori, nakon završetka molerskih radova;
- Problemi koji se trenutno rešavaju:
  - Napajanje spoljšnjih jedinica klima ormana, koji se nalaze na temelju iza česme;
  - Spušteni plafon u okviru prostorije server sale – prostorija 046 i modifikacija mašinskih instalacija;
  - Prodori sistema ventilacije kroz krov i dimnjake;
  - Izrada revizionih otvora u zonama kasetnih freonskih jedinica i ventilacionih sistema;
  - Promena arhitekture u šalter sali i modifikacija mašinskih instalacija usled ovih promena

Projekat mašinskih instalacija – projekat liftova u pothodniku u Subotici

- Završeni su radovi i na ugradnji liftova L1 i L4. Vetrobran je završen, a potrebno je jednu pozivnu kutiju staviti i na vetrobran.
- Završen je pregled od strane Imenovanog tela za bezbednost liftova i čeka se izdavanje dokumentacije.

- U oknima L2 i L3 trenutno ima još uvek vode i još nisu stvoreni uslovi za ugradnju L2 i L3.
- Trenutno postoji problem sa nepostojanjem trajnog napajanja liftova, kao preduslova da se isti puste u rad.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za SS i TK u železničkoj stanici Subotica putnička

- Usled nemogućnosti da se izvede trasa cevne mreže grejanja i ugradnja radijatora po projektu, zbog konstrukcije krova, položaja prozora i staklenih prizmi, razmatrana je nova trasa i ista je prosleđena Projektantu na razmatranje i razradu. Takođe, i trasu split sistema nije moguće izvesti prema projektu i čeka se predlog Izvođača.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za smeštaj TK opreme Novi Grad

- Završeni su pripremni/grubi radovi na termotehničkim instalacijama. Postavljeni su nosači, formirani otvori u zidovima za bakarne cevi i za odvod kondenzata. Takođe, završena je kompletna ugradnja dve jedinice split sistema. Ostalo je da se ugrade još klima ormani.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za smeštaj TK opreme Subotica

- Završeni su pripremni/grubi radovi na termotehničkim instalacijama. Postavljeni su nosači, formirani otvori u zidovima za bakarne cevi i za odvod kondenzata. Takođe, završena je kompletna ugradnja dve jedinice split sistema. Ostalo je da se ugrade još klima ormani.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada za smeštaj TK opreme Kelebija

- Završeni su pripremni/grubi radovi na termotehničkim instalacijama. Postavljeni su nosači, formirani otvori u zidovima za bakarne cevi i za odvod kondenzata. Takođe, završena je kompletna ugradnja dve jedinice split sistema. Ostalo je da se ugrade još klima ormani.

Projekat termotehničkih instalacija – Zgrada elektrovučne podstanice – EVP Subotica

- Završena je kompletna ugradnja 2 klima ormana.

4.3.9. Mostovi i inženjerske konstrukcije

Nadvožnjak na km 168+690 (Karin Komerc)

- Montaža armature glavnog nosača na S8-S10
- Montaža armature pešačkih staza na delu S1-S6
- Urađen podložni beton za prelaznu ploču na S1
- Betoniranje pešačkih staza, kampade K1, K3 i K5, levo i desno
- Montaža armature prelazne ploče na S1
- Betoniranje pešačkih staza, kampade K2 i K4, levo i desno

Nadvožnjak na km 170+834 (Karin Komerc)

- Objekat je skoro u potpunosti završen.

- Nezavršen jedan deo radova vezan za odvodnjavanje mosta i kegle.

Propust kod prečistača na km 173+629 (Karin komerc)
- Betoniranje gornje ploče kampada K1, K2 i K3
- Betoniran krilni zid kod K1
- Betoniran parapetni zidić
- Betonirana zaštita hidroizolacije na gornjoj ploči na delu K6-K12

Podvožnjak Bajnatska na km 174+515 (Shandong Luqiao)
- Nije bilo novih radova vezanih za konstrukciju
- I dalje su otvoreni NCR-ovi 16 i 17, vezani za kvalitet betonskih zidova i PVC hidroizolacije. Ima novih procurivanja kroz zidove.

Podvožnjak Lošinjska na km 174+928 (Shandong Luqiao)
- Geomehanika zamene tla na ramu P2
- Podložni beton na ramu P2
- Betoniranje desnog zida na U3
- Betoniranje ploče na U2
- Izrada PVC hidroizolacije na P2
- Izrada zaštitnog betona na P2
- Montaža armature donje ploče na P2
- Betoniranje donje ploče na P2
- Zamena tla, geomehanika i mršavi beton na U1 i U6
- Urađena PVC hidroizolacije donje ploče na U1 i U6
- Izbetonirani zidovi na U4 i U5, desna strana

Podvožnjak Maksima Gorkog na km 176+274 (Karin komerc)
- I dalje su otvoreni NCR-ovi 22 (dilatacija na spoju ivičnog venca i zidova U-segmenata), 23 (pešačka ograda) i 24 (površina betona zidova)
- Rešavanje problema procurivanja vode unutar boksova u ramovima

Nadvožnjak Majšanski most na km 177+329 (Shandong Luqiao)
- Betoniranje stuba S2, sever, II faza
- Betoniranje stuba S2, jug I faza
- Betoniranje stuba S2, jug II faza
- Izbetonirana naglavna greda na S2
- Izbetoniran zid na S3, druga faza
- Montaža armature stubova na S2, I faza
- Demontaža oplate zida na S3
- Demontaža oplate naglavne grede na S2
- Nasipanje i nabijanje tla oko naglavne grede na S2
- Montaža armature stubova na S2, II faza
- Montaža oplate stubova na S2, II faza
- Betoniran severni stub na S2, I faza

Potporni zidovi na km 177+329 (Karin komerc)
- Zamena tla na delu D1, kampade K1, K2 i K3, sa geomehaničkim ispitivanjem
- Armiranje temeljnih ploča na delu L1, kampade K1, K3, K5, K7, K9

- Betoniranje podložnog betona na delu L2, kampade K1 do K5
- Iskop za potporne zidove sa desne strane (L3 i D2)
- Betoniranje temeljnih ploča na delu L1, kampade K1, K3, K5, K7, K9
- Montaža armature temeljne ploče na delu L1, kampade K2, K4, K6 i K8

Galerija na km 177+627 (Shandong Luqiao)
- Betoniranje prelazne ploče sever (cementna stabilizacija)
- Izrada MMA hidroizolacije gornje ploče

Potporna konstrukcija „U-ram“ na km 0+137,10 – 0+483,21 i na km 0+558,00 – 1+314,40 – ona se ukršta sa objektom Galerije na km 177+627
- Montaža armature ploče segmenata U45-U46
- Iskop za segmente U8, U9
- Betoniranje ploče U45-U46
- Betoniranje zidova U1-U2, levo i desno
- Geomehanika za segment U8
- Podložni beton na U8
- Montaža armature zidova na U45-U46
- Montaža armature ploče na U3-U4
- Geomehanika za segment U9
- Podložni beton na U9
- Betoniranje zidova na U45-U46, levo
- Betonirana ploča na U3-U4
- Montaža armature donje ploče segmenata U1-U2
- Montaža armature donje ploče segmenata U47-U48
- Betonirana donja ploča na U47-U48
- Betonirana donja ploča na U1-U2
- Armiranje zidova U47-U48, leva i desna strana
- Iskop za segmente U3-U4-U5 (uočeni nedostaci u projektu, problem postavljanja fugebanda zbog promene debljine zidova zbog postojanja stubova KM na zidu U3 i U4, levo)
- Priprema zidova U49-U50 za nanošenje hidroizolacije MMA
- Montiranje oplate zidova U47-U48, leva strana
- Nasipanje i nabijanje iberlaufa i drobljenog kamena na U3-U5
- Nanošenje prajmera na zidove segmenata U49-U50
- Betoniranje zidova U47-U48, leva strana
- Armiranje donje ploče na U45-U46
- Betoniranje podložnog betona na U3-U5
- Iskop za kampade U6-U8
- Betoniranje zidova U47-U48, desna strana

Podvožnjak Kosovska na km 177+857
- Otvoren za drumski saobraćaj 11.02.2024.
- Radi se nasip na prelaznim zonama
- Betoniranje prelaznih ploča, 1. sloj, sever i jug

178+780
- Kompletno završen

179+340 (Karin komerc)
- Kompletno završen

Nadvožnjak na km 179+395 (Karin komerc)
- Pušten u drumski saobraćaj 02.09.2023

182+400
- Završena konstrukcija.

182+600
- Završena konstrukcija.

182+800
- Završena konstrukcija.

183+000
- Završena konstrukcija.

Propust na km 183+600 (Karin komerc)
- Završena konstrukcija.

Propust na km 183+800 (Karin komerc)
- Završena konstrukcija.

Propust na km 184+400 (Karin komerc)
- Završena konstrukcija.

Propust na km 184+600 (Karin komerc)
- Završena konstrukcija.

5 BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Deonica Novi Sad - Vrbas

Glavni izvođač radova i njegovi podizvođači izvode radove prema nedeljnom planu koji je dostavljen Nadzoru u dogovorenom terminu.

Mere Bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištu su u velikoj meri u skladu sa Planom preventivnih mera.

Na Sajlovu u Novom Sadu (km 80+770) uočena je dizalica čija strela je u trenutku obilaska bila udaljena 1,5 m od dalekovoda pod naponom od 35 kV. Radovi su odmah obustavljeni a dizalica pomerena na sigurno rastojanje nakon čega su radovi nastavljeni. Na gradilištu između Stepanovićeva i Zmajeva (km 98+149) uočeni su radnici koji ne koriste lična zaštitna sredstva. Uvažavajući hitnost radova i potrebu za što bržim puštanjem saobraćaja u funkciju radovi nisu obustavljani. Radnicima je izrečena usmena opomena a o prekršaju obavešteno rukovodstvo Glavnog izvođača radova.

Na gradilištu u Zmajevu (km 105+797) uočen je bager čija korpa je u trenutku obilaska bila udaljena 2 m od dalekovoda pod naponom od 20 kV. Radovi su odmah obustavljeni a dizalica i osoblje pomerena na sigurno rastojanje. Izdat je pismeni nalog za obustavu radova glavnom izvođaču radova sa uputstvom za dalje postupanje. Na gradilištu železničke stanice u Kisaču (km 90+149) uočeni su radnici koji ne koriste lična zaštitna sredstva. Radnicima je izrečena mera udaljavanja sa gradilišta.

U toku obilazaka uočeni su i manji nedostaci koji su otklanjanji odmah po izrečenoj usmenoj opomeni od strane koordinatora za BZR.

Održan je redovan mesečni sastanak koordinacije primene mera bezbednosti i zdravlja na radu. Na sastanku je analizirano tekuće stanje i date su instrukcije i uputstva za radove u narednom periodu.

Glavni izvođač radova i svi podizvođači koji su trenutno na gradilištu deonice 1 poseduju kompletnu i ažurnu dokumentaciju Bezbednosti i zdravlja na radu.

Železnička stanica Novi Sad	**Radovi unutar železničke stanice Novi Sad**
Podvožnjak u Partizanskoj ulici u Novom Sadu	**TPS Novi Sad, km 79+322**
Gornje Sajlovo	**Stepanovićevo- Železnička stanica**
Kisač-Železnička stanica	**Rumenka, Železnička stanica**

Zmajevo-Železnička stanica	**Novi Sad – industrijska zona kanal DTD, km 81+644**
Zmajevo, km 98+149	**Rumenka, km 82+159**

Deonica Vrbas - Naumovićevo

U protekloj sedmici na deonici nije bilo prijavljenih povreda na radu ni vanrednih događaja.
Izvođači radova izvode radove prema nedeljnom planu rada koji je delimično ažuriran.
Plan rada je dostavljen Nadzoru na vreme.
Primećen je umanjen obim izvoženja radova duž cele trase.
Pojedini objekti su u potpunosti završeni ili je ostalo malo radova na istim, tako da se na njima trenutno ne obavljaju radovi.
Održan je mesečni sastanak BZR sa posebnim upozorenjem na rad u blizini kontaktne mreže pod naponom.
Na gradilištu se primenjuju lične i kolektivne mere Bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa Planom preventivnih mera uz neke manje nepravilnosti.
Prilikom redovnih obilazaka gradilišta uočene su nepravilnosti u primeni neophodnih mera BZR od strane izvođača radova opisane u Prilogu br 6. Manje nepravilnosti se otklanjaju odmah po ukazivanju na njih.
Na gradilištu se i dalje pojavljuju novi podizvođači radova, koje postojeći izvođači/podizvođači angažuju za rad na gradilištu, ne najavljuju/prijavljuju i nemaju kompletnu BZR dokumentaciju. To se posebno odnosi na izvođače radova u završnim građevinskim radovima koji se pojavljuju na gradilištu kratko svega nekoliko dana.

Vrbas Podvožnjak 113+327,64	Vrbas Pothodnik – Stanica 113+610
Galerija 114+716,45	Vrbas Vijadukt 117+155,43
Vrbas Zgrada EVP 114	Vrbas Nadvožnjak 120+571,30
Lovćenac Nadvožnjak 125+191	Lovćenac Stanica 129+245,45

Mali Iđoš Vijadukt 131+830,64	Mali Iđoš Zgrada za smeštaj TK opreme 135+730
Mali Iđoš ECODUKT 137+300	Bačka Topola Pothodnik 142+055

Deonica Naumovićevo – Subotica

Na deonici br. 3 gde radove izvodi SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD, CHINA CIVIL ENGINEERIG CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD, *CHINA RAILWAY CONSTRUCTION ELECTRIFICATION BUREAU GROUP CO. LTD SERBIA* OGRANAK BEOGRAD i CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION sa podizvođačima i dalje se ne primenjuju u potpunosti mere kojima se osigurava bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/23) i važećim pravilnicima.
Kada dva ili više poslodavaca u obavljanju poslova dele radni prostor, odnosno kada zaposleni više poslodavaca istovremeno obavljaju poslove u istom radnom prostoru, poslodavci su dužni da sarađuju u primeni propisanih mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih. Ova saradnja se ostvaruje na osnovu pisanog sporazuma koji se zaključuje pre početaka radova. Sporazumom određuje se lice za koordinaciju sprovođenja zajedničkih mera kojima se obezbeđuje bezbednost i zdravlje svih zaposlenih. Ovo je obaveza po članu 24 Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/23) koja na deonici 3 nije sprovedena.

Naumovićevo

Železnička stanica Subotica Km 177+020

Železnička stanica Subotica Km 176+456

Galerija Kosovska ulica Km 177+857

Rekonstrucija zgrade SS i TK u Subotici Km 176+214

Subotica Km 174+925

EVP Subotica Km 167+900

Subotica Km171+230

Subotica Km184+258

Subotica Km 177+300

Subotica, KM181+950

6 STATUS PREGLEDA PZI PROJEKATA

Mesečni Izveštaj o pregledu PZI projektne dokumentacije zaključno sa 31.07.2024.godine

1) Projekat za izvođenje radova (PZI) izrađen u skladu sa Građevinskom dozvolom

Stručni Nadzor je izvršio pregled Projekta za izvođenje radova (PZI) izrađenog u skladu sa Građevinskom dozvolom br. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021, zavodni broj: 351-02-03590/2021-07 od 26.10.2021 i rešenjem o izmeni Građevinske dozvole br. ROP-MSGI-27315-CPAH-13/2022, zavodni broj: 351-02-03590/2022-07 od 15.12.2022., što potvrđeno dopisom broj NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2198 od 07.02.2024. godine. (Prilog 1 izveštaja)

PZI projekti/revizije projekata su pregledani od strane stručnog Nadzora i odobrene sa statusom A (PZI projekat se prihvata), uz ranije dat komentar za projekte koji su izuzeti iz pregleda:

- projekti rušenja (11 projekata)
- geotehnički elaborati (152 projekata)

Izvođač radova je u obavezi:

- da sve potrebne izmene ili dopune projekata, u saglasnosti sa lokacijskim uslovima i građevinskom dozvolom, koje se mogu javiti u toku izvođenja radova, pripremi kroz Tehnička rešenja, koja će biti overena od strane Projektanta i dostavljena Nadzoru na saglasnost. Ovako urađena Tehnička rešenja (odstupanja od PZI), koja nisu u suprotnosti sa lokacijskim uslovima i građevinskom dozvolom, će biti implementirane u PIO projekat nakon završetka radova.
- da priprema i ažurno vodi kompletan set evidencije izvedenog stanja projekta a sve u skladu sa članom 38. (Dokumentacija i projekat izvedenog stanja) Komercijalnog Ugovora
- ukoliko se u dokumentaciji Izvođača radova utvrde greške, propusti, dvosmislenosti, neadekvatnosti i ostale manjkavosti, ona podleže korekcijama o trošku Izvođača raodva, u skladu sa članom 39. (Greške u projektovanju) Komercijalnog Ugovora
- Izvođač/Projektant ima obavezu da, ukoliko je potrebno, a u skladu sa zahtevima sertifikacionog tela (NoBo), dopuni projektnu dokumentaciju u cilju dokazivanja ispunjenosti zahteva TSI u matricama u procesu verifikacije podsistema TSI.

2) Projekti izrađeni po posebnoj proceduri

Projekti koji se izrađuju prema posebnoj proceduri	Ukupno	završeno	u fazi izrade
Elaborati ukrštaja dalekovoda, EMS	20	16	4
Sanacija/Rekonstrukcija - Naftovod Bačko Novo Selo-Novi Sad (DN1), TRANSNAFTA AD Pančevo	3	3	
Nedostajuće hidrotehničke infrastrukture za železničku stanicu Vrbas Nova	1	1	
Izmeštanje postojeće kanalizacije u Lošinjskoj ulici u Subotici	1	1	
Projekat kanalizacije u ulici Park Ferenca Rajhla Ferenca u Subotici	1	1	
Izmeštanja kanala otpadnih voda na km 173+629.56 u Subotici	1	1	
Projekti priključenja potrošača na distributivnu mrežu (prema uslovima EDB Novi Sad, Sombor i Subotica)	41	36	5
Sve ukupno:	**68**	**59**	**9**

3) Nedostajući PZI (prema PGD)

Nedostajući projekti za izvođenje (prema PGD)	Ukupno	završeno	u fazi izrade
Projekti geodetskih osmatranja objekata u toku izgradnje i eksplatacije (član 72 Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)	54	54	
Projekti privremene saobraćajne signalizacije koji nisu obuhvaćeni do sada urađenom dokumentacijom	41	40	1
Sve ukupno:	**95**	**94**	**1**

Prilog mesečnom izveštaju:

- Prilog 1_Dopis strčnog Nadzora broj broj NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2198 od 07.02.2024.

UTIBER PROJECT BIRO

Head office of CRIC-CCCC Joint Venture
Rajka Mitića 8
11040 Beograd

Br: NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2198
Datum: 07.02.2024.

Projekat: Pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Novi Sad-Subotica-državna granica

Project: Supervision Services of Reconstruction and Modernization of the railway line Novi Sad – Subotica – State border

---

Predmet: Projekat za Izođenje radova (PZI)

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je izvršen pregled Projekta za izvođenje radova (PZI) izrađenog u skladu sa Građevinskom dozvolom br. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021, zavodni broj: 351-02-03590/2021-07 od 26.10.2021 i rešenjem o izmeni Građevinske dozvole br. ROP-MSGI-27315-CPAH-13/2022, zavodni broj: 351-02-03590/2022-07 od 15.12.2022. od strane stručnog Nadzora.

PZI projekti/revizije projekata su pregledani od strane stručnog Nadzora i odobrene sa statusom A (PZI projekat se prihvata), uz ranije dat komentar za projekte koji su izuzeti iz pregleda:

- projekti rušenja (11 projekata)
- geotehnički elaborati (152 projekata)

Pored PZI projekata izrađenih u skladu sa gore navedenim Građevinskim dozvolama, obaveza Izvođača radova je da izradi i druge projekte potrebne za realizaciju Projekta rekonstrukcije i modernizacije deonice pruge Novi Sad – Subotica – Državna granica:

- projekti koji se izrađuju po posebnoj procedure
- nedostajući projekti za izvođenje (prema PGD-u)

Podsećamo na ostale obaveze Izvođača radova, a u vezi izrade projektno – tehničke dokumentacije:

Subject: Design for Construction (DfC)

Dear,

We hereby inform you that the Supervision has completed the review of the Design for Construction (DfC) prepared in accordance with the Building Permit No. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021, reference number: 351-02-03590/2021-07 dated 26.10.2021 and the Decision on amending the Building Permit No. ROP-MSGI-27315-CPAH-13/2022, reference number: 351-02-03590/2022-07 dated 15.12.2022.

DfCs/DfC revisions have been reviewed by the Supervision and proved with the status "A" (DfC is accepted), with previously provided comment regarding the designs omitted from the review:

- demolition designs (11 designs)
- geotechnical studies (152 designs)

in addition to DfCs prepared in accordance with the above mentioned Building Permits, the Contractor is obliged to prepare other designs required for the implementation of the Project for reconstruction and modernization of the railway section Novi Sad – Subotica – state border:

- designs prepared in accordance to a special procedure
- missing designs for construction (according to the BPD)

We hereby remind the Contractor of its remaining obligations regarding the preparation of design and technical documentation:

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Banka

UTIBER PROJECT BIRO

• sve potrebne izmene ili dopune projekata, u saglasnosti sa lokacijskim uslovima i građevinskom dozvolom, koje se mogu javiti u toku izvođenja radova, Izvođač treba da pripremi kroz Tehnička rešenja, koja će biti overena od strane Projektanta i dostavljena Nadzoru na saglasnost. Ovako urađena Tehnička rešenja (odstupanja od PZI), koja nisu u suprotnosti sa lokacijskim uslovima i građevinskom dozvolom, će biti implementirane u PIO projekat nakon završetka radova.	• The Contractor should prepare all required modifications and amendments to the designs, in accordance with location conditions and building permit, which may arise during the execution of works, in the forma of technical solutions, which shall be verified by the Designer and submitted to the Supervision for review and approval. Technical solutions prepared in this manner (deviation from DfC), which are not contrary to location conditions and building permit, shall be incorporated into the As-Built Design upon the completion of works,
• priprema i ažurno vođenje kompletnog seta evidencije izvedenog stanja projekta a sve u skladu sa članom 38. (Dokumentacija i projekat izvedenog stanja) Komercijalnog Ugovora	• Preparation and keeping up-to-date the entire set of as-built design records, all in accordance with the Article 38 (As-Built Design and Documentation) of the Commercial Contract.
• ukoliko se u dokumentaciji Izvođača radova utvrde greške, propusti, dvosmislenosti, neadekvatnosti i ostale manjkavosti, ona podleže korekcijama o trošku Izvođača raodva, u skladu sa članom 39. (Greške u projektovanju) Komercijalnog Ugovora	• If certain errors, omissions, ambiguities, inadequacies and other deficiencies are identified in the Contractor's documentation, it shall be subject to corrections performed at the Contractor's expense, all in accordance with the Article 39 (design Errors) of the Commercial Contract.
• Projektant ima obavezu da, ukoliko je potrebno, a u skladu sa zahtevima sertifikacionog tela (NoBo), dopuni projektnu dokumentaciju u cilju dokazivanja ispunjenosti zahteva TSI u matricama u procesu verifikacije podsistema TSI.	• The Designer is obliged to supplement design documentation if necessary, all in accordance with requirements of the certification body (NoBo), in order to prove the fulfillment of TSI requirements given in the matrices in the process of TSI subsystem verification.
U prilogu Vam dajemo pregled dostavljene projektne dokumentacije PZI (i svih revizija projekata), sa ukupnim brojem odobrenih projekata.	Please find enclosed the overview of the submitted DfC documentation (and all design revisions), together with the total number of approved designs.

S poštovanjem/Regards:

Rukovodilac stručnog nadzora/Team Leader
Dragan Gligorov

Pripremio/Prepared by:
Miloš Trajković,
Koordinator tima za kontrolu izrade projekata za izvođenje i druge tehničke dokumentacije / Coordinator of the design for construction and other documentation control team

Prilog / Attachments:
Prilog 1_Pregled dostavljene projektne dokumentacije PZI u skladu sa građevinskom dozvolom
Attachment 1_Overview of the submitted DFC documentation in accordance with the building permit

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional *koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Banka*

UTIBER PROJECT BIRO

Prilog1_Pregled dostavljene projektne dokumentacije PZI u skladu sa Građevinskom dozvolom

U narednoj tabeli data je retrospektiva dostavljenih PZI projekata (osnovni projekti i revizije projekata), izrađenih u skladu sa Građevinskom dozvolom br. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021, zavodni broj: 351-02-03590/2021-07 od 26.10.2021 i rešenjem o izmeni Građevinske dozvole br. ROP-MSGI-27315-CPAH-13/2022, zavodni broj: 351-02-03590/2022-07 od 15.12.2022., po dopisima Izvođača radova. Prilikom dostavljena projektne dokumentacije dopisima dešavalo se da Izvođač radova iste projekte dostavi kroz dva različita dopisa što je u tabeli prikazano u koloni ''Korekcija''.

Dostavljeno PZI Projekti od starne Izvođača Nadzoru					
Način dotsavljanja	Datum dostavljanja	Broj dostavljenih projekata	Osnovni projekti	Revizije projekata	Korekcije
Raniji dopisi		112	90	0	22
HDJV-NSSB-DES-IZS-2021-0020			11		
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0001			4		
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0002			1		
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0004	09.02.2022.	26	23	2	1
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0005	02.03.2022.	31	28	0	3
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0006	08.03.2022.	1	1	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0007	13.03.2022.	9	9	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0009	16.03.2022.	2	2	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0010	17.03.2022.	2	0	0	2
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0011	25.03.2022.	4	3	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0013	08.03.2022.	64	56	0	8
допис ЦИП 250-545/20	11.04.2022.	9	0	9	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0014	20.04.2022.	371	355	4	12
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0019	17.05.2022.	10	0	9	1
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0020	19.05.2022.	131	131	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0022	25.05.2022.	40	32	7	1
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0024	01.06.2022.	2	0	0	2
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0025	02.06.2022.	23	13	10	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0026	07.06.2022.	66	58	8	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0028	10.06.2022.	20	0	20	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0030	17.06.2022.	5	3	2	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0031	23.06.2022.	8	1	7	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0033	29.06.2022.	16	11	5	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0034	04.07.2022.	53	21	32	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0038	06.07.2022.	66	22	44	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0040	11.07.2022.	63	0	63	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0042	13.07.2022.	12	3	9	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0043	19.07.2022.	27	0	27	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0045	21.07.2022.	70	0	70	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0046	25.07.2022.	54	0	54	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0047	01.08.2022.	15	2	13	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0049	05.08.2022.	41	0	41	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0050	09.08.2022.	38	0	38	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0051	12.08.2022.	95	57	38	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0053	16.08.2022.	11	5	6	0

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional *koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Banka*

UTIBER PROJECT BIRO

Dostavljeno PZI Projekti od starne Izvođača Nadzoru					
Način dotsavljanja	Datum dostavljanja	Broj dostavljenih projekata	Osnovni projekti	Revizije projekata	Korekcije
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0054	21.08.2022.	30	0	30	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0057	26.08.2022.	9	0	9	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0059	02.09.2022.	18	0	18	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0060	07.09.2022.	154	0	0	154
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0062	11.09.2022.	6	0	6	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0063	16.09.2022.	12	0	12	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0065	23.09.2022.	30	0	30	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0067	29.09.2022.	37	0	37	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0071	07.10.2022.	18	0	18	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0074	16.10.2022.	16	0	16	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0076	21.10.2022.	5	0	5	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0079	28.10.2022.	18	0	18	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0081	01.11.2022.	14	1	13	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0083	04.11.2022.	10	0	10	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0085	08.11.2022.	26	0	26	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0086	12.11.2022.	14	0	14	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0087	18.11.2022.	2	0	2	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0088	21.11.2022.	8	0	8	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0090	28.11.2022.	16	0	12	4
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0093	02.12.2022.	5	0	4	1
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0097	07.12.2022.	20	0	20	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0099	09.12.2022.	28	0	28	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0101	15.12.2022.	17	0	17	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0103	19.12.2022.	3	0	3	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0106	21.12.2022.	5	0	4	1
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0108	26.12.2022.	15	0	15	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0114	30.12.2022.	14	0	14	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0001	04.01.2023.	8	0	8	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0003	12.01.2023.	10	0	10	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0004	17.12.2023.	15	0	15	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0007	20.01.2023.	18	0	16	2
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0008	27.01.2023.	8	0	6	2
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0009	30.01.2023.	4	0	4	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0006	03.02.2023.	7	7	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0010	06.02.2023.	8	1	6	1
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0012	08.02.2023.	1	0	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0015	13.02.2023.	4	0	4	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0017	20.02.2023.	2	0	2	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0021	25.02.2023.	9	0	9	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0026	01.03.2023.	1	0	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0028	05.03.2023.	9	0	9	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0033	13.03.2023.	4	0	4	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0039	19.03.2023.	14	0	13	1

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional *koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Banka*

UTIBER PROJECT BIRO

Dostavljeno PZI Projekti od starne Izvođača Nadzoru					
Način dotsavljanja	Datum dostavljanja	Broj dostavljenih projekata	Osnovni projekti	Revizije projekata	Korekcije
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0053	24.03.2023.	8	0	7	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0080	08.04.2023.	16	0	15	1
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0094	18.04.2023.	4	0	0	4
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0107	24.04.2023.	4	0	4	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0108	24.04.2023.	20	0	20	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0109	28.04.2023.	1	0	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0135	12.05.2023.	7	0	7	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0144	19.05.2023.	2	1	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0159	29.05.2023.	2	0	2	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0173	04.06.2023.	1	0	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0184	09.06.2023.	5	0	5	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0221	03.07.2023.	2	0	1	1
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0232	10.07.2023	1	1	0	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0275	31.07.2023.	8	0	8	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0327	02.09.2013.	19	0	19	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0336	13.09.2023.	1	0	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0356	02.10.2023.	2	0	2	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0363	06.10.2023.	3	0	3	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0371	15.10.2023.	1	0	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0382	24.10.2023.	1	0	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0392	29.10.2023.	3	0	3	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0431	27.11.2023.	2	0	2	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2023-0448	06.12.2023.	1	0	1	0
HDJV-NSSB-DES-IZS-2024-0042	31.01.2024.	2	0	2	0
Projekti dobijeni mailom		6	0	5	0
	UKUPNO:	2291	937	1128	224
	Dostavljeno do 15.02.2022.	112	90	0	22
	Dostavljeno od 15.02.2022.	2179	847	1128	202

Close

U narednoj tabeli dat je prikaz pregledane PZI projektne dokumentacije po statusima.

	Status Izveštaja Nadzora				
	A	B	C	PGD = PZI	Ukupno
Projekti predati do 15.02.2022. (IŽS)	12	0	0	0	12
Projekti predati od 15.02.2022.	925	0	0	152	925
Ukupno pregledano	937	0	0	152	937
Procentualno (%)	100,00	0,00	0,00		
Ukupno pregledano revizija projekata:					1128

***Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional** koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Banka*

UTIBER PROJECT BIRO

U narednoj tabeli prikazan je broj odobrenih PZI projekata po oblastima.

Naziv projekta	ukupno projekata	status			
		A	B	C	IŽS
0. Glavna sveska	1	1	0	0	0
1. Projekati arhitekture	57	57	0	0	0
2.1.1. Projekti konstrukcija	59	58	0	0	1
2.1.2. Projekti propusta	8	8	0	0	0
2.2. Projekat trase pruge i stanica - donji i gornji stroj	58	58	0	0	0
2.3. Projekti drumskih saobraćajnica	109	106	0	0	3
2.4. Projekti potpornih zidova	7	7	0	0	0
2.5. Geodetska mreža	1	0	0	0	1
2.6. Geodetsko obeležavanje	4	3	0	0	1
2.8. Projekat stubova za potrebe GSM – R sistema	3	3	0	0	0
2.9. Projekat konstrukcije arhitektonskih objekata	96	96	0	0	0
2.10. Izmeštanje i zaštita telekomunikacione infrastrukture -trasa	3	3	0	0	0
2.11. Izmeštanje i zaštita telekomunikacione infrastrukture,građevinski deo kablovske kanalizacije	8	8	0	0	0
2.12. Kablovska trasa za pružne TK kablove	3	3	0	0	0
2.13. Kablovska trasa za pružne TK kablove - ostali	2	2	0	0	0
2.14. Temelji stubova kontaktne mreže	2	1	0	0	1
2.15. Izmeštanja i zaštite gasovoda	6	6	0	0	0
2.16. Retenzije	8	8	0	0	0
3. Hidrotehničke instalacije	30	30	0	0	
4.1.1. Kontaktna mreža	24	24	0	0	0
4.1.2. EVP, PSN i PS	10	10	0	0	0
4.1.3. Upravljanje rastavljačima sa motornim pogonom	21	20	0	0	1
4.1.4. Daljinsko upravljanje SPEV	1	1	0	0	0
4.1.5. Priključak EVP Vrbas na KM	2	2	0	0	0
4.1.6. Uzemljenje konstrukcija	1	1	0	0	0
4.2.1. TS sa KM	59	59	0	0	0
4.2.2. Projekat distributivne transformatorske stanice	14	14	0	0	0
4.2.3. Projekti elektroenergetskih instalacija za objekte	31	31	0	0	0
4.2.4. Projekti spoljnih elektroenergetskih instalacija	15	15	0	0	0
4.2.5. Osvetljenje denivelisanih ukrštaja i pristupnih saobraćajnica	1	1	0	0	0
4.2.6. Izmeštanje i zaštita	3	3	0	0	0
4.2.7. Katodna zaštita	5	5	0	0	0
5.1. Projekti osiguranja	23	23	0	0	0
5.2. Projekat opremanja pruge evropskim sistemom za kontrolu vozova (ETCS L2)	1	1	0	0	0
5.3. Pružni STA kablovi	12	12	0	0	0
5.4. Dispečerski i pružni uređaji	1	1	0	0	0
5.5. Optički kablovi	1	1	0	0	0
5.6. Dojava požara	16	16	0	0	0
5.7. Informaciono komunikacioni sistemi	16	16	0	0	0
5.8. Radio sistemi	4	4	0	0	0
5.9. Izmeštanje i zaštita	12	12	0	0	0

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional *koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Banka*

UTIBER PROJECT BIRO

Naziv projekta	ukupno projekata	status			
		A	B	C	IŽS
6.1. Termotehničke instalacije	37	37	0	0	0
6.2. Liftovi	12	12	0	0	0
6.3. Stabilni sistemi za gašenje požara	14	14	0	0	0
6.4. Merne stanice	1	1	0	0	0
6.5. Izmeštanje i zaštita	6	6	0	0	0
7. Projekti tehnologija	7	7	0	0	0
8.1. Projekat tehnologije i organizacije saobraćaja	4	4	0	0	0
8.2.1. Projekat drumske saobraćajne signalizacije i opreme	4	3	0	0	1
8.2.2. Projekat organizacije drumskog saobraćaja u toku izvođenja radova	24	22	0	0	2
8.3. Projekat opreme za informisanje i usmeravanje kretanja	4	4	0	0	0
8.4. Projekat tehnologije i organizacije železničkog saobraćaja za vreme izvođenja radov	2	2	0	0	0
8.5. Projekat likovnih signala i signalnih oznaka	3	3	0	0	0
8.6. Signalizacija plovnih puteva	4	4	0	0	0
9.1. Sinhron plan	3	3	0	0	0
9.2. Uređenje pružnog pojasa	3	3	0	0	0
9.3. Zaštita životne sredine	4	3	0	0	1
9.5. Peroni	14	14	0	0	0
9.6. Spoljno uređenje	10	10	0	0	0
10. Projekti rušenja		0	0	0	0
E1. Geotehnički elaborati	2	2	0	0	0
GPZOP. Glavni projekat zaštite od požara	41	41	0	0	0
UKUPNO:	937	925	0	0	12

Close

Napomena:

- Uz ranije date komentare stručnog Nadzora sledeći PZI projekti su izuzeti iz pregleda:
  - 152 PZI projekata Geotehničkih elaborata (veza mail stučnog Nadzora od 05.10.2022. godine; Subject: Sektor 3 : Geotehnički elaborati)
  - 11 projekata rušenja (veza mail stučnog Nadzora od 27.04.2022. godine; Subject: Re: 20220420+HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0014-关于提交诺苏段部分施工图纸的函) I odgovor Izvođača radova mail-om od 11.05.2022. godine; Subject: Re: 20220420+HDJV-NSSB-DES-IZS-2022-0014-关于提交诺苏段部分施工图纸的函)

Konzorcijum Project Biro Utiber doo – Utiber Kozuti Beruhazo KFT; Vikoti Mernok Iroda KFT; EGIS doo Beograd; AG Institut doo; Slaviša Ilić PR SDC Professional *koga predstavlja PROJECT BIRO UTIBER d.o.o. • Temerinska 76 • 21138 Novi Sad • Pak : 400709 • Tel: 021/ 527 341; 021/ 527 371 • e-mail: office@utiber.rs • PIB: 108560816 • Matični broj: 21023965 • APR broj: BD 50531/2014 • Šifra delatnosti: 7112 • Tekući račun: 325 -9500700035895-83 OTP Banka*

7 STATUS PREDATIH METODOLOGIJA RADA

U periodu od 01.07.2024. do 31.07.2024. Izvođač radova je dostavio određen broj Metodologija radova. U narednoj tabeli dajemo spisak predatih Metodologija od strane Izvođača radova, i odgovore Nadzora.

R.br.	Broj dopisa	Datum	Naziv dopisa	Datum odgovora Nadzora	Broj dopisa
1	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0534	2-Aug-24	Dostava metodologija radova za žičanu mrežu protiv bacanja kod postojećeg mosta na km 167+600		
2	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0532	5-Aug-24	Dostava metodologije ispitivanja probnim opterećenjem galerije na km 114+716	5-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2868
3	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0545	5-Aug-24	Dostava metodologije za dopunu zeštitne ograde od km 128+849 do km 184+634	19-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2915
4	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0560	13-Aug-24	Metodologija radova na izradi stubova rasvete za osvetljenje koloseka u stanici Novi Sad, Zmajevo, Vrbas nova i Bačka Topola	15-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2902
5	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0567	15-Aug-24	Dostava metodologije za dopunu drvene ograde nadvožnajka za krupnu divljač na km 137+300 i km 155+025		
6	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0574	16-Aug-24	Dostava metodologije radova za dopunu zaštitne ograde nadvožnjaka i podvožnjaka od km 128+849 do km 184+634	27-Aug-24	NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-2947
7	HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0592	28-Aug-24	Dostava metodologije za temelje železničke signalizacije saobraćajnih znakova		
8					
9					
10					
11					
12					
13					NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-

Od 01.06.2022. smo odgovore na predate Metodologije Izvođača radova podelili u tri grupe, po stepenu ispravnosti dostavljene Metodologije izvođenja radova:

- status A - Metodologija se prihvata
- status B - Metodologija se prihvata sa komentarima
- status C - Metodologija se odbija.

8 FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Finansijski izveštaj zaključno sa 31.07.2024.godine

Pregled ugovorne dokumentacije:

Ugovor:	Komercijalni ugovor o modernizaciji I rekonstrukciji mađersko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)
Ugovor br:	340-5583/2018-3 od 07.07.2018. 1/2018-1950 od 07.07.2018. (zaveden kod Investitora) CRIC/2018/001 od 07.07.2018. (zaveden kod Izvođača)
Aneks ugovora br.1	340-05-5892/2021-1 od 25.06.2021. 1/2021-1550/385 od 25.06.2021.(zaveden kod Investitora) CRIC(S)/2021/003-112 od 25.06.2021. (zaveden kod Izvođača)
Aneks ugovora br.2	340-9986/2022 od 09.12.2022. 1/2022-1/1204 od 09.12.2022.(zaveden kod Investitora) JV-NSSB-2022-02 od 09.12.2022. (zaveden kod Izvođača)
Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima	401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine 1/2022 – 1/1090 od 25.10.2022. godine (zaveden kod Investitora) JV-NSSB-2022-01 od 05.10.2022. (zaveden kod Izvođača)
Aneks ugovora br.3	340-9166/2023 od 06.10.2023. 1/2023-1/800 od 06.10.2023.(zaveden kod Investitora) JV-NSSB-2023-01 od 06.10.2023. (zaveden kod Izvođača)
Aneks ugovora br.4	340-2110/2024-1 od 15.03.2024. 1/2024-1/201 od 15.03.2024.(zaveden kod Investitora) JV-NSSB-2024-01 od 15.03.2024. (zaveden kod Izvođača)
Ugovorna suma:	USD 1.162.810.000 (bez PDV-a) – Osnovni ugovor/Aneks br.1 USD 6.512.453,59 (bez PDV-a) – Aneks br.2 USD 111.999.042,00 (bez PDV-a) – Sporazum broj 1 *Napomena:* deo radova definisanih Sporazumom 1 u iznosu od USD 18.842.062,00, su ugovoreni kroz Aneks 3 Ugovora USD 28.137.000,91 (bez PDV-a) – Aneks br.3 USD 52.301.209,67 (bez PDV-a) – Aneks br.4 *Napomena:* deo radova definisanih Sporazumom 1 u iznosu od USD 28.787.787,00, su ugovoreni kroz Aneks 4 Ugovora

Pregled privremenih situacija Izvođača:

1.Privremena situacija za isporuku tehničke dokumentacije (br.003)

Nadzor je pregledao i overio 1 privremenu situaciju br. 003 (dostavljena dopisom Izvođača broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2022-0020 od 04.05.2022. godine) za isporuku tehničke dokumentacije (izrada PGDa), overena 05.06.2022.godine. Izvedena usluga je u skladu sa Komercijalni Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).

Realizacija: 17.442.150 USD (1,50%)

1.Privremena situacija za izvođenje radova (br.004)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2022-0018 od 05.05.2022. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.04.2022. – 30.04.2022.godine, a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).
Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.
Nadzor je pregledao i overio 1 privremenu situaciju za radove br.004 (overena 13.06.2022.godine).

Realizacija: 9.614.914,68 USD
Kumulativno: 27.057.064,68 USD (2,33%)

2.Privremena situacija za izvođenje radova (br.005)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2022-0049 od 06.07.2022. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.05.2022. – 31.05.2022.godine, a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).
Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.
Nadzor je pregledao i overio 2 privremenu situaciju za radove br.005 (overena 15.08.2022.godine).

Realizacija: 13.903.894,87 USD
Kumulativno: 40.960.959,55 USD (3,52%)

3.Privremena situacija za izvođenje radova (br.006)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2022-0078 od 06.09.2022. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.06.2022. – 31.08.2022.godine, a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).
Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.
Nadzor je pregledao i overio 3 privremenu situaciju za radove br.006 (overena 13.10.2022.godine).

Realizacija: 18.731.500,62 USD
Kumulativno: 59.692.460,17 USD (5,13%)

4.Privremena situacija za izvođenje radova (br.007)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2022-0101 od 03.10.2022. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.09.2022. – 30.09.2022.godine, a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).
Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.
Nadzor je pregledao i overio 4 privremenu situaciju za radove br.007 (overena 09.11.2022.godine).

Realizacija: 19.477.681,74 USD
Kumulativno: 79.170.141,91 USD (6,81%)

5.Privremena situacija za izvođenje radova (br.008)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2022-0121 od 31.10.2022. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.10.2022. – 31.10.2022.godine, a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).
Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.
Nadzor je pregledao i overio 5 privremenu situaciju za radove br.008 (overena 24.11.2022.godine).

Realizacija: 27.708.577,62 USD
Kumulativno: 106.878.719,53 USD (9,19%)

2. Privremena situacija za isporuku tehničke dokumentacije PZI (br.009)

Nadzor je pregledao i overio 2 privremenu situaciju br. 009 (dostavljena dopisom Izvođača broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2022-0141) za isporuku tehničke dokumentacije, overena 30.11.2022.godine. Izvedena usluga je u skladu sa Komercijalni Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).

Realizacija: 11.686.240,00 USD
Kumulativno: 118.564.959,53 USD (10,20%)

1.Privremena situacija za izvođenje radova – Aneks br.2 (br.011)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2022-0145 od 08.12.2022. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.01.2022. – 18.03.2022.godine, a u skladu sa Aneksom 2. Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.
Nadzor je pregledao i overio 1 privremenu situaciju za radove br.011 (overena 12.12.2022.godine).

Realizacija: 2.945.453,58 USD
Kumulativno: 121.510.413,11 USD (10,39%)

6. Privremena situacija za izvođenje radova (br.012)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2022-0148 od 12.12.2022. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.11.2022. – 09.12.2022.godine, a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).
Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.
Nadzor je pregledao i overio 6 privremenu situaciju za radove br.012 (overena 19.01.2023.godine).

Realizacija: 67.934.326,27 USD
Kumulativno: 189.444.739,38 USD (16,20%)

7. Privremena situacija za izvođenje radova (br.013)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0020 od 30.01.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 10.12.2022. - 27.01.2023.godine, a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).
Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.
Nadzor je pregledao i overio 7 privremenu situaciju za radove br.013 (overena 27.02.2023.godine).

Realizacija: 34.930.990,57 USD
Kumulativno: 224.375.729,95 USD (19,19%)

8. Privremena situacija za izvođenje radova (br.014)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0036 od 28.02.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 28.01.2023. – 24.02.2023.godine, a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).
Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.
Nadzor je pregledao i overio 8 privremenu situaciju za radove br.014 (overena 05.04.2023.godine)

Realizacija: 30.819.701,52 USD
Kumulativno: 255.195.431,47 USD (21,82 %)

- **Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 28.02.2023. godine**

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0037 od 28.02.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove, a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 5.373.129,47 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

9. Privremena situacija za izvođenje radova (br.015)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0057 od 05.04.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 25.02.2023. – 03.04.2023.godine, a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).
Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.
Nadzor je pregledao i overio 9 privremenu situaciju za radove br.015 (overena 03.05.2023.godine).

Realizacija: 53.519.981,39 USD
Kumulativno: 308.715.412,86 USD (26,40 %)

- **Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 05.04.2023. godine**

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0058 od 05.04.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove, a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 12.132.007,46 USD, što u kumulativu iznosi 17.505.136,93 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

10. Privremena situacija za izvođenje radova (br.016)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0075 od 08.05.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 04.04.2023. – 03.05.2023.godine, a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).
Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.
Nadzor je pregledao i overio 10 privremenu situaciju za radove br.016 (overena 31.05.2023.godine).

Realizacija: 49.478.209,26 USD
Kumulativno: 358.193.622,12 USD (30,63 %)

- **Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 08.05.2023. godine**

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0076 od 08.05.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove, a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 1.572.536,07 USD, što u kumulativu iznosi 19.077.673,00 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

11. Privremena situacija za izvođenje radova (br.017)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0095 od 05.06.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 04.05.2023. – 01.06.2023.godine, a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).
Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.
Nadzor je pregledao i overio 11 privremenu situaciju za radove br.017 (overena 12.07.2023. godine).

Realizacija: 55.525.548,29 USD
Kumulativno: 410.773.716,85 USD (35,33 %)

- **Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 05.06.2023. godine**

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0096 od 05.06.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove , a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 1.290.375,85 USD, što u kumulativu iznosi 20.368.0048,85 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

12. Privremena situacija za izvođenje radova (br.018)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0112 od 07.07.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 02.06.2023. – 03.07.2023.godine., a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).
Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.
Nadzor je pregledao i overio 12 privremenu situaciju za radove br.018 (overena 07.08.2023. godine).

Realizacija: 69.384.240,90 USD
Kumulativno: 483.103.411,31 USD (41,31 %)

- **Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 07.07.2023. godine**

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0113 od 07.07.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove , a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 3.137.649,58 USD, što u kumulativu iznosi 23.505.698,43 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti

predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

13. Privremena situacija za izvođenje radova (br.019)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0134 od 08.08.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 04.07.2023. – 03.08.2023.godine., a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).
Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.
Nadzor je pregledao i overio 13 privremenu situaciju za radove br.019 (overena 19.09.2023. godine).

Realizacija: 77.079.449,40 USD
Kumulativno: 560.182.860,71 USD (47,91 %)

- **Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 08.08.2023. godine**

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0135 od 08.08.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove, a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 7.639.115,88 USD, što u kumulativu iznosi 31.144.814,31 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

14. Privremena situacija za izvođenje radova (br.020)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0147 od 05.09.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 04.08.2023. – 01.09.2023.godine., a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).
Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.
Nadzor je pregledao i overio 14 privremenu situaciju za radove br.020 (overena 12.10.2023. godine).

Realizacija: 43.830.370,77 USD
Kumulativno: 604.013.231,50 USD (51,65 %)

- **Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 05.09.2023. godine**

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0148 od 05.09.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove , a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 6.286.270,04 USD, što u kumulativu iznosi 37.431.084,35 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

15. Privremena situacija za izvođenje radova (br.021)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0165 od 12.10.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 02.09.2023. – 02.10.2023.godine., a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).
Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 15 privremenu situaciju za radove br.021 (overena 09.11.2023. godine).

Realizacija: 78.508.780,88 USD

Kumulativno: 682.522.012,36 USD (57,00 %)

Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2 i Aneks 3)

- **Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 12.10.2023. godine**

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0166 od 12.10.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove , a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 2.461.275,03 USD, što u kumulativu iznosi 39.892.359,38 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

1.Privremena situacija za izvođenje radova i usluge – Aneks br.3 (br.022)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0170 od 19.10.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za radove, a u skladu sa Aneksom 3. Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 1 privremenu situaciju za Aneks 3 br.022 (overena 14.11.2023. godine).

Realizacija: 24.993.158,74 USD

Kumulativno: 707.515.171,10 USD (59,08 %)

Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2 i Aneks 3)

16. Privremena situacija za izvođenje radova (br.023)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0183 od 03.11.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 03.10.2023. – 01.11.2023.godine., a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).

Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

Nadzor je pregledao i overio 16 privremenu situaciju za radove br.023 (overena 01.12.2023. godine).

Realizacija: 73.958.922,62 USD

Kumulativno: 781.474.093,72 USD (65,26 %)

Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2 i Aneks 3)

- **Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 03.11.2023. godine**

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0184 od 03.11.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove, a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 1.945.567,45 USD, što u kumulativu iznosi 23.350.324,00 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

Napomena: Radovi na rekonsrtukciji podvožnjaka u Partizanskoj i Kisačkoj ulici u Novom Sadu i izradi donjeg stroja vijadukta na km 131+830,64 definisani Sporazumom 1, u ukupnoj vrednosti od 18.842.062,00 USD, su Ugovoreni u okviru Aneksa 3 Komercijalnog Ugovora. Ranije overeni obračuski listovi za predmetne radove neće se prikazivati u kumulativu odobrenih radova za Sporazum 1 (ukupna vrednost do sada odobrenih pozicija radova je 18.487.602,83 USD), već će se prikazivati u okviru situacija vezanih za Aneks 3 Komercijalnog Ugovora.

17. Privremena situacija za izvođenje radova (br.024)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0220 od 05.12.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 02.11.2023. – 30.11.2023.godine, a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).
Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.
Nadzor je pregledao i overio 17 privremenu situaciju za radove br.024 (overena 10.01.2024. godine).

Realizacija: 46.784.514,89 USD
Kumulativno: 828.258.608,61 USD (69,17 %)
Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2 i Aneks 3)

- **Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 05.12.2023. godine**

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0221 od 05.12.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove, a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 2.306.229,34 USD, što u kumulativu iznosi 25.656.553,34 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

18. Privremena situacija za izvođenje radova (br.025)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0239 od 31.12.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.12.2023. – 31.12.2023.godine, a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).
Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga (obrazloženje Izvođača, veza mail od 22.01.2024. godine, Subject: XVIII privremena situacija broj 025)
Nadzor je pregledao i overio 18 privremenu situaciju za radove br.025 (overena 01.02.2024. godine).

Realizacija: 2.018.525,20 USD
Kumulativno: 830.277.133,81 USD (69,34 %)
Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2 i Aneks 3)

- **Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 31.12.2023. godine**

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0240 od 31.12.2023. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove, a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i

overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 1.248.775,69 USD, što u kumulativu iznosi 26.905.329,03 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

19. Privremena situacija za izvođenje radova (br.026)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0021 od 05.02.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.01.2024. – 31.01.2024.godine., a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).
Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.
Nadzor je pregledao i overio privremenu situaciju za radove (broj 026-A i 026-C overena 22.03.2024. godine i broj 026-B i 026-D overena 05.04.2024. godine).

Realizacija: 92.597.258,67 USD
Kumulativno: 922.874.392,48 USD (77,07%)
Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2 i Aneks 3)

- **Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 05.02.2024. godine**

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0022 od 05.02.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove , a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 1.444.376,56 USD, što u kumulativu iznosi 28.349.705,59 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

20. Privremena situacija za izvođenje radova (br.027)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0026 od 05.03.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.02.2024. – 29.02.2024.godine. , a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).
Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.
Nadzor je pregledao i overio privremenu situaciju za radove (broj 027-A i 027-C overena 02.04.2024. godine i broj 027-B i 027-D overena 05.04.2024. godine).

Realizacija: 27.398.560,33 USD
Kumulativno: 950.272.952,82 USD (76,04%)
Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2, Aneks 3 i Aneks 4)

- **Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 05.03.2024. godine**

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0027 od 05.03.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove , a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 614.896,00 USD, što u kumulativu iznosi 6.854.038,44 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

Napomena: Radovi na demontaži postojećeg donjeg stroja od km. 131+584 do km. 132+077, izgradnji pešačko-biciklističkog podvožnjaka u km. 89+984,34, izgradnji nadvožnjaka u km. 95+739,56, rekonstrukcija podvožnjaka u km. 176+274,62, povećanju površine nadvožnjaka usled povećanja širine, izgradnja vijadukta u km. 131+830,64 (preostali radovi koji nisu bili uključeni u Aneks 3) definisani Sporazumom 1, u ukupnoj vrednosti od 28.787.787,00 USD, su Ugovoreni u okviru Aneksa 4 Komercijalnog Ugovora. Ranije overeni obračuski listovi za predmetne radove neće se prikazivati u kumulativu odobrenih radova za Sporazum 1 (ukupna vrednost do sada odobrenih pozicija radova je 22.110.563,06 USD), već će se prikazivati u okviru situacija vezanih za Aneks 4 Komercijalnog Ugovora.

1. Privremena situacija za izvođenje radova i usluge – Aneks br.4 (br.029)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0045 od 29.03.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove za radove, a u skladu sa Aneksom 4. Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.
Nadzor je pregledao i overio 1 privremenu situaciju za Aneks 4 br.029 (overena 18.04.2024. godine).

Realizacija: 38.370.429,52 USD
Kumulativno: 988.643.382,33 USD (79,11 %)
Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2, Aneks 3 i Aneks 4)

21. Privremena situacija za izvođenje radova i usluge (br.030)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0058 od 05.04.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.03.2024. – 31.03.2024.godine, a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).
Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.
Nadzor je pregledao i overio 21 privremenu situaciju za radove br.030 (overena 20.05.2024. godine).

Realizacija: 32.833.737,16 USD
Kumulativno: 1.021.477.119,49 USD (81,73 %)
Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2, Aneks 3 i Aneks 4)

- **Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 05.04.2024. godine**

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0059 od 05.04.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove , a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 1.356.701,92 USD, što u kumulativu iznosi 8.210.740,36 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

2. Privremena situacija za izvođenje radova i usluge – Aneks br.3

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0044 od 29.03.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove za radove, a u skladu sa Aneksom 3. Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.

3. Privremena situacija za isporuku tehničke dokumentacije PZI (br. 031)

Izvođač radova je dostavio Nadzoru analizu sa trenutnim statusom završenih projekata. Nadzor je pregledao i odobrio dostavljenu analizu (završeni projekti 99%). Izvedena usluga je u skladu sa Komercijalni Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).
Nadzor je pregledao i overio 3. Privremenu situacija (dostavljena dopisom Izvođača broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0098 od 20.05.2024. godine) za isporuku tehničke dokumentacije PZI br. 031 (overena 20.05.2024. godine).

Realizacija: 5.581.488,00 USD
Kumulativno: 1.027.058.607,49 USD (82,18 %)
Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2, Aneks 3 i Aneks 4)

22. Privremena situacija za izvođenje radova i usluge (br.032)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0089 od 13.05.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.04.2024. – 07.05.2024.godine. a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).
Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.
Nadzor je pregledao i overio 22 privremenu situaciju za radove br.032 (overena 11.06.2024. godine).

Realizacija: 49.904.375,75 USD
Kumulativno: 1.076.962.983,24 USD (86,17 %)
Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2, Aneks 3 i Aneks 4)

- **Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 13.05.2024. godine**

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0090 od 13.05.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove , a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 6.285.711,60 USD, što u kumulativu iznosi 14.160.509,43 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

23. Privremena situacija za izvođenje radova i usluge (br.033)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0111 od 05.06.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 08.05.2024. – 31.05.2024.godine. a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).
Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.
Nadzor je pregledao i overio 23 privremenu situaciju za radove br.033 (overena 10.07.2024. godine).

Realizacija: 36.611.955,76 USD
Kumulativno: 1.113.574.939,00 USD (89,10 %)
Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2 i Aneks 3)

- **Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 05.06.2024. godine**

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0112 od 05.06.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove , a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 2.226.696,16 USD, što u kumulativu iznosi 16.387.205,59 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

24. Privremena situacija za izvođenje radova i usluge (br.034)

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0142 od 05.07.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove na kontrolu i overu za radove u periodu 01.06.2024. – 30.06.2024.godine. a u skladu sa Komercijalnim Ugovorom i Aneksom 1 (Tabela cena).
Nadzor je pregledao i overio obračunske listove građevinskih knjiga.
Nadzor je potvrdio vrednost radova za 24 privremenu situaciju za radove (br.034).

Realizacija:	22.325.402,31 USD
Kumulativno:	1.135.900.341,31 USD (90,89 %)
	Napomena: Procenat izvršenja radova i usluga za ugovorene radove (Osnovni ugovor, Aneks 2 i Aneks 3)

Izvođač je dostavio Investitoru predsituaciju na saglasnost i odobrenje.

Naknadni radovi izvedeni u skladu sa Sporazumom broj 1 – dopis od 05.07.2024. godine

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0143 od 05.07.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove za naknadne radove , a u skladu sa potpisanim Sporazumom broj 1 o naknadnim radovima broj 401-00-01138/2022-04 od 25.10.2022. godine, na kontrolu i overu. Vrednost radova overenih obračunskih listova je 1.650.094,19 USD, što u kumulativu iznosi 18.037.299,78 USD. U skladu sa Članom 3 Sporazuma broj 1, izvedeni radovi će biti predmet neke od narednih Privremenih situacija Izvođača radova, nakon ugovaranja predmetnih radova kroz Aneks/Anekse Komercijalnog Ugovora.

3. Privremena situacija za izvođenje radova i usluge – Aneks br.3

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0153 od 16.07.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove za radove, a u skladu sa Aneksom 3. U toku je pregled i overavanje obračunskih listova građevinskih knjiga.

2. Privremena situacija za izvođenje radova i usluge – Aneks br.4

Izvođač je dopisom broj HDJV-NSSB-CON-IZS-2024-0163 od 24.07.2024. godine predao Nadzoru obračunske listove za radove, a u skladu sa Aneksom 4. U toku je pregled i overavanje obračunskih listova građevinskih knjiga.

Pregled realizovanih radova/usluga Izvođača prema overenim privremenim situacijama (u izveštajnom periodu – zaključno sa juLom 2024.godine):

Opis	*Ugovorena vrednost*	*Prethodni period*	*Overene situacije u izveštavanom periodu*	*Kumulativni iznos*	*% kumulativnih izvedenih Radova*
Izvođač - JV CRIC-CCCC - radovi i usluge overeni u privremenim situacijama					
Privremene situacije Izvođača (za radove i usluge zaključno sa 31.05.2024.godine)					
Osnovni ugovor					
1. Izvedeni radovi	**1.127.925.700**	**975.944.063**	**36.611.956**	**1.012.556.019**	**89,77%**
1. Arhitektonski radovi	16.600.314	10.288.395	516.616	10.805.011	65,09%
2. Radovi na donjem stroju	209.735.688	204.264.805	943.186	205.207.991	97,84%
3. Radovi na gornjem stroju	249.437.955	220.892.746	9.045.353	229.938.099	92,18%
4. Mostovi, propusti i podvožnjaci	253.938.256	242.372.695	2.597.153	244.969.849	96,47%
5. Pristupni putevi i devijacije	27.374.721	21.774.928	1.514.239	23.289.167	85,08%
6. Drenažni radovi	8.971.793	4.599.334	122.253	4.721.587	52,63%
7. Kontaktna mreža	80.679.702	62.573.307	4.775.532	67.348.839	83,48%
8. Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS	22.273.130	17.285.359	1.680.073	18.965.432	85,15%
9. Napajanje	26.601.912	20.360.512	1.826.684	22.187.196	83,40%
10. Signalno-sigurnosni sistemi	116.510.191	88.294.908	7.014.184	95.309.092	81,80%
11. Telekomunikacioni sistemi	71.650.868	52.429.653	6.163.838	58.593.491	81,78%
12. Termotehničke i protivpožarne instalacije	5.809.444	1.755.745	0	1.755.745	30,22%
13. Mašinske instalacije i radovi	2.610.409	553.413	9.643	563.055	21,57%
14. Putna saobraćajna signalizacija i oprema	1.371.233	437.691	77.920	515.611	37,60%
15. Pejzažno uređenje, peroni i mere zaštite životne sredine	34.360.084	28.060.573	325.281	28.385.855	82,61%
2. Projektovanje	**34.884.300**	**34.709.878**	**0**	**34.709.878**	**99,50%**
1. Troškovi projektovanja (PGD)	17.442.150	17.442.150	0	17.442.150	100,00%
2. Troškovi projektovanja (PZI)	17.442.150	17.267.728	0	17.267.728	99,00%
Ukupno po Osnovnom ugovoru/Aneks br.1 :	**1.162.810.000**	**1.010.653.941**	**36.611.956**	**1.047.265.897**	**90,06%**
Aneks br.2					
Radovi i usluge po Aneksu br.2	6.512.454	2.945.454	0	2.945.454	45,23%
Ukupno po Aneksu br.2 :	**6.512.454**	**2.945.454**	**0**	**2.945.454**	**45,23%**
Aneks br.3					
Radovi i usluge po Aneksu br.3	28.137.001	24.993.159	0	24.993.159	88,83%
Ukupno po Aneksu br.3 :	**28.137.001**	**24.993.159**	**0**	**24.993.159**	**88,83%**

Opis	*Ugovorena vrednost*	*Prethodni period*	*Overene situacije u izveštavanom periodu*	*Kumulativni iznos*	*% kumulativnih izvedenih Radova*
Izvođač - JV CRIC-CCCC - radovi i usluge overeni u privremenim situacijama					
Privremene situacije Izvođača (za radove i usluge zaključno sa 31.05.2024.godine)					
Aneks br.4					
Radovi i usluge po Aneksu br.4	52.301.210	38.370.430	0	38.370.430	73,36%
Ukupno po Aneksu br.4 :	**52.301.210**	**38.370.430**	**0**	**38.370.430**	**73,36%**
UKUPNO:	**1.249.760.664**	**1.076.962.983**	**36.611.956**	**1.113.574.939**	**89,10%**

U izveštavanom periodu (jul 2024. godine) overena je 23. Privremena situacija za izvođenje radova (br.033), overena 10.07.2024. godine.

Pregled realizovanih radova/usluga Izvođača prema overenim privremenim situacijama (u izveštajnom periodu zaključno sa julom 2024.godine):

Komercijalni ugovor, broj 340-5583/2018-3 od 07.07.2018.,prihvaćeni ugovorni iznos : 1.162.810.000,00 USD									
Avansne situacije									
Redni Br.	**Opis**	**Datum potpisivanja od strane stručnog Nadzora**	**Iznos plaćanja za izvršene radove USD (a)**	**Odbitak za povraćaj avansa (30% iznosa za plaćanje) (b)**	**Odbitak za zadržane sume (5% iznosa za plaćanje) (c)**	**Deo za kinesku EXIM Banku (85%) USD (e=(a-b-c)×85%)**	**Deo za finansijera (15%) USD (f=(a-b-c)×15%)**	**Plaćanja za obračunski period USD (g=e+f)**	**Napomene**
001	1 deo Avansa	12.07.2021.	232.562.000	0	0	197.677.700	34.884.300	232.562.000	20% od Prihvaćenog ugovornog iznosa. Deo za radova u iznosu od 225.585.140,00 USD i deo za projektovanje u iznosu od 6.976.860,00 USD. Situacija potpisana od strane prethodnoh stručnog Nadzora, IŽS.
002	2 deo Avansa	05.10.2021.	58.140.500	0	0	49.419.425	8.721.075	58.140.500	5% od Prihvaćenog ugovornog iznosa. Deo za radova u iznosu od 56.396.285,00 USD i deo za projektovanje u iznosu od 1.744.215,00 USD. Situacija potpisana od strane prethodnoh stručnog Nadzora, IŽS.
Total (USD)			**290.702.500**	**0**	**0**	**247.097.125**	**43.605.375**	**290.702.500**	
Privremene situacije									
Redni Br.	**Opis**	**Datum potpisivanja od strane stručnog Nadzora**	**Iznos plaćanja za izvršene radove, ne uključujući Avans USD (a)**	**Odbitak za povraćaj avansa (30% iznosa za plaćanje) (b)**	**Odbitak za zadržane sume (5% iznosa za plaćanje) (c)**	**Deo za kinesku EXIM Banku (85%) USD (e=(a-b-c)×85%)**	**Deo za finansijera (15%) USD (f=(a-b-c)×15%)**	**Plaćanja za obračunski period USD (g=e+f)**	**Napomene**
003	1. situacija za Projektovanje	05.06.2022	17.442.150	5.232.645	872.108	9.636.788	1.700.610	11.337.398	-
004	1. situacija za Radove	13.06.2022.	9.614.915	2.884.474	480.746	5.312.240	937.454	6.249.695	period izvođenja radova 01.04.2022. - 30.04.2022.
005	2. situacija za Radove	15.08.2022.	13.903.895	4.171.168	695.195	7.681.902	1.355.630	9.037.532	period izvođenja radova 01.05.2022. - 31.05.2022.
006	3. situacija za Radove	13.10.2022.	18.731.501	5.619.450	936.575	10.349.154	1.826.321	12.175.475	period izvođenja radova 01.06.2022. - 31.08.2022.
007	4. situacija za Radove	09.11.2022.	19.477.682	5.843.305	973.884	10.761.419	1.899.074	12.660.493	period izvođenja radova 01.09.2022. - 30.09.2022.
008	5. situacija za Radove	24.11.2022.	27.708.578	8.312.573	1.385.429	15.308.989	2.701.586	18.010.575	period izvođenja radova 01.10.2022. - 31.10.2022.
009	2. situacija za Projektovanje	30.11.2022.	11.686.240	3.488.430	584.312	6.471.473	1.142.025	7.613.498	ovom situacijom Izvođač radova opravdao kompletan Avans, deo za projektovanje, u ukupnom iznosu od 8.721.075,00 USD.
012	6. situacija za Radove	19.01.2023.	67.934.326	20.380.298	3.396.716	37.533.715	6.623.597	44.157.312	period izvođenja radova 01.11.2022. - 09.12.2022.
013	7. situacija za Radove	27.02.2023.	34.930.991	10.479.297	1.746.550	19.299.372	3.405.772	22.705.144	period izvođenja radova 10.12.2022. - 27.01.2023.
014	8. situacija za Radove	05.04.2023.	30.819.702	9.245.910	1.540.985	17.027.885	3.004.921	20.032.806	period izvođenja radova 28.01.2023. - 24.02.2023.
015	9. situacija za Radove	03.05.2023.	53.519.981	16.055.994	2.675.999	29.569.790	5.218.198	34.787.988	period izvođenja radova 25.02.2023. - 03.04.2023.
016	10. situacija za Radove	31.05.2023.	49.478.209	14.843.463	2.473.910	27.336.711	4.824.125	32.160.836	period izvođenja radova 04.04.2023. - 03.05.2023.
017	11. situacija za Radove	12.07.2023.	55.525.548	16.657.664	2.776.277	30.677.865	5.413.741	36.091.606	period izvođenja radova 04.05.2023. - 01.06.2023.
018	12. situacija za Radove	07.08.2023.	69.384.241	20.815.272	3.469.212	38.334.793	6.764.963	45.099.757	period izvođenja radova 02.06.2023. - 03.07.2023.
019	13. situacija za Radove	19.09.2023.	77.079.449	23.123.835	3.853.972	42.586.396	7.515.246	50.101.642	period izvođenja radova 04.07.2023. - 03.08.2023.
020	14. situacija za Radove	12.10.2023.	43.830.371	13.149.111	2.191.519	24.216.280	4.273.461	28.489.741	period izvođenja radova 04.08.2023. - 01.09.2023.
021	15. situacija za Radove	09.11.2023.	78.508.781	23.552.634	3.925.439	43.376.101	7.654.606	51.030.708	period izvođenja radova 02.09.2023. - 02.10.2023.
023	16. situacija za Radove	01.12.2023.	73.958.923	22.187.677	3.697.946	40.862.305	7.210.995	48.073.300	period izvođenja radova 03.10.2023. - 01.11.2023.
024	17. situacija za Radove	10.01.2024.	46.784.515	14.035.354	2.339.226	25.848.444	4.561.490	30.409.935	period izvođenja radova 02.11.2023. - 30.11.2023.
025	18.situacija za Radove	01.02.2024.	2.018.525	605.558	100.926	1.115.235	196.806	1.312.041	period izvođenja radova 01.12.2023. - 31.12.2023.
026	19.situacija za Radove		92.597.259						period izvođenja radova 01.01.2024. - 31.01.2024.
026 A, C	19.situacija za Radove - budžet	22.03.2024.	13.889.589	4.166.877	694.479		9.028.233	9.028.233	period izvođenja radova 01.01.2024. - 31.01.2024.
026 B, D	19.situacija za Radove - kredit	05.04.2024.	78.707.670	23.612.301	3.935.383	51.159.985		51.159.985	period izvođenja radova 01.01.2024. - 31.01.2024.
027	20.situacija za Radove		27.398.560						period izvođenja radova 01.02.2024. - 29.02.2024.
027 A, C	20.situacija za Radove - budžet	02.04.2024.	4.109.784	1.232.935	205.489		2.671.360	2.671.360	period izvođenja radova 01.02.2024. - 29.02.2024.
027 B, D	20.situacija za Radove - kredit	05.04.2024.	23.288.776	6.986.633	1.164.439	15.137.705		15.137.705	period izvođenja radova 01.02.2024. - 29.02.2024.
030	21.situacija za Radove	20.05.2024.	32.833.737	9.850.121	1.641.687	18.140.640	3.201.289	21.341.929	period izvođenja radova 01.03.2024. - 31.03.2024.

Privremene situacije									
Redni Br.	Opis	Datum potpisivanja od strane stručnog Nadzora	Iznos plaćanja za izvršene radove, ne uključujući Avans USD (a)	Odbitak za povraćaj avansa (30% iznosa za plaćanje) (b)	Odbitak za zadržane sume (5% iznosa za plaćanje) (c)	Deo za kinesku EXIM Banku (85%) USD (e=(a-b-c)×85%)	Deo za finansijera (15%) USD (f=(a-b-c)×15%)	Plaćanja za obračunski period USD (g=e+f)	Napomene
031	3. situacija za Projektovanje	20.05.2024.	5.581.488	0	279.074	4.507.052	795.362	5.302.414	-
032	22.situacija za Radove	11.06.2024.	49.904.376	4.169.519	2.495.219	36.753.693	6.485.946	43.239.638	period izvođenja radova 01.04.2024. - 07.05.2024. ovom situacijom Izvođač radova opravdao kompletan Avans, deo za radove, u ukupnom iznosu od 281.981.425,00 USD.
033	23.situacija za Radove	10.07.2024.	36.611.956	0	1.830.598	29.564.154	5.217.204	34.781.358	period izvođenja radova 08.05.2024. - 31.05.2024.
Total (USD)			**1.047.265.897**	**290.702.500**	**52.363.295**	**598.570.087**	**105.630.015**	**704.200.102**	

Aneks ugovora br.2, broj 340-9986/2022 od 09.12.2022., prihvaćeni ugovorni iznos : 6.512.453,59 USD						
Redni Br.	Opis	Datum potpisivanja od strane stručnog Nadzora	Iznos plaćanja za izvršene radove (USD)	Deo za finansijera	Plaćanja za obračunski period (USD)	Napomene
Avansne situacije						
010	Avans Aneks II	12.12.2022.	3.567.000	3.567.000	3.567.000	100% od Prihvaćenog ugovornog iznosa za ostale radove po Aneksu II (radovi - Gasovod Subotica i privremena saobraćajnica na km 113; usluge - projektovanje izmeštanje gasovoda u Subotici, projektovanje privremena saobraćajnica km 113 i arheologija prva faza). Deo za radova u iznosu od 2.278.060,5 USD i deo za usluge u iznosu od 1.288.939,51 USD.
Total (USD)			**3.567.000**	**3.567.000**	**3.567.000**	
Privremene situacije						
011	I privremena Aneks II	12.12.2022.	2.945.454	2.945.454	2.945.454	period izvođenja radova 01.01.2022. - 18.03.2022.
Total (USD)			**2.945.454**	**2.945.454**	**2.945.454**	

Aneks ugovora br.3, broj 340-9166/2023 od 06.10.2023., prihvaćeni ugovorni iznos : 28.137.000,91 USD						
Redni Br.	**Opis**	**Datum potpisivanja od strane stručnog Nadzora**	**Iznos plaćanja za izvršene radove (USD)**	**Deo za finansijera**	**Plaćanja za obračunski period (USD)**	**Napomene**
022	I privremena Aneks III	14.11.2023.	24.993.159	24.993.159	24.993.159	period izvođenja radova 01.01.2023. - 14.11.2023.
Total (USD)			**24.993.159**	**24.993.159**	**24.993.159**	

Aneks ugovora br.4, broj 340-2110/2024-1 od 15.03.2024., prihvaćeni ugovorni iznos : 52.301.209,67 USD						
Redni Br.	**Opis**	**Datum potpisivanja od strane stručnog Nadzora**	**Iznos plaćanja za izvršene radove (USD)**	**Deo za finansijera**	**Plaćanja za obračunski period (USD)**	**Napomene**
Avansne situacije						
028	Avans Aneks IV	16.04.2024.	10.171.198	10.171.198	10.171.198	100% od Prihvaćenog ugovornog iznosa za ostale radove po Aneksu IV (u skladu sa odlukom Inženjera NAD-NSSB-MGSI-014). Deo za radova u iznosu od 4.906.984,15 USD i deo za usluge u iznosu od 5.264.213,42 USD.
Total (USD)			**10.171.198**	**10.171.198**	**10.171.198**	
Privremene situacije						
029	I privremena Aneks IV	18.04.2024.	38.370.430	38.370.430	38.370.430	period izvođenja radova 01.01.2024. - 28.03.2024.
Total (USD)			**38.370.430**	**38.370.430**	**38.370.430**	

Plaćanje zadržanog novca

Komercijalni ugovor, broj 340-5583/2018-3 od 07.07.2018.,prihvaćeni ugovorni iznos : 1.162.810.000,00 USD, 5 % ugovorene vrednosti						
Redni Br.	**Opis**	**Oslobađanje zadržanih suma (a)**	**Deo za kinesku EXIM Banku (85%) USD (b=a×85%)**	**Deo za finansijera (15%) USD (c=(a×15%)**	**Plaćanja za obračunski period USD (d=b+c)**	**Napomene**
1	1. deo garantnog depozita	29.070.250	24.709.713	4.360.538	29.070.250	Nakon izdavanja potvrde o prijemu radova
2	2. deo garantnog depozita	29.070.250	24.709.713	4.360.538	29.070.250	Nakon isteka roka za prijavu nedostataka
Total (USD)		**58.140.500**	**49.419.425**	**8.721.075**	**58.140.500**	

9 PREGLED ZAHTEVA ZA SAGLASNOST MATERIJALA (MAR)

(01)_NSSU-S2-ARC-MAR-ARHITEKTONSKI RADOVI					
MAR_ID	Deonica	Materijal	Status	Komentar	PZI
NSSU-S2-D2-ARC-ST9-MAR-077R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Staklo - Proizvođač :STAKLO MILIĆEVIĆ Z.G. DOO . Ciglarska 8, 385401 Temerin , Srbija	A	n/a	PZI - Projekat arhitekture rekonstrukcije stanične zgrade i dogradnje novog objekta u železničkoj stanici Žednik, knjiga 1/10.2. pozicije rekonstrukcije stanične zgrade: 9.3.;9.3.1;9.5.;9.5.1;9.5.2.;9.5.3.;9.5.4.;9.5.5.;9.6.;9.6.1.;9.6.2.;9.6.3.;9.6.4.;9.8.;9.10.;9.10.2.;9.3.;9.13
NSSU-S2-D3-ARC-ST11-MAR-098-R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Staklo - Proizvođač :STAKLO MILIĆEVIĆ Z.G. DOO . Ciglarska 8, 385401 Temerin , Srbija	A	n/a	Projekat arhitekture rekonstrukcije stanične zgrade i dogradnje novog objekta u železničkoj stanici Subotica, zgrada za SS i TK, knjiga 1/12.2. Pozicije dogradnja novog objekta: 8.1.;8.2.;8.4.;8.5.;8.6.;8.7.;8.8.;8.9.;8.10.;8.10.1.;8.10.2.;8.10.3.;8.11.
NSSU-S2-D3-ARC-ST11-MAR-073-R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Luxfer glass,manufacturer:Luxfer glass syistems d.o.o. Zmaj Jovina 3, 22441 Deč,Serbia. Staklene prizme,proizvođač : Luxfer glass systems d.o.o. Zmaj Jovina 3 , 22441 Deč, Srbija.	A	n/a	Projekat arhitekture rekonstrukcije stanične zgrade i dogradnje novog objekta u železničkoj stanici Subotica, zgrada za SS i TK, knjiga 1/12.2. Pozicije : 5.1.
NSSU-S2-D3-ARC-TK-CRSC-MAR-072-R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Luxfer glass,manufacturer : Luxfaer glass system d.o.o ,Zmaj Jovina 3, 22441 Deč,Serbia Staklena prizma,Luxfer system d.o.o , Zmaj Jovina 3,22441 Deč,Srbija.	A	n/a	PZI - Projekat arhitekture zgrade za smeštaj TK opreme Novi Grad, knjiga 1/14.7 pozicije:04.03. PZI - Projekat arhitekture zgrade za smeštaj TK opreme Subotica, knjiga 1/14.8 pozicije:04.03.. PZI - Projekat arhitekture zgrade za smeštaj TK opreme Kelebija, knjiga 1/14.9 pozicije.04.03.
NSSU-S2-D3-ARC-TK-CRSC-MAR-099	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Ograda "Legi rm" i kapija "Legi vario m"	A	n/a	PZI - Projekat arhitekture zgrade za smeštaj TK opreme Novi Grad, knjiga 1/14.7 pozicije:07.03. ; 07.04. PZI - Projekat arhitekture zgrade za smeštaj TK opreme Subotica, knjiga 1/14.8 pozicije:07.03. ; 07.04. PZI - Projekat arhitekture zgrade za smeštaj TK opreme Kelebija, knjiga

					1/14.9 pozicije.07.03. ; 07.04.
NSSU-S2-D2-ARC-TK-CRSC-MAR-146	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Behaton ploče	A	n/a	Projekat broj: 1.14.4 - TK Mali Iđoš Polje 1.14.5 - TK Mali Beograd 1.14.6. - TK Verušić Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu.
NSSU-S2-D2-ARC-TK-CRSC-MAR-147	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Betonski ivičnjaci	A	n/a	Projekat broj: 1.14.4 - TK Mali Iđoš Polje 1.14.5 - TK Mali Beograd 1.14.6. - TK Verušić Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu.
NSSU-S2-D2-ARC-ST9-CRSC-MAR-135	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Ograda tip " Legi RM " i kapija tip " Legi Vario S "	A	n/a	PZI - Projekat arhitekture rekonstrukcije stanične zgrade i dogradnje novog objekta u železničkoj stanici Žednik, knjiga 1/10.2. pozicije dogradnja novog objekta: 4.1.;4.2.;4.3.;4.4.;4.5.
NSSU-S2-D3-ARC-ST11-CRSC-MAR-100	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Dvokrilna kapija tip "Light palisada" i ograda tip "Eurofence 3D Palisada"	A	n/a	Projekat arhitekture rekonstrukcije stanične zgrade i dogradnje novog objekta u železničkoj stanici Subotica, zgrada za SS i TK, knjiga 1/12.2. Pozicije dogradnja novog objekta: 5.1.;5.2.
NSSU-S2-D3-ARC-ST10-CRSC-MAR-064-R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Multibat	U TOKU		Projekat broj: 1.11.2 - SS i TK Naumovićevo Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S2-D2-ARC-ST8-CRSC-MAR-086-R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Multibat	U TOKU		Projekat broj: 1.9.2 Projekat arhitekture rekonstrukcije i dogradnje zgrade za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Bačka Topola Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S2-D2-ARC-TK-CRSC-MAR-021-R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Multibat	U TOKU		Projekat broj: 2/9.14.4 , 2.9.14.5 i 2.9.14.6. Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S2-D3-ARC-ST10-CRSC-MAR-066-R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Glet	U TOKU		Projekat broj: 1.11.2 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ ЗА СС И ТК СА ОТПРАВНИКОМ У

					ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НАУМОВИЋЕВО Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S2-D3-ARC-ST10-CRSC-MAR-067-R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Disperzivna boja	U TOKU		Projekat broj: 1.11.2 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ ЗА СС И ТК СА ОТПРАВНИКОМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НАУМОВИЋЕВО Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S2-D3-ARC-ST10-CRSC-MAR-080-R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Fasadna boja	U TOKU		Projekat broj: 1.11.2 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ ЗА СС И ТК СА ОТПРАВНИКОМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НАУМОВИЋЕВО Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S2-D3-ARC-ST10-CRSC-MAR-084-R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Dekorativni malter - kulirplast	U TOKU		Projekat broj: 1.11.2 - SS i TK Naumovićevo Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S2-D2-ARC-ST8-CRSC-MAR-088-R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Glet	U TOKU		Projekat broj: 1.9.2 Projekat arhitekture rekonstrukcije i dogradnje zgrade za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Bačka Topola Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S2-D2-ARC-ST8-CRSC-MAR-103-R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Fasadna boja	U TOKU		Projekat broj: 1.9.2 Projekat arhitekture rekonstrukcije i dogradnje zgrade za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Bačka Topola Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S2-D2-ARC-ST8-CRSC-MAR-107-R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Dekorativni malter - kulirplast	U TOKU		Projekat broj: 1.9.2 Projekat arhitekture rekonstrukcije i dogradnje zgrade za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Bačka Topola Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S2-D2-ARC-TK-CRSC-MAR-023-R1	S2_Lovcenac-Subotica-	Glet	U TOKU		Projekat broj: 2/9.14.4 , 2.9.14.5 i 2.9.14.6. Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim

	Drzavna granica				uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S2-D2-ARC-TK-CRSC-MAR-024-R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Disperzivna boja	U TOKU		Projekat broj: 2/9.14.4 - Пројекат архитектуре зграде за смештај ТК опреме Мали Иђош Поље , 2.9.14.5 - Пројекат архитектуре зграде за смештај ТК опреме Мали Београд і 2.9.14.6. - Пројекат архитектуре зграде за смештај ТК опреме Верушић Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S2-D2-ARC-TK-CRSC-MAR-037-R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Fasadna boja	U TOKU		Projekat broj: 1.14.4 - Пројекат архитектуре зграде за смештај ТК опреме Мали Иђош Поље, 1.14.5 - Пројекат архитектуре зграде за смештај ТК опреме Мали Београд і 1.14.6. - Пројекат архитектуре зграде за смештај ТК опреме Верушић Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu.
NSSU-S2-D2-ARC-TK-CRSC-MAR-039-R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Dekorativni malter - kulirplast	U TOKU		Projekat broj: 1.14.4 , 1.14.5 i 1.14.6. Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu.
NSSU-S2-D2-ARC-TK-CRSC-MAR-046	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	PP vrata	U TOKU		Projekat broj: 1.14.4 , 1.14.5 i 1.14.6. Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu.
NSSU-S2-D2-ARC-ST8-CRSC-MAR-100-R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Lepak za keramiku	U TOKU		Projekat broj: 1.9.2 Projekat arhitekture rekonstrukcije i dogradnje zgrade za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Bačka Topola Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
(02)_NSSU-S2-SUB-MAR-RADOVI NA DONJEM STROJU					
MAR_ID	Deonica	Materijal	Status	Komentar	PZI
NSSU-S1.11-D2-SUB-MAR-047	S1_Novi Sad-Lovcenac	Mešavina peska i šljunka za izradu prelaznog sloja nasipa pruge	A	n/a	Projekat za izvođenje, knjige 2/2.3.1.1 pozicija: 2/2.02.19
NSSU-S1.11-D2-SUB-MAR-048	S1_Novi Sad-Lovcenac	Mešavina šljunka i drobljenog kamenog agregata 0/31mm za izradu zaštitnog sloja nasipa pruge	A	n/a	Projekat za izvođenje, knjige 2/2.3.1.1 pozicija: 2/2.02.21

NSSU-S1-D2-SUB-UP4-MAR-030	S1_Novi Sad-Lovcenac	Pesak iz reke Dunav za izradu nasipa od peska	U TOKU		Projekat za izvođenje knjige: 2/3.1.11.3; pozicije: 01.01.03.07
NSSU-S1-D2-SUB-UP4-MAR-031	S1_Novi Sad-Lovcenac	Kameni agregat 0/63 mm proizvođača - Kamenolom ,,Gradac'' Likodra Srbija	U TOKU		Projekat za izvođenje knjige: 2/3.1.11.3 ;pozicije: 01.01.04.01
NSSU-S1-D2-SUB-UP4-MAR-032	S1_Novi Sad-Lovcenac	Kameni agregat 0/31,5 mm proizvođača - Kamenolom GRADAC Likodra Srbija	U TOKU		Projekat za izvođenje knjige: 2/3.1.11.3 , pozicije: '01.01.04.02
NSSU-S1-D2-SUB-UP4-MAR-033	S1_Novi Sad-Lovcenac	GP GEMAX doo, Batajnicki drum , Beograd-Zemun , Srbija Asfalt beton AB11 proizvođača - / GP GEMAX doo, Batajnicki drum , Beograd-Zemun , Srbija	U TOKU		Projekat za izvođenje knjige: 2/3.1.11.3 ; pozicije: 01.01.04.05
NSSU-S1-D2-SUB-UP4-MAR-034	S1_Novi Sad-Lovcenac	Asfalt beton AB8 proizvođača - GP GEMAX doo , Batajnicki drum BB , Beograd-Zemun , Srbija	U TOKU		Projekat za izvođenje knjige: 2/3.1.11.3 ; pozicije: 01.01.04.04
(03)_NSSU-S2-SST-MAR-KONSTRUKCIJE					
MAR_ID	Deonica	Materijal	Status	Komentar	PZI
NSSU-S2-D3-SST-MAR-032	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Pričvrsni kolosečni pribor, proizvođača DIV Betonski pragovi doo, Svrljig, Srbija	A	n/a	Projekat za izvođenje, knjige 2.2.5.3.5 i 1.12.6
(04)_NSSU-S1-STR-MAR-RADOVI NA GORNJEM STROJU					
MAR_ID	Deonica	Materijal	Status	Komentar	PZI
NSSU-S1-D1-STR-OCS-ST1EVP-MAR-016-R1	S1_Novi Sad-Lovcenac	Aluminijumska bravarija	U TOKU		Tehnički uslovi:1/1.3.5.1-8.1
NSSU-S1-D1-STR-OCS-ST1EVP-MAR-019	S1_Novi Sad-Lovcenac	Dupli elektroprovodljivi pod	B	Komentar u dokumentu	Tehnički uslovi:1/1.3.5.1-12
NSSU-S1-D1-STR-OCS-ST1EVP-MAR-020	S1_Novi Sad-Lovcenac	Elektroprovodljiva gumena podna obloga , samonivelišuća masa	A	n/a	Tehnički uslovi:1/1.3.5.1-12
NSSU-S1-D1-STR-OCS-ST1EVP-MAR-021	S1_Novi Sad-Lovcenac	Čelični pocinkovani lim	B	Komentar u dokumentu	Tehnički uslovi:1/1.3.5.1-9
NSSU-S1-D1-STR-OCS-	S1_Novi Sad-Lovcenac	Unutrašnja glet masa,unutrašnja disperziona boja	A	n/a	Tehnički uslovi:1/1.3.5.2-13

ST1EVP-MAR-022					
NSSU-S1-D1-STR-OCS-ST1EVP-MAR-023	S1_Novi Sad-Lovcenac	Keramičke pločice	A	n/a	Tehnički uslovi:1/1.3.5.2-11
NSSU-S1-D1-STR-OCS-ST1EVP-MAR-024	S1_Novi Sad-Lovcenac	Facade finishing layer	A	n/a	Tehnički uslovi:1/1.3.5.2-14
NSSU-S1-D1-STR-OCS-ST1EVP-MAR-025	S1_Novi Sad-Lovcenac	Čelik S235JRG2 ; Pamplex staklo	U TOKU		Tehnički uslovi: 1/5.2-8 : 1/5.2-10
NSSU-S1-D1-STR-OCS-ST1EVP-MAR-026	S1_Novi Sad-Lovcenac	Marka betona C 35/45 Description of concrete composition: 1 bag SikaGrout®-314: 2,8-3,2 l water per bag 25 kg / Opis sastava betona: 1 džak SikaGrout®-314: 2,8-3,2 l vode po džaku od 25 kg	A	n/a	Tehnički uslovi: 2/9.1.4.3.5-01.02.00
NSSU-S1-D1-STR-OCS-ST3PS-MAR-013-R1	S1_Novi Sad-Lovcenac	Čelični pocinkovani lim	A	n/a	Tehnički uslovi: 1/5.2-8
NSSU-S1-D1-STR-OCS-ST3PS-MAR-014	S1_Novi Sad-Lovcenac	Dupli elektroprovodljivi pod	B	Komentar u dokumentu	Tehnički uslovi: 1/5.2-10
NSSU-S1-D1-STR-OCS-ST3PS-MAR-015	S1_Novi Sad-Lovcenac	Teraco ploče	U TOKU		Tehnički uslovi: 1/5.2-10
NSSU-S1-D1-STR-OCS-ST3PS-MAR-016	S1_Novi Sad-Lovcenac	Unutrašnja glet masa,unutrašnja disperziona boja	U TOKU		Tehnički uslovi: 1/5.2-11
NSSU-S1-D1-STR-OCS-ST3PS-MAR-017	S1_Novi Sad-Lovcenac	Facade finishing layer	A	n/a	Tehnički uslovi: 1/5.2-12
NSSU-S1-D1-STR-OCS-ST3PS-MAR-018	S1_Novi Sad-Lovcenac	Čelik S235JRG2(Čelična konstrukcija nadstrešnica)	A	n/a	Tehnički uslovi: 1/5.2-9
NSSU-S1-D1-STR-OCS-ST5PSN-MAR-010-R1	S1_Novi Sad-Lovcenac	Aluminijumska bravarija	U TOKU		Tehnički uslovi: 1/5.2-7

NSSU-S1-D1-STR-OCS-ST5PSN-MAR-013-R1	S1_Novi Sad-Lovcenac	Čelični pocinkovani lim	A	n/a	Tehnički uslovi: 1/5.2-8
NSSU-S1-D1-STR-OCS-ST5PSN-MAR-014	S1_Novi Sad-Lovcenac	Dupli elektroprovodljivi pod	U TOKU		Tehnički uslovi: 1/5.2-10
NSSU-S1-D1-STR-OCS-ST5PSN-MAR-015	S1_Novi Sad-Lovcenac	Teraco ploče	U TOKU		Tehnički uslovi: 1/5.2-10
NSSU-S1-D1-STR-OCS-ST5PSN-MAR-016	S1_Novi Sad-Lovcenac	Unutrašnja glet masa,unutrašnja disperziona boja	U TOKU		Tehnički uslovi: 1/5.2-11
NSSU-S1-D1-STR-OCS-ST5PSN-MAR-018	S1_Novi Sad-Lovcenac	Čelik S235JRG2(Čelična konstrukcija nadstrešnica)	A	n/a	Tehnički uslovi: 1/5.2-9
NSSU-S1-D2-STR-OCS-ST6EVP-MAR-018-R1	S1_Novi Sad-Lovcenac	Aluminijumska bravarija	U TOKU		Tehnički uslovi: 1/7.4.5.2-8.1
NSSU-S1-D2-STR-OCS-ST6EVP-MAR-021	S1_Novi Sad-Lovcenac	Dupli elektroprovodljivi pod	A	n/a	Tehnički uslovi: 1/7.4.5.2-12
NSSU-S1-D2-STR-OCS-ST6EVP-MAR-022	S1_Novi Sad-Lovcenac	Elektroprovodljiva gumena podna obloga , samonivelišuća masa	B	Komentar u dokumentu	Tehnički uslovi: 1/7.4.5.2-12
NSSU-S1-D2-STR-OCS-ST6EVP-MAR-023	S1_Novi Sad-Lovcenac	Čelični pocinkovani lim	U TOKU		Tehnički uslovi: 1/7.4.5.2-9
NSSU-S1-D2-STR-OCS-ST6EVP-MAR-024	S1_Novi Sad-Lovcenac	Unutrašnja glet masa,unutrašnja disperziona boja	U TOKU		Tehnički uslovi: 1/7.4.5.2-13
NSSU-S1-D2-STR-OCS-ST6EVP-MAR-025	S1_Novi Sad-Lovcenac	Keramičke pločice	A	n/a	Tehnički uslovi: 1/7.4.5.2-11
NSSU-S1-D2-STR-OCS-ST6EVP-MAR-026	S1_Novi Sad-Lovcenac	Facade finishing layer	B	Komentar u dokumentu	Tehnički uslovi: 1/7.4.5.2-14
NSSU-S1-D2-STR-OCS-	S1_Novi Sad-Lovcenac	Čelik S235JRG2 ; Pamplex staklo	A	n/a	Tehnički uslovi: 1/7.4.5.2-8 : 1/7.4.5.2-10

ST6EVP-MAR-027					
NSSU-S1-D2-STR-OCS-ST6EVP-MAR-028	S1_Novi Sad-Lovcenac	Marka betona C 35/45 Description of concrete composition: 1 bag SikaGrout®-314: 2,8-3,2 l water per bag 25 kg / Opis sastava betona: 1 džak SikaGrout®-314: 2,8-3,2 l vode po džaku od 25 kg	A	n/a	Tehnički uslovi: 2/9.1.4.3.5-01.02.00
NSSU-S1-D2-STR-TKK-MAR-007	S1_Novi Sad-Lovcenac	Opis sastava betona: Portland kompozit cement(CEM II/A-M(S-L)42,5R), voda, agregat- trofrakcijski (0/4mm, 4-8mm, 8-16mm).	A	n/a	Projekat za izvođenje, knjige: 2.11.2.1;2.11.2;2,2.11.2.3;2.11.2.4; 2.12.1;2.12.2;2.12.3;2.13.2
NSSU-S1-D2-STR-TKK-MAR-008	S1_Novi Sad-Lovcenac	Armatura	A	n/a	Projekat za izvođenje, knjige: 2.11.2.1;2.11.2;2,2.11.2.3;2.11.2.4; 2.12.1;2.12.2;2.12.3;2.13.2
NSSU-S1-D2-STR-TKK-MAR-009	S1_Novi Sad-Lovcenac	Opis sastava betona: Portland kompozit cement(CEM II/A-M(S-L)42,5R), voda i agregat- trofrakcijski (0/4mm, 4-8mm, 8-16mm).	A	n/a	Projekat za izvođenje, knjige: 2.11.2.1;2.11.2;2,2.11.2.3;2.11.2.4; 2.12.1;2.12.2;2.12.3;2.13.2
NSSU-S1-D1-STR-BR1-MAR-013	S1_Novi Sad-Lovcenac	Cementna stabilizacija	A	n/a	Projekat broj: 2/1.1.05 Projekat mosta na km 0+796 Tehnički uslovi: 03.10.
NSSU-S1-D1-STR-SS-MAR-043-R1	S1_Novi Sad-Lovcenac	Dekorativni fasadni malter	B	Komentar u dokumentu	Projekat broj: 1/2.1 - Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Sajlovo 1.3 - Projekat arhitekture za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Rumenka 1/4.2 - Projekat arhitekture rekonstrukcije i dogradnje zgrade za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Kisač
NSSU-S1-D1-STR-SS-MAR-091-R1	S1_Novi Sad-Lovcenac	Fasadna žaluzina	A	n/a	Projekat broj: 1/2.1 - Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Sajlovo 1.3 - Projekat arhitekture za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Rumenka
NSSU-S1-D1-STR-SS-MAR-109	S1_Novi Sad-Lovcenac	Kameni tepih	B	Komentar u dokumentu	Projekat broj: 1/2.1 - Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Sajlovo 1.3 - Projekat arhitekture za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Rumenka 1.4.2. -Projekat arhitekture rekonstrukcije i dogradnje zgrade za SS i

					TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Kisač
NSSU-S1-D1-STR-SS-MAR-110	S1_Novi Sad-Lovcenac	Oglasna tabla	A	n/a	Projekat broj: 1/2.1 - Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Sajlovo 1.3 - Projekat arhitekture za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Rumenka
NSSU-S1-D1-STR-SS-ST3-MAR-031-R1	S1_Novi Sad-Lovcenac	Elektro provodljiva heterogena vinil podna obloga pogodna za laboratorije, čiste sobe i elektrostatički osetiljve prostorije velike prohodnosti.	A	n/a	Project no/Projekat broj : 1/2.1 , 2/9.2 ,3/3.1.4 (Sajlovo) Project no/Projekat broj : 1/3 , 2/9.3 ,3/3.1.4 (Rumenka) Project no/Projekat broj : 1/4.2 , 2/9.4.1 ,3/3.2.1 (Kisač)
NSSU-S1-D1-STR-SS-ST3-MAR-045-R1	S1_Novi Sad-Lovcenac	Sastoje se od gipsanog jezgra koje je obloženo kartonom i pretežno se koriste za oblaganje zidova i plafona u unutrašnjosti zgrada jer jednostavne za montažu i imaju dobre performanse. Takođe se koriste i u prostorijama koje su sklone vlaži, poput kupatila i kuhinje.	A	n/a	Project no/Projekat broj : 1/2.2 , 2/9.2.2 (Sajlovo 2 adaptacija) Project no/Projekat broj : 1/4.2 , 2/9.4.1 ,3/3.2.1 (Kisač)
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-040-R1	S1_Novi Sad-Lovcenac	Drvena građa	A	n/a	Projekat broj: 1/2.1 - Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Sajlovo 1.3 - Projekat arhitekture za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Rumenka 1.4.2- Projekat arhitekture rekonstrukcije i dogradnje zgrade za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj staici Kisač
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-100-R1	S1_Novi Sad-Lovcenac	Mobilijar (nameštaj)-radni sto 140x80	A	n/a	Projekat broj: 1/2.1 - Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Sajlovo 1.3 - Projekat arhitekture za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Rumenka 1.4.2. -Projekat arhitekture rekonstrukcije i dogradnje zgrade za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Kisač
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-101-R1	S1_Novi Sad-Lovcenac	Mobilijar (nameštaj)-radni sto 140x60x75	A	n/a	Projekat broj: 1/2.1 - Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Sajlovo

					1.3 - Projekat arhitekture za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Rumenka 1.4.2. -Projekat arhitekture rekonstrukcije i dogradnje zgrade za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Kisač
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-102-R1	S1_Novi Sad-Lovcenac	Mobilijar (nameštaj)-kuhinja	A	n/a	Projekat broj: 1/2.1 - Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Sajlovo 1.3 - Projekat arhitekture za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Rumenka 1.4.2. -Projekat arhitekture rekonstrukcije i dogradnje zgrade za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Kisač
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-105	S1_Novi Sad-Lovcenac	Mobilijar (nameštaj)-kancelarijska stolica	A	n/a	Projekat broj: 1/2.1 - Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Sajlovo 1.3 - Projekat arhitekture za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Rumenka 1.4.2. -Projekat arhitekture rekonstrukcije i dogradnje zgrade za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Kisač
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-106	S1_Novi Sad-Lovcenac	Mobilijar (nameštaj)-garderobni ormar	A	n/a	Projekat broj: 1/2.1 - Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Sajlovo 1.3 - Projekat arhitekture za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Rumenka 1.4.2. -Projekat arhitekture rekonstrukcije i dogradnje zgrade za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Kisač
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-107	S1_Novi Sad-Lovcenac	Mobilijar (nameštaj)-ugradna ploča	B	Komentar u dokumentu	Projekat broj: 1/2.1 - Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Sajlovo 1.3 - Projekat arhitekture za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Rumenka 1.4.2. -Projekat arhitekture rekonstrukcije i dogradnje zgrade za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Kisač
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-108	S1_Novi Sad-Lovcenac	Mobilijar (nameštaj)- frižider	B	Komentar u dokumentu	Projekat broj: 1/2.1 - Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Sajlovo

					1.3 - Projekat arhitekture za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Rumenka 1.4.2. -Projekat arhitekture rekonstrukcije i dogradnje zgrade za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Kisač
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-112	S1_Novi Sad-Lovcenac	Alukobond	A	n/a	Projekat broj: 1/2.1 - Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Sajlovo 1.3 - Projekat arhitekture za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Rumenka
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-032-R1	S1_Novi Sad-Lovcenac	FASADNA I UNUTRAŠNJA VRATA, FASADNI PROZORI I ŽALUZINE	B	Komentar u dokumentu	Projekat broj: 1/5.1 PROJEKAT ZGRADE ZA SS I TK SA OTPRAVNIKOM U STAJALIŠTU STEPANOVIĆEVO Tehnički uslovi: 07
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-084-R1	S1_Novi Sad-Lovcenac	KONZOLNI SISTEM OSLONACA	A	n/a	Projekat broj: 1/5.1 PROJEKAT ZGRADE ZA SS I TK SA OTPRAVNIKOM U STAJALIŠTU STEPANOVIĆEVO Tehnički uslovi: 12
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-087-R1	S1_Novi Sad-Lovcenac	GLET	A	n/a	Projekat broj: 1/5.1 PROJEKAT ZGRADE ZA SS I TK SA OTPRAVNIKOM U STAJALIŠTU STEPANOVIĆEVO Tehnički uslovi: 11
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-104	S1_Novi Sad-Lovcenac	MATERIJAL ZA IZRADU FASADERSKIH RADOVA ALUKOBOND	A	n/a	Projekat broj: 1/5.1 PROJEKAT ZGRADE ZA SS I TK SA OTPRAVNIKOM U STAJALIŠTU STEPANOVIĆEVO Tehnički uslovi: 12
NSSU-S1-D2-STR-ST6-MAR-028	S1_Novi Sad-Lovcenac	Ankeri i ploce za temelje signalizacije	U TOKU		Projekat 8.3.2
NSSU-S1-D2-STR-TKK-MAR-007	S1_Novi Sad-Lovcenac	Opis sastava betona: Portland kompozit cement(CEM II/A-M(S-L)42,5R), voda, agregat- trofrakcijski (0/4mm, 4-8mm, 8-16mm).	U TOKU		Projekat za izvođenje, knjige: 2.11.2.1;2.11.2;2,2.11.2.3;2.11.2.4; 2.12.1;2.12.2;2.12.3;2.13.2
NSSU-S1-D2-STR-TKK-MAR-008	S1_Novi Sad-Lovcenac	Armatura	U TOKU		Projekat za izvođenje, knjige: 2.11.2.1;2.11.2;2,2.11.2.3;2.11.2.4; 2.12.1;2.12.2;2.12.3;2.13.2
NSSU-S1-D2-STR-TKK-MAR-009	S1_Novi Sad-Lovcenac	Opis sastava betona: Portland kompozit cement(CEM II/A-M(S-L)42,5R), voda i agregat- trofrakcijski (0/4mm, 4-8mm, 8-16mm).	U TOKU		Projekat za izvođenje, knjige: 2.11.2.1;2.11.2;2,2.11.2.3;2.11.2.4; 2.12.1;2.12.2;2.12.3;2.13.2

NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-113	S1_Novi Sad-Lovcenac	Betonski ivičnjak	A	n/a	Projekat broj: 1.14.2 Projekat arhitekture za smeštaj TK opreme Vrbas Nova, 1.14.3 Projekat arhitekture za smeštaj TK opreme Vrbas Atar, 1.14.1 Projekat arhitekture za smeštaj TK opreme Bačko Dobro Polje Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-114	S1_Novi Sad-Lovcenac	Behaton ploče	A	n/a	Projekat broj: 1.14.2 Projekat arhitekture za smeštaj TK opreme Vrbas Nova, 1.14.3 Projekat arhitekture za smeštaj TK opreme Vrbas Atar, 1.14.1 Projekat arhitekture zgrade za TK u železničkoj stanici Bačko Dobro Polje Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-115	S1_Novi Sad-Lovcenac	LMT tavanica	U TOKU		Projekat broj: 1.14.2 Projekat arhitekture za smeštaj TK opreme Vrbas Nova, 1.14.3 Projekat arhitekture za smeštaj TK opreme Vrbas Atar, 1.14.1 Projekat arhitekture za smeštaj TK opreme Bačko Dobro Polje Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S1-D2-ARC-ST6-MAR-004-R1	S1_Novi Sad-Lovcenac	Banja Komerc Bekament DOO, Kralja Petra Prvog 132, Aranđelovac, BK-Beton Kontakt - strukturna podloga za glatke površine	U TOKU		Projekat za Izvođenje: 1/7.1 pozicije: additional works 5
NSSU-S1-D2-ARC-ST6-MAR-008-R2	S1_Novi Sad-Lovcenac	RINO BET NS 2019 DOO, 21000 Novi Sad, Dimitrija Avramovića 1: Vibropresovani betonski elementi za popločavanje	U TOKU		Projekat za Izvođenje: 9/5.6.1 pozicije: 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2
NSSU-S1-D2-ARC-ST6-MAR-014-R1	S1_Novi Sad-Lovcenac	GRANIT LINE NATURAL STONE DOO, Industrijska zona bb, 34300 Aranđelovac: Kamene kocke	U TOKU		Projekat za Izvođenje: 9/6.4.1 pozicije: 04.04
NSSU-S1-D2-ARC-ST6-MAR-015-R1	S1_Novi Sad-Lovcenac	KERAMIKA JOVANOVIĆ, Novosadski put 86, 21203 Veternik: Suvo presovane keramičke glazirane pločice	U TOKU		Projekat za Izvođenje: 1/7.3 pozicije: 4.4
NSSU-S1-D2-ARC-ST6-MAR-037	S1_Novi Sad-Lovcenac	Habajući sloj ANTISLIP	U TOKU		Projekat 2/9.7.7

NSSU-S1-D2-ARC-ST6-MAR-038	S1_Novi Sad-Lovcenac	DB TAKTIL DOO, Ulica Rabrenovački put br3, 31330, Priboj: Poliester armiran staklenim vlaknima	U TOKU		Projekat za Izvođenje: 1/7.1 pozicije: 15.6, 15.7
NSSU-S1-D1-STR-BR1-MAR-014	S1_Novi Sad-Lovcenac	0/31,5 - Израда прелазног слоја иза цементне стабилизације	U TOKU		Projekat broj: 2/1.1.05 Projekat mosta na km 0+796 Tehnički uslovi: 03.09.
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-116	S1_Novi Sad-Lovcenac	RIGOLA	B	Komentar u dokumentu	Projekat broj: 1/5.1 PROJEKAT ZGRADE ZA SS I TK SA OTPRAVNIKOM U STAJALIŠTU STEPANOVIĆEVO Tehnički uslovi: 13
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-117	S1_Novi Sad-Lovcenac	SPOLJNA KERAMIKA	B	Komentar u dokumentu	Projekat broj: 1/5.1 PROJEKAT ZGRADE ZA SS I TK SA OTPRAVNIKOM U STAJALIŠTU STEPANOVIĆEVO Tehnički uslovi: 10
NSSU-S1-D1-STR-SS-MAR-092-R1	S1_Novi Sad-Lovcenac	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI Glet masa	B	Komentar u dokumentu	Projekat broj: 1/2.1 - Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Sajlovo 1.3 - Projekat arhitekture za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Rumenka 1/4.2 - Projekat arhitekture rekonstrukcije i dogradnje zgrade za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Kisač
NSSU-S1-D1-STR-SS-MAR-093-R1	S1_Novi Sad-Lovcenac	MATERIJAL ZA IZRADU MOLERSKIH RADOVA BOJE ZA ZIDOVE I PLAFONE	A	n/a	Projekat broj: 1/2.1 - Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Sajlovo 1.3 - Projekat arhitekture za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Rumenka 1/4.2 - Projekat arhitekture rekonstrukcije i dogradnje zgrade za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Kisač
NSSU-S1-D1-STR-SS-MAR-096-R1	S1_Novi Sad-Lovcenac	MATERIJAL ZA IZRADU PODOPOLAGAČKIH RADOVA DUPLI POD	B	Komentar u dokumentu	Projekat broj: 1/2.1 - Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Sajlovo 1.3 - Projekat arhitekture za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Rumenka 1.4.2.- Projekat arhitekture rekonstrukcija i dogradnja zgrade za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Kisač
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-111	S1_Novi Sad-Lovcenac	Betonski ivičnjaci	A	n/a	Projekat broj: 1/2.1 - Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu

					Sajlovo 1.3 - Projekat arhitekture za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Rumenka
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-035-R1	S1_Novi Sad-Lovcenac	Multibat	A	n/a	Projekat broj: 1.14.2 Projekat arhitekture za smeštaj TK opreme Vrbas Nova, 1.14.3 Projekat arhitekture za smeštaj TK opreme Vrbas Atar 1.14.1 Projekat arhitekture zgrade za SS i TK u železničkoj stanici Bačko Dobro Polje1.6.2 - SS I TK OBJEKAT ZMAJEVO Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-071-R1	S1_Novi Sad-Lovcenac	Lepak za keramiku	B	Komentar u dokumentu	Projekat broj: 1.6.2 - Пројекат архитектуре реконструкције и доградње зграде за СС и ТК са отправником у железничкој станици Змајево Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-076-R1	S1_Novi Sad-Lovcenac	Dekorativni malter - kulirplast	B	Komentar u dokumentu	Projekat broj: 1.14.2 Projekat arhitekture za smeštaj TK opreme Vrbas Nova, 1.14.3 Projekat arhitekture za smeštaj TK opreme Vrbas Atar 1.14.1 Projekat arhitekture zgrade za SS i TK u železničkoj stanici Bačko Dobro Polje1.6.2 - SS I TK OBJEKAT ZMAJEVO Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-118	S1_Novi Sad-Lovcenac	Fasadna boja	A	n/a	Projekat broj: 1.14.2 Projekat arhitekture za smeštaj TK opreme Vrbas Nova, 1.14.3 Projekat arhitekture za smeštaj TK opreme Vrbas Atar, 1.14.1 Projekat arhitekture zgrade za smeštaj TK opreme Bačko Dobro Polje, 1.6.2 - Пројекат архитектуре реконструкције и доградње зграде за СС и ТК са отправником у железничкој станици Змајево Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-119	S1_Novi Sad-Lovcenac	Disperzivna boja	A	n/a	Projekat broj: 1.14.2 Projekat arhitekture za smeštaj TK opreme Vrbas Nova, 1.14.3 Projekat arhitekture za smeštaj TK opreme Vrbas Atar 1.14.1 Projekat arhitekture za smeštaj TK opreme Bačko Dobro Polje, 1.6.2 - Пројекат архитектуре реконструкције

					и доградње зграде за СС и ТК са отправником у железничкој станици Змајево Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-120	S1_Novi Sad-Lovcenac	Glet	A	n/a	Projekat broj: 1.14.2 Projekat arhitekture za smeštaj TK opreme Vrbas Nova, 1.14.3 Projekat arhitekture za smeštaj TK opreme Vrbas Atar, 1.14.1 Projekat arhitekture zgrade za TK opreme Bačko Dobro Polje, 1.6.2 - SS i TK ZMAJEVO Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-121	S1_Novi Sad-Lovcenac	Fasadna aluminarija	U TOKU		Projekat broj: 1.6.2 - SS i TK Zmajevo Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
NSSU-S1-D1-STR-ST3-SS-MAR-122	S1_Novi Sad-Lovcenac	PP vrata	U TOKU		Projekat broj: 1.14.2 Projekat arhitekture za smeštaj TK opreme Vrbas Nova, 1.14.3 Projekat arhitekture za smeštaj TK opreme Vrbas Atar, 1.14.1 Projekat arhitekture zgrade za SS i TK u železničkoj stanici Bačko Dobro Polje Tehnički uslovi: u skladu sa tehničkim uslovima navedenim u projektu konstrukcija.
(05)_NSSU-S2-HYD-MAR-HIDRO RADOVI					
MAR_ID	Deonica	Materijal	Status	Komentar	PZI
NSSU-S1-D2-HYD-NI-SEP-MAR-006	S1_Novi Sad-Lovcenac	Rešetka na ulazu u prihvatnu građevinu	A	n/a	
NSSU-S1-D2-HYD-ST6-MAR-014-R1	S1_Novi Sad-Lovcenac	PP orman nadzemni	U TOKU		Pozicija iz predmera: 3/3.2.4.3.3.7
(09)_NSSU-S1-MEC-MAR-MEHANIČKI RADOVI					
MAR_ID	Deonica	Materijal	Status	Komentar	PZI
NSSU-S2-D2-MEC-MAR-291	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Aparati za početno gašenje požara, dobavljača Albo doo, 11273 Batajnica, Majora Zorana Radosavljevića 347 i proizvođača Xuancheng Jindun Fire Fighting Equipment Co.,Ltd Shizi	U TOKU		GPZOP/1.3.17 Glavni projekat zaštite od požara - stanična zgrada u železničkoj stanici Bačka Topola, pozicija: Aparati za početno gašenje požara

		Town, Langxi County, Anhui 242131 Kina			
NSSU-S2-D2-MEC-MAR-292	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Aparati za početno gašenje požara, dobavljača Albo doo, 11273 Batajnica, Majora Zorana Radosavljevića 347 i proizvođača Xuancheng Jindun Fire Fighting Equipment Co.,Ltd Shizi Town, Langxi County, Anhui 242131 Kina	U TOKU		GPZOP/1.3.19 Glavni projekat zaštite od požara - zgrada postrojenja za sekcionisanje sa neutralnim vodom - PSN Bačka Topola, pozicija: Aparati za početno gašenje požara
NSSU-S2-D2-MEC-MAR-293	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Aparati za početno gašenje požara, dobavljača Albo doo, 11273 Batajnica, Majora Zorana Radosavljevića 347 i proizvođača Xuancheng Jindun Fire Fighting Equipment Co.,Ltd Shizi Town, Langxi County, Anhui 242131 Kina	U TOKU		GPZOP/1.3.22 Glavni projekat zaštite od požara - zgrada postrojenja za sekcionisanje PS Žednik, pozicija: Aparati za početno gašenje požara
NSSU-S2-D2-MEC-MAR-294	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Sanduk za pesak metalni 0.33m³, dobavljača Albo doo, 11273 Batajnica, Majora Zorana Radosavljevića 347 i proizvođača Limoprodukt doo, Bački Petrovac, Industrijska bb	U TOKU		GPZOP/1.3.19 Glavni projekat zaštite od požara - zgrada postrojenja za sekcionisanje sa neutralnim vodom - PSN Bačka Topola, pozicija: Aparati za početno gašenje požara
NSSU-S2-D2-MEC-MAR-295	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Sanduk za pesak metalni 0.33m³, dobavljača Albo doo, 11273 Batajnica, Majora Zorana Radosavljevića 347 i proizvođača Limoprodukt doo, Bački Petrovac, Industrijska bb	U TOKU		GPZOP/1.3.22 Glavni projekat zaštite od požara - zgrada postrojenja za sekcionisanje PS Žednik, pozicija: Aparati za početno gašenje požara
NSSU-S2-D2-MEC-CRSC-MAR-023R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Uslovni kontakt MAC-334-IF/Japan	A	n/a	ZGRADA ZA SS I TK SA OTPRAVNIKOM U ŽELEZNIKOJ STANICI ŽEDNIK pozicija: 06/1.10.2.01.05
NSSU-S2-D2-MEC-CRSC-MAR-024R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Predizolovana bakarna cev Ø6.35x0.8 mm,debljina izolacije 9mm, Halcor Ecutherm, Grčka	A	n/a	ZGRADA ZA SS I TK SA OTPRAVNIKOM U ŽELEZNIČKOJ STANICI ŽEDNIK pozicija: 06/1.10.2.01.06a
NSSU-S2-D2-MEC-CRSC-MAR-025R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Predizolovana bakarna cev Ø9.52x0.8 mm,debljina izolacije 9mm, Halcor Ecutherm, Grčka	A	n/a	ZGRADA ZA SS I TK SA OTPRAVNIKOM U ŽELEZNIČKOJ STANICI ŽEDNIK pozicija: 06/1.10.2.01.06b

NSSU-S2-D2-MEC-CRSC-MAR-026R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Predizolovana bakarna cev Ø12.7x0.8 mm,debljina izolacije 9mm, Halcor Ecutherm, Grčka	A	n/a	ZGRADA ZA SS I TK SA OTPRAVNIKOM U ŽELEZNIČKOJ STANICI ŽEDNIK pozicija: 06/1.10.2.01.06c
NSSU-S2-D2-MEC-CRSC-MAR-027R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Predizolovana bakarna cev Ø15.87x1 mm,debljina izolacije 9mm, Halcor Ecutherm, Grčka	A	n/a	ZGRADA ZA SS I TK SA OTPRAVNIKOM U ŽELEZNIČKOJ STANICI ŽEDNIK pozicija: 06/1.10.2.01.06d
NSSU-S2-D2-MEC-CRSC-MAR-028R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Predizolovana bakarna cev Ø19.05x1 mm,debljina izolacije 9mm, Halcor Ecutherm, Grčka	A	n/a	ZGRADA ZA SS I TK SA OTPRAVNIKOM U ŽELEZNIČKOJ STANICI ŽEDNIK pozicija: 06/1.10.2 01.06e
NSSU-S2-D2-MEC-CRSC-MAR-029R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	FREON R-410 A	A	n/a	ZGRADA ZA SS I TK SA OTPRAVNIKOM U ŽELEZNIČKOJ STANICI ŽEDNIK pozicija: 06/1.10.2.01.09
NSSU-S2-D2-MEC-CRSC-MAR-030R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	FREON R-32	A	n/a	ZGRADA ZA SS I TK SA OTPRAVNIKOM U ŽELEZNIČKOJ STANICI ŽEDNIK pozicija: 06/1.10.2.01.09
NSSU-S2-D2-MEC-CRSC-MAR-031R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Plastične cevi NIBCO PVC-U PN15 1", Poland/USA	A	n/a	ZGRADA ZA SS I TK SA OTPRAVNIKOM U ŽELEZNIČKOJ STANICI ŽEDNIK pozicija: 06/1.10.2.01.10
NSSU-S2-D2-MEC-CRSC-MAR-032R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Tesy konvektorska grejalica Heat eco CN03-100-MIS-F/Bugarska	A	n/a	ZGRADA ZA SS I TK SA OTPRAVNIKOM U ŽELEZNIČKOJ STANICI ŽEDNIK pozicija: 06/1.10.2.01.14a
NSSU-S2-D2-MEC-CRSC-MAR-033R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Tesy konvektorska grejalica Heat eco CN03-150-MIS-F/Bugarska	A	n/a	ZGRADA ZA SS I TK SA OTPRAVNIKOM U ŽELEZNIČKOJ STANICI ŽEDNIK pozicija: 06/1.10.2.01.14b
NSSU-S2-D2-MEC-CRSC-MAR-044R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Predizolovana bakarna cev Ø15.87x1 mm,debljina izolacije 9mm, Halcor Ecutherm, Grčka	A	n/a	ZGRADA ZA SS I TK U STAJALIŠTU LOVĆENAC MALI IĐOŠ pozicija: 06/1.8.1.01.06d
NSSU-S2-D2-MEC-CRSC-MAR-046R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	FREON R-410 A	A	n/a	ZGRADA ZA SS I TK U STAJALIŠTU LOVĆENAC MALI IĐOŠ pozicija: 06/1.8.1.01.09
NSSU-S2-D2-MEC-CRSC-MAR-047R1	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	FREON R-32	A	n/a	ZGRADA ZA SS I TK U STAJALIŠTU LOVĆENAC MALI IĐOŠ pozicija: 06/1.8.1.01.09

(07)_NSSU-S2-ELW-MAR-ELEKTRO RADOVI					
MAR_ID	Deonica	Materijal	Status	Komentar	PZI
NSSU-S2.10-D3-ELW-MAR-031	S2_Lovcenac-Subotica-Drzavna granica	Svetiljka PLAZA R30 i.	B	Komentar u dokumentu	PZI: 4.2.4.12

Status:

A - Prihvata se
B - Prihvata se sa komentarima
C - Odbija se

Deonica:

S1 - Novi Sad - Lovćenac

S2 - Lovćenac - Subotica - državna granica

10 STATUS RADOVA

1	Arhitektonski radovi					
	DEONICA 1 (Novi Sad - Vrbas) čvor Novi Sad km76+501 - km112+982	86,00%	70%	Radovi u toku	31.11.2024.	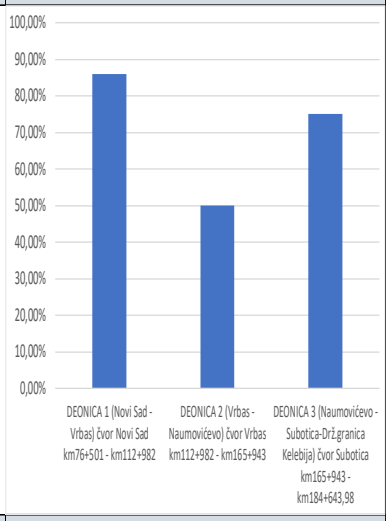
	DEONICA 2 (Vrbas - Naumovićevo) čvor Vrbas km112+982 - km165+943	50,00%		Radovi u toku		
	DEONICA 3 (Naumovićevo - Subotica-Drž.granica Kelebija) čvor Subotica km165+943 - km184+643,98	75,00%		Radovi u toku		
2	Radovi na donjem stroju					
	DEONICA 1 (Novi Sad - Vrbas) čvor Novi Sad km76+501 - km112+982	98%	94%	Radovi u toku	31.07.2024.	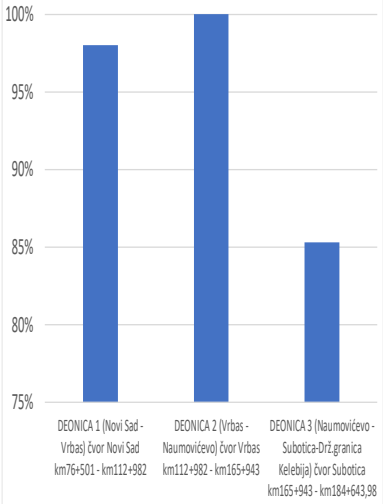
	DEONICA 2 (Vrbas - Naumovićevo) čvor Vrbas km112+982 - km165+943	100%		Radovi u toku		
	DEONICA 3 (Naumovićevo - Subotica-Drž.granica Kelebija) čvor Subotica km165+943 - km184+643,98	85%		Radovi u toku		
3	Radovi na gornjem stroju					
	NABAVKA TUCANIKA [m3]	85%	86%	nabavka u toku	30.09.2024.	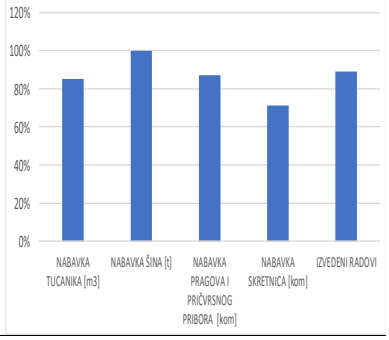
	NABAVKA ŠINA [t]	100%		nabavka u toku		
	NABAVKA PRAGOVA I PRIČVRSNOG PRIBORA [kom]	87%		nabavka u toku		
	NABAVKA SKRETNICA [kom]	71%		nabavka u toku		
	IZVEDENI RADOVI	89%		Radovi u toku		

100%
95%
90%
85%
80%
75%
DEONICA 1 (Novi Sad - Vrbas) čvor Novi Sad km76+501 - km112+982
DEONICA 2 (Vrbas - Naumovićevo) čvor Vrbas km112+982 - km165+943
DEONICA 3 (Naumovićevo - Subotica-Drž.granica Kelebija) čvor Subotica km165+943 - km184+643,98

4	Mostovi, propusti i podvožnjaci					
	DEONICA 1 (Novi Sad - Vrbas) čvor Novi Sad km76+501 - km112+982	93%	87%	Radovi u toku	30.06.2024.	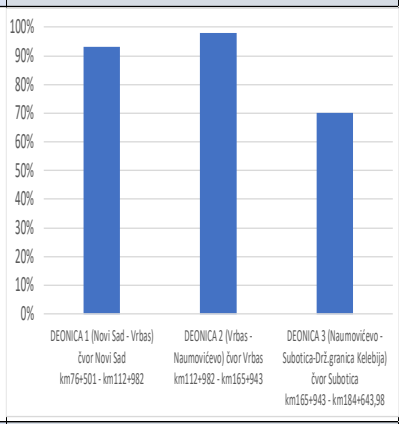
	DEONICA 2 (Vrbas - Naumovićevo) čvor Vrbas km112+982 - km165+943	98%		Radovi u toku		
	DEONICA 3 (Naumovićevo - Subotica-Drž.granica Kelebija) čvor Subotica km165+943 - km184+643,98	70%		Radovi u toku		
5	Pristupni putevi i devijacije					
	DEONICA 1 (Novi Sad - Vrbas) čvor Novi Sad km76+501 - km112+982	30%	71%	nema radova	30.04.2024.	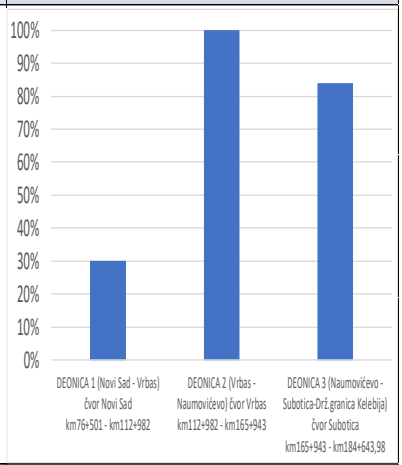
	DEONICA 2 (Vrbas - Naumovićevo) čvor Vrbas km112+982 - km165+943	100%		nema radova		
	DEONICA 3 (Naumovićevo - Subotica-Drž.granica Kelebija) čvor Subotica km165+943 - km184+643,98	84%		Radovi u toku		
6	Drenažni radovi					
	DEONICA 1 (Novi Sad - Vrbas) čvor Novi Sad km76+501 - km112+982	84%	67%	Radovi u toku	31.05.2024.	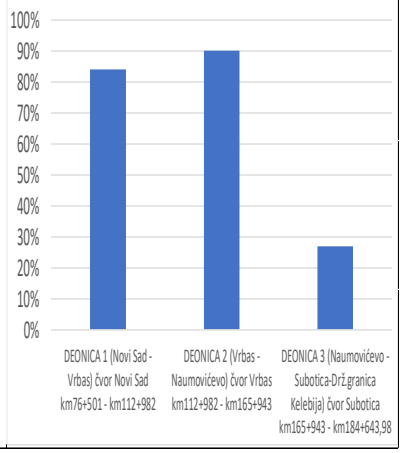
	DEONICA 2 (Vrbas - Naumovićevo) čvor Vrbas km112+982 - km165+943	90%		Radovi u toku		
	DEONICA 3 (Naumovićevo - Subotica-Drž.granica Kelebija) čvor Subotica km165+943 - km184+643,98	27%		Radovi u toku		

7	Kontaktna mreža					
	Građevinski radovi	95%	97%		30.09.2024.	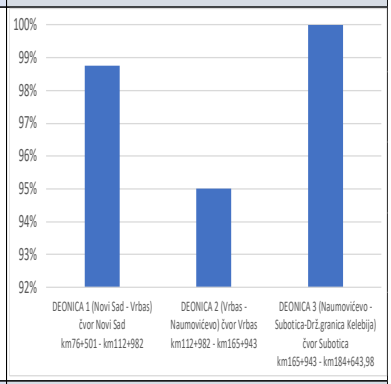
	Elektro radovi	98%				
	DEONICA 1 (Novi Sad - Vrbas) čvor Novi Sad km76+501 - km112+982	99%				
	DEONICA 2 (Vrbas - Naumovićevo) čvor Vrbas km112+982 - km165+943	95%				
	DEONICA 3 (Naumovićevo - Subotica-Drž.granica Kelebija) čvor Subotica km165+943 - km184+643,98	100%				
8	Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS					
	Nabavka materijala i građevinski radovi		62%		30.09.2024.	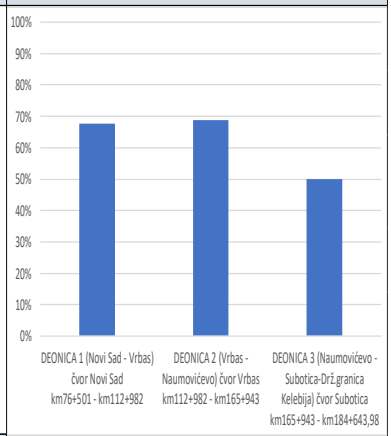
	Elektro radovi					
	DEONICA 1 (Novi Sad - Vrbas) čvor Novi Sad km76+501 - km112+982	68%				
	DEONICA 2 (Vrbas - Naumovićevo) čvor Vrbas km112+982 - km165+943	69%				
	DEONICA 3 (Naumovićevo - Subotica-Drž.granica Kelebija) čvor Subotica km165+943 - km184+643,98	50%				
9	Napajanje					
	Trafo stanica napajana sa KM 25/0.23 kV	32%	71%	Ne radi se.	30.09.2024.	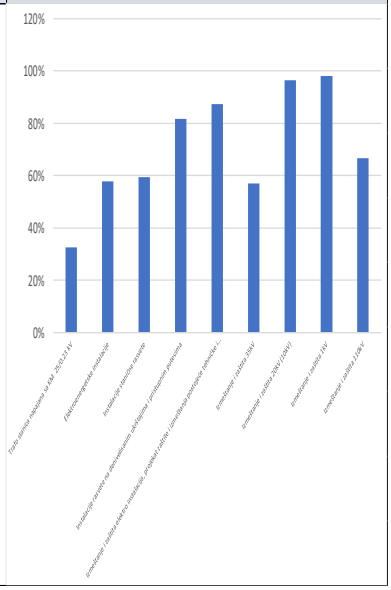
	Elektroenergetske instalacije	58%		Radovi u toku		
	Instalacije stanične rasvete	59%		Radovi u toku		
	Instalacije rasvete na denivelisanim ukrštajima i pristupnim putevima	82%		Radovi u toku		
	Izmeštanje i zaštita elektro instalacija, projekat zaštite i izmeštanja postojeće tehničke i komunalne infrastrukture	87%		Radovi u toku		
	Izmeštanje i zaštita 35kV	57%		Radovi u toku		
	Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV)	96%		Radovi u toku		
	Izmeštanje i zaštita 1kV	98%		Radovi u toku		
	Izmeštanje i zaštita 110kV	67%		Usaglašavanje sa EMS - projekti.		

10	Signalno-sigurnosni sistemi					
	Nabavka materijala	85%	91%	u toku	30.09.2024.	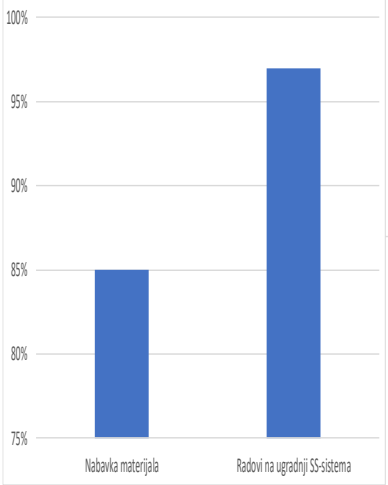
	Radovi na ugradnji SS-sistema	97%		u toku		
11	Telekomunikacioni sistemi					
	Nabavka materijala	90%	72%	u toku	30.09.2024.	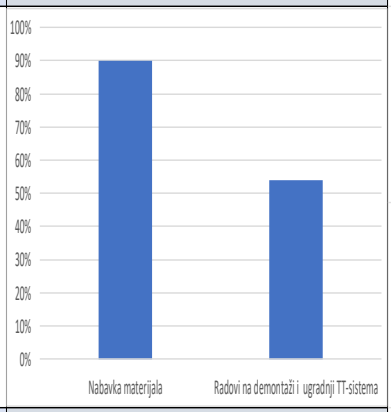
	Radovi na demontaži i ugradnji TT-sistema	54%		Demontažni radovi završeni. Radovi na instalacijama stanice NS u toku kao i Kolizije		
12	Termotehničke i protivpožarne instalacije					
	Termotehničke instalacije u zgradama	66%	46%	u toku	30.09.2024.	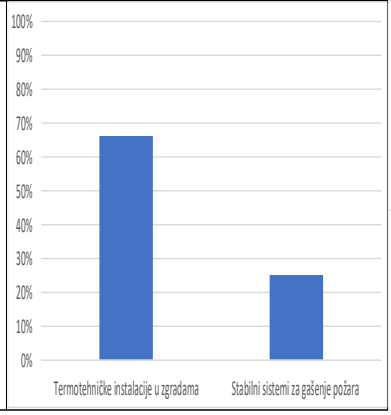
	Stabilni sistemi za gašenje požara	25%		u toku		

13	Mašinske instalacije i radovi					
	Liftovi	95%	54%	u toku	30.09.2024.	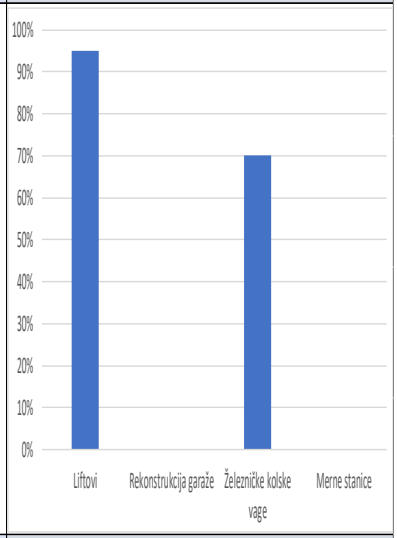
	Rekonstrukcija garaže	0%		Radovi nisu započeti		
	Železničke kolske vage	70%		u toku		
	Merne stanice	0%		Radovi nisu započeti		
14	Putna saobraćajna signalizacija i oprema					
		0%	0%	Radovi nisu započeti	03.04.2024.	
15	Pejzažno uređenje, peroni i mere zaštite životne sredine					
	DEONICA 1 (Novi Sad - Vrbas) čvor Novi Sad km76+501 - km112+982		94%		30.09.2024.	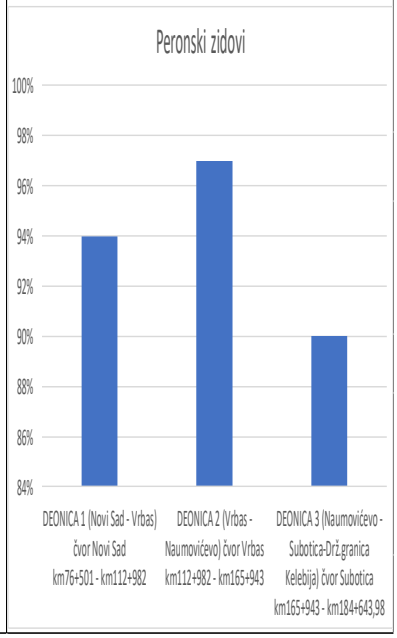
	Peronski zidovi	94%				
	DEONICA 2 (Vrbas - Naumovićevo) čvor Vrbas km112+982 - km165+943					
	Peronski zidovi	97%				
	DEONICA 3 (Naumovićevo - Subotica-Drž.granica Kelebija) čvor Subotica km165+943 - km184+643,98					
	Peronski zidovi	90%				

Prilog 1

IZVEŠTAJI SA GRADILIŠTA

Prilog 2

ORGANIZACIONA ŠEMA NADZORA

Prilog 3

ZAPISNICI SA SASTANAKA
